

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.14 – Octubre 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de Octubre de 2024.
HORA:	8: 30 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

El 24 de octubre 2024, Esant informa que el Municipio inicia proceso de avalúo de predio de la sra marlene Diaz, la cual no permite la servidumbre y el Municipio iniciara proceso de imposición. Fecha se suspensión del 9 de junio del 2024 hasta que se presente la reformulación No. 3 al Ministerio y sea aprobada. Fecha aproximada 30 de abril de 2025.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

Interventoría entrego a la Esant toda la documentación del proyecto y se encuentra en revisión técnica y jurídica por parte de la dirección de la Esant, programada para el 8 de noviembre de 2024

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

Con modificación 11, de precios no previstos y adicional en plazo 9, adicional en valor No. 2 de acuerdo con reformulación No. 3 aprobada por el Ministerio, se tiene fecha de terminación 24 de agosto de 2025.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Informe semanal del 5 de octubre de 2024. Se tiene un avance del 73,99% contra un programado del 77,39%.

Se termino instalación de tubería sanitaria y pluvial del tramo de Cra 6 entre calles 10 y 11, se está en proceso de domiciliarias del alcantarillado sanitario.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

Se entrega mañana 25 de octubre de 2024 el presupuesto por parte del contratista a Interventoría para su revisión, teniendo aproximadamente 400 NP. Se programa que la Interventoría entregue a Findeter la tercera semana de noviembre de 2024.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se realizo reunión de seguimiento de la reformulación No. 1 entre la Esant y al Ministerio el 22 y 23 de octubre de 2024, se realizó revisión de anexos con solicitud del Ministerio de oficio por parte del Municipio, ajuste de planos, oficios del consultor para cambio de filtros, estudio de pavimentos, ajuste de cuadro comparativo.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de terminación para entrega al Municipio del Socorro	ESANT	8-11-2024
2	Revisión reformulación No. 1 Mogotes.	Esant - MVCT	29-10-2024
3	Inicio proceso de avalúo, servidumbre Sra. Hilda Vélez Guayabos	Municipio	30-10-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4.	Entrega del presupuesto Lebrija	Interventoría	22-11-2024
----	---------------------------------	---------------	------------

FIRMAS:

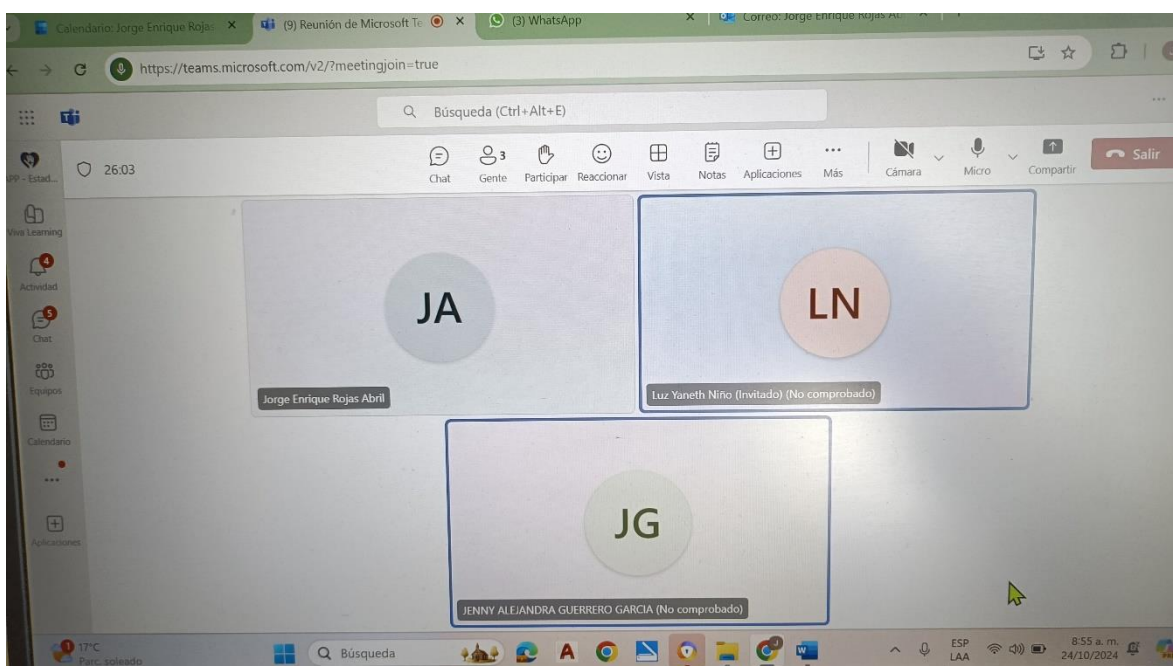

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: octubre 24 de 2024
