



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de octubre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 02:30 pm a 04:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Gillson Stheiman Mora Agudelo – Apoyo a la supervisión Convenio CUR 1085 de 2020, Madrid sur y sur oriental. Mayra Alejandra Castro – Apoyo a la supervisión proyectos Madrid Occidental y sur occidental Juan Manuel salguero – Apoyo a la supervisión EPC Jonathan Herrera – Supervisor EPC Hector Maffiu Apoyo a la Supervisión EAAM Anderson Gonzales – residente interventoría Sergio Mendez – Residente obra
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de los proyectos de Madrid oriental, sur oriental, sur, occidental y sur occidental

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 02:30 pm, con saludo a los profesionales presentes.
2. La reunión empieza con solicitud del MVCT para presentación del estado de cada uno de los proyectos iniciando con los proyectos a cargo del arquitecto Gillson mora apoyo a la supervisión del MVCT e indicando lo siguiente:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Orienta y Sur: continúan suspendidas las obras por solicitud de INVIAS ya que el permiso de intervención dado por esta entidad se encontraba para ejecutar actividades sobre la franja del andén y zonas blandas, no por el centro de la vía como se estaba ejecutando, se está buscando reunión con INVIAS para revisar la procedencia de la actualización del permiso.

Se acordó revisión de las obras en campo con INVIAS y realizar una actualización del permiso de intervención ante INVIAS por parte de la EAAAM SA ESP, actualización que será radicada el 20 de octubre de 2024

Se informa por parte de EPC que no se ha generado la suspensión de los contratos derivados de los convenios debido a que se está esperando los resultados de la reunión con INVIAS y las exigencias de la entidad.

Para evitar riesgos o accidentes con la comunidad en las obras que se iniciaron se solicitó por parte de este ministerio la señalización y el lleno de excavaciones que se hallan realizado, a lo cual el contratista e interventor indican que ya se están realizando.

Posterior a la reunión de INVIAS y la definición de la estructura de vía se procederá a realizar actualización de los presupuestos de obra para presentar las reformulaciones ante el MVCT


Para el proyecto de suroriental, la EAAAM SA ESP informa que se va realizar audiencia para presentar descargos por parte del contratista ya que solicitó nulidad de la liquidación unilateral del contrato, esto lo hace con el fin de evitar las sanciones y así ceder el contrato de obra y que se puedan dar inicio a las actividades, por lo anterior se suspendió el convenio entre EAAAM y EPC hasta el 01 de diciembre de 2024, fecha en la cual se espera que la EAAAM ya haya resuelto el tema jurídico de la liquidación y posible cesión del contrato de obra.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar resultado de reunión con INVIAS	EAAAM SA ESP	25/10/2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Ajuste presupuesto de obras y documentos de reformulaciones	Contratista e interventor	30/10/2024
3	Informe audiencia descargos obra sur oriental	EAAAM	30/10/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión

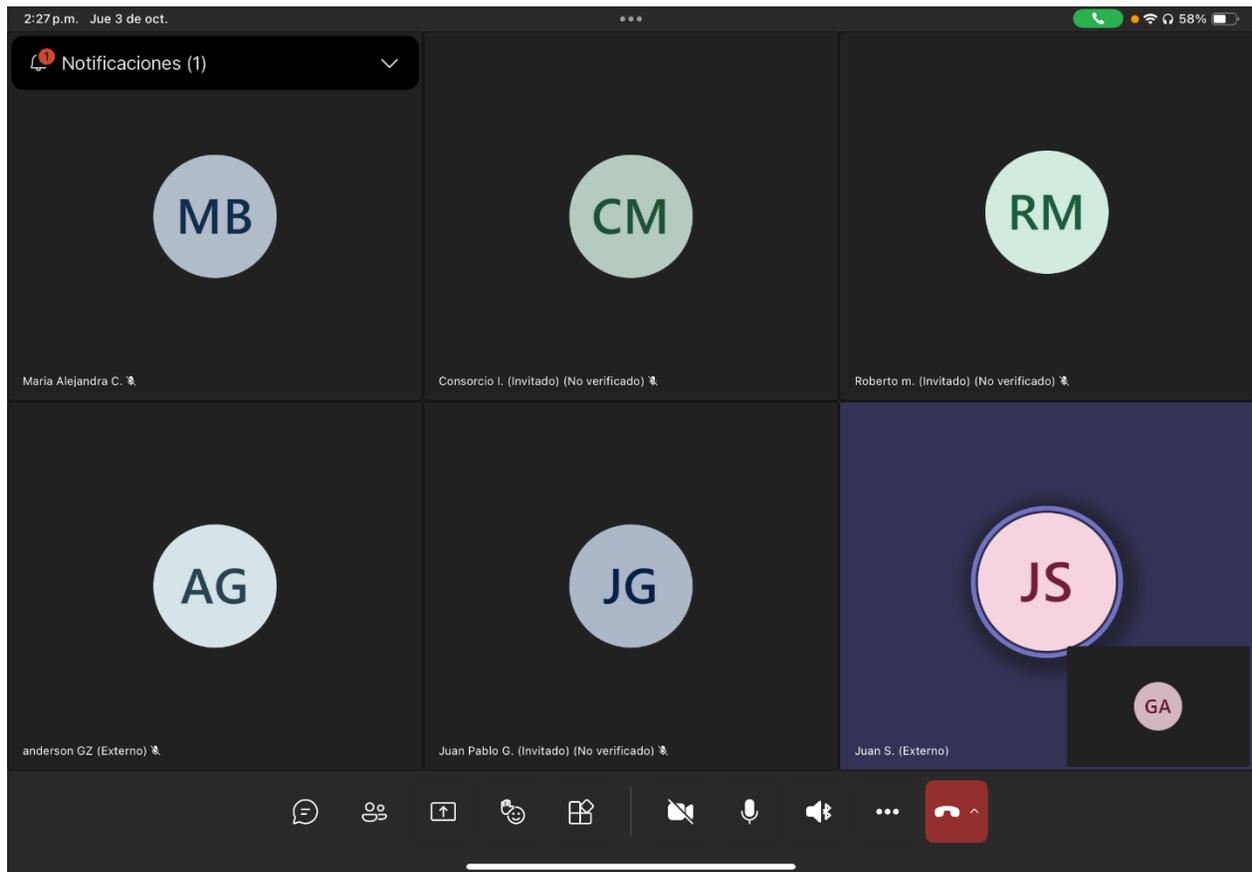

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 03/10/2024
