



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 11

### DATOS GENERALES

FECHA:	Colombia, Bogotá, 6 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	<p>Paola Rodríguez, profesional universitaria, banco de proyectos, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Héctor Maffiu Herrera Rodríguez, profesional universitario, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Luisa Cárdenas, Ingeniera Civil, auxiliar interventoría.</p> <p>Miguel Suárez, Ingeniero Civil, Interventor del proyecto.</p> <p>Katherine Bohórquez, jefe de planeación y desarrollo integral, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Diana Carolina Ramírez Pinto, Amarilo S.A., jefe de obras, <a href="mailto:diana.ramirez@amarilo.com">diana.ramirez@amarilo.com</a></p> <p>María Paula Bautista, presupuestos, Amarilo S.A.</p> <p>Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, <a href="mailto:AACorcho@minvivienda.gov.co">AACorcho@minvivienda.gov.co</a></p>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Compromisos de subsanación de los componentes pendientes del proyecto:
  - a. Componente presupuestal.
  - b. Componente geotecnia.
  - c. Componente institucional.
3. Componente estructural

### DESARROLLO:


1. Se reúne en la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024 para el seguimiento del proyecto **1-2023-62 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 4800 FUSIONADO AL ACERO VFA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPENSACIÓN DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA** por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado, Agua y Aseo de Madrid S.A. E.S.P. (EAAAM S.A. E.S.P.), la ingeniera Paola Rodríguez, el Ingeniero Héctor Herrera y la Ingeniera Katherine Bohórquez. Por parte de la consultoría se encuentra la Ingeniera Diana Ramírez, y María Paula Bautista. Por parte de la interventoría del proyecto, se encuentra la Ingeniera Luisa Cárdenas y el Ingeniero Miguel Suárez. Por parte del MVCT se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. El ingeniero Alvaro Corcho inicia con una disculpa por el inicio accidentado de la mesa de trabajo, y porque no se ha podido llevar a cabo la revisión del componente estructural del proyecto. Solicita que, por favor, se indiquen los avances de los diferentes componentes pendientes por parte del formulador, exceptuando el componente predial el cual fue enviado previa a la mesa de trabajo.
3. Sobre el componente de geotecnia, se indica que esta semana se espera la radicación de la información por parte de la interventoría, debido a que el responsable del estudio envió la información el 28 de octubre, el Ingeniero Miguel Suárez asegura que el especialista ya ha revisado la información y está elaborando el concepto para que el producto sea radicado al mecanismo.
4. Se solicita información sobre el componente presupuestal.
5. La Ingeniera María Bautista indica que la información de los sitios de disposición, certificado de la carga impositiva, y otros documentos pendientes para la estructuración y actualización del proyecto, fueron enviados por parte del formulador a la consultoría, sin embargo, surgen algunas preguntas al respecto de la separación del presupuesto entre insumos y obra civil, e interventoría de obra, el cálculo del A.I.U., entre otros parámetros.
6. El ingeniero Alvaro Corcho indica que la revisión detallada del componente estará a cargo de la especialista del ministerio, e insta a que todos los cálculos estén debidamente justificados, con cotizaciones, la interventoría calculada por el método de factor multiplicador, incluir la información de la carga impositiva y los certificados de canteras y sitios de disposición. Se insta también a tener en cuenta un aumento del IPC, y la proyección del dólar de acuerdo con las variaciones que se presentan, ya que el tanque en VFA es el ítem con mayor peso dentro del presupuesto, y depende de gran manera del valor del dólar.
7. Sobre el componente institucional se indica que EPC ha enviado parte de la información, sin embargo, no se encuentra completa, por lo que se está reestructurando el componente, de acuerdo con las solicitudes del evaluador del componente. Se espera que esta información sea radicada para el 15 de noviembre, junto con los demás componentes.
8. El Ingeniero Alvaro Corcho propone realizar una mesa previa a la radicación del producto para revisar la información.

9. Los asistentes aprueban la fecha de la mesa para el 15 de noviembre, teniendo en cuenta que, el presupuesto sería radicado a la interventoría el martes 12 de noviembre y que, a su vez, la interventoría tendría la revisión del producto para el 15.
10. Sin mas pendientes por tratar la mesa de trabajo finaliza a las 9:35 a.m.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Componente presupuestal	Amarilo, interventoría y formulador	15/11/2024
2	Geotecnia	Amarilo, interventoría y formulador	15/11/2024
3	Estructural	MVCT	15/11/2024
4	Institucional	EPC y formulador.	15/11/202
5	Mesa de seguimiento	Todos	15/11/2024

**FIRMAS:**

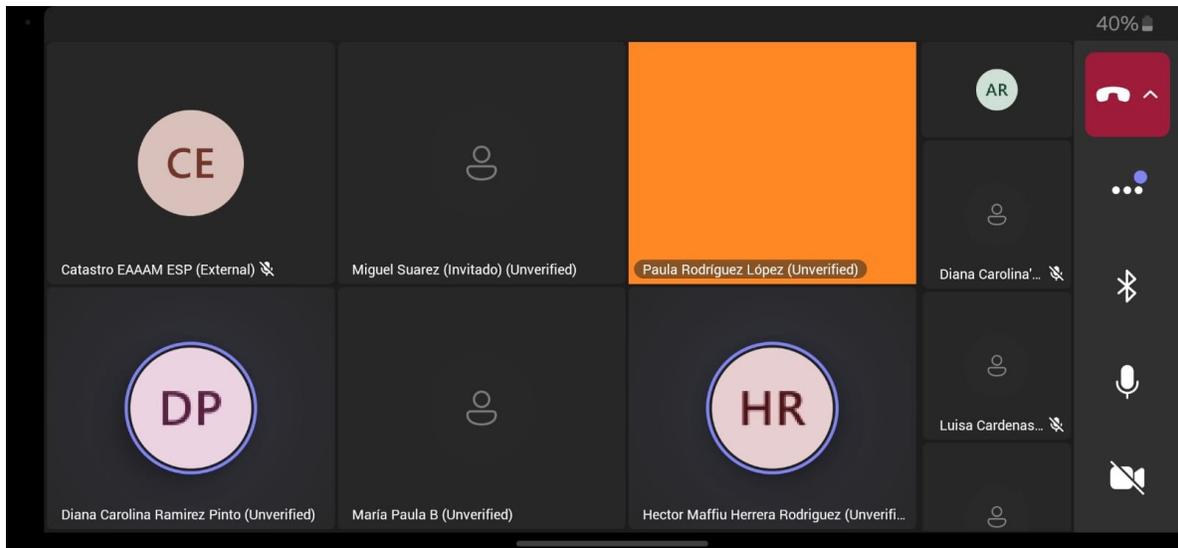

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez   
 Fecha: 06/11/2024
