



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de noviembre de 2024
HORA:	De 3:45 pm a 4:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Plan Departamental de Aguas- Ejecutor: Rubén Ely- Área Técnica PDA Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión2. Municipio Cereté- Getulio Padrón3. AQUALIA Andrés Sepúlveda Guarín4. Contratos Derivados: Consortio Interacueducto- Coordinador Interventoría Camal Bejarano Consortio Cereté San Carlos- Contratista de Obra Luis Guillermo Guzmán5. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
2. Compromisos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

- 1. Avance en las gestiones de pruebas y entrega del proyecto al Municipio y empresa Operadora:**

Ejecutor (PDA) Informa que, como parte del seguimiento se adelantó visita al proyecto, presentando registro fotográfico del estado de la infraestructura, e indica que el contratista de obra atendió las observaciones allegadas por parte de la Alcaldía del Municipio de Cereté.

MVCT solicita indicar el estado de gestiones para la entrega del proyecto tanto al Municipio como a la empresa Operadora, al respecto PDA informa que se han adelantado pruebas en el sector Venado- Campanito.

Desde Aqualia se informa que ya se culminaron las pruebas a redes en el sector Calle Larga y en el sector las Tinas se está culminando el proceso de verificación de la distribución a los usuarios y se tiene programado para el día 07 de noviembre de 2024 realizar las pruebas. Asimismo, se encuentra pendiente la prueba con carga de la tubería de 16" que sale de la estación de bombeo de Cereté, y que requiere una suspensión del bombeo, para lo cual se está realizando la logística previa requerida a fin de que a partir de la semana del 11 de noviembre se puedan adelantar las pruebas y con esto iniciar el funcionamiento del sistema.

Desde el MVCT se solicita informar cómo se avanza en el proceso de entrega a los municipios de Cereté y San Carlos, toda vez que las pruebas se han hecho de manera conjunta incluido el Operador, al respecto PDA informa que una vez se terminen de realizar las pruebas para toda la infraestructura se podrá consolidar la documentación de modo que se entregue de manera completa la información

Desde el MVCT se recuerda que los contratos derivados terminaron el 23 de septiembre de 2024 y el convenio se termina el 21 de diciembre de 2024, por lo que a finales del mes de noviembre debe contarse con la entrega del proyecto a los Municipios y a la Empresa Operadora.

Desde el PDA se informa que para realizar el proceso de entrega se allega a los Municipios el paquete documental incluidos planos, manuales de operación y mantenimiento, y a la fecha se cuenta con todos los soportes requeridos; no obstante, una vez se termine el proceso de pruebas se podría verificar la funcionalidad para hacer entrega al municipio.

Desde Aqualia se informa que como se ha realizado un acompañamiento activo en el proceso constructivo a fin de que se cumplan los requerimientos técnicos



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

establecidos, el proceso para recibo se da con el desarrollo de las pruebas, puesta en marcha y operación del sistema, por lo que solo estaría pendiente la verificación documental asociada. De modo que una vez el municipio reciba el proyecto la empresa lo recibirá como parte de los bienes afectos a la operación.

Delegado de la Alcaldía de Cereté, indica que como parte de reuniones pasadas se había solicitado a la Alcaldía expedir los certificados de Funcionalidad, motivo por el cual se generaron las observaciones allegadas al PDA y los contratos derivados, es por lo anterior que la atención de observaciones presentadas por el PDA deben quedar debidamente avaladas por la empresa operadora AQUALIA. Al respecto delegado de AQUALIA indica que se atendieron las observaciones realizadas según lo presentado por el PDA, las cuales fueron cerradas como parte de las pruebas sin carga, lo cual incluía el inicio de motores en ambos sistemas de bombeo.

Desde MVCT se deja salvedad que pese haber invitado al secretario de Planeación de la Alcaldía de San Carlos, no se presentaron a la presente mesa de seguimiento. Al respecto Aqualia informa que se han sostenido reuniones con el Municipio de San Carlos quienes están informados del proceso de pruebas que se adelantan.

Con la asistencia de las partes, y según lo tratado anteriormente, se constata y se deja como soporte que el proceso de pruebas y entrega va avanzando de manera coordinada.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tiene alguna inquietud o novedad frente al proceso de liquidación para debatirlo en la presente mesa de modo que se pueda gestionar con antelación lo pertinente, esto a fin de no presentar inconvenientes en el proceso de liquidación. Las partes indican que no se tienen temas adicionales a tratar.

2. Respecto a los compromisos planteados en la mesa anterior:

1. Desde el MVCT se realizó programación de la presente mesa de trabajo en la cual se invitó a los Municipios de Cereté, San Carlos y delegado de la empresa Operadora Aqualia.
2. Frente a los certificados de paz y salvo de parafiscales Interventoría debía presentar los documentos propios y los del objeto de seguimiento el 22 de octubre de 2024. Interventoría informa que hizo entrega de los documentos, respecto a la documentación del contratista se hizo falta el certificado de Fondo de la Industria y la Construcción – FIC que expide el SENA. Al respecto



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

contratista informa que se han adelantado las gestiones para obtener el certificado faltante, sin embargo, el documento no ha sido expedido porque internamente la Entidad se encuentra en paro.

Frente al proceso de liquidación PDA aclara que las actas de liquidación se encuentran en revisión del área jurídica, pero se ha adelantado el proceso interno para que una vez se cuenten con los documentos, estas puedan ser suscritas respectivamente. Interventoría aclara que este documento es requerido como parte de los documentos contractuales para poder hacer recibo completo a la documentación.

Asimismo, Interventoría indica que se hizo entrega al PDA del manual de mantenimiento respecto de los tableros de control en la planta de tratamiento, a fin de complementarlo con información de la cual se entrega el proveedor respecto a los certificado.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Reporte de resultado de pruebas sector las Tinas	PDA	Próximo comité
2	Desarrollo de pruebas de carga	Contratista- Interventoría	Semana del 11 de noviembre
3	Complemento de certificados de Paz y Salvo de Parafiscales (Fondo de la Industria y la Construcción – FIC) que expide el SENA.	Contratista de Obra	22- oct- 2024 Seguimiento por parte del PDA**
4	Entrega al municipio suscrita así como también a la empresa operadora.	PDA- Contratos derivados	15/Nov/2024 Fecha tentativa según resultado de pruebas.
5	Citar comité de seguimiento	MVCT	18/Nov/2024 03:00 pm


Link de grabación:

[Mesa Técnica de Seguimiento Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos- 20241106 154950-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

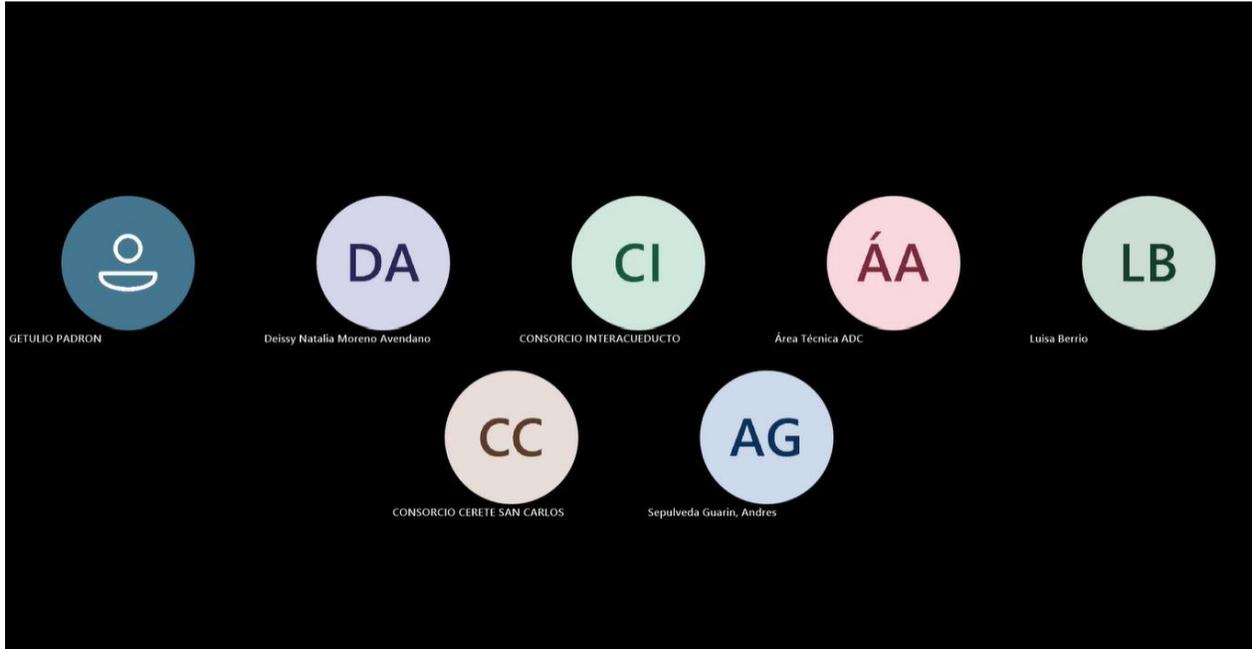

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 15 de Noviembre de 2024
