



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE ASISTENCIA TÉCNICA

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de noviembre de 2024
HORA:	De 16:30 pm a 17:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisiónContratos Derivados Naira Hernández- Consorcio constructor 2021 Interventoría Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San AnteroAlcaldía Municipio de San Antero. Daymer Morales Burgos- Secretario de Infraestructura.AQUALIA Vellojin Argel Ana Apoyo delegada Aqualia.MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
- Compromisos.

DESARROLLO:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. PDA informa que el avance ejecutado a la fecha es del 55.10% frente a un planeado del 54.95%, de igual manera reporta se realizó visita al proyecto, de la cual se evidenciaron dos frentes de trabajo en los que se adelantan la instalación de tubería de 10" y en la planta de tratamiento se adelantan trabajos de demoliciones de las estructuras existentes requeridas, teniendo en cuenta que desde Aqualia hizo entrega del 50% de la planta para ejecutar las actividades de proyecto.

Delegada de Aqualia informa que ya se hizo el retiro del lecho filtrante, y estructura del sistema en los filtros #4 y el día de hoy se culmina con el #1 a fin de proceder a la demolición de las placas de concreto del falso fondo de los filtros #4 y #1, para así iniciar actividades de pañete, impermeabilización, nivelación de los dos filtros con el fin de que puedan instalar los lechos filtrantes, compuertas, niples y todos los componentes para colocarlos en funcionamiento, ya que el proyecto se desarrolla de manera paralela con la operación de la Planta. Actividades que se han desarrollado desde el 22 de octubre de 2024, con entrega de la Planta por parte de Aqualia desde el 16 de septiembre de 2024.

Teniendo en cuenta que el contratista e interventoría, van a iniciar las actividades de obra en el predio donde está ubicado el punto de captación para la instalación de la tubería de polietileno en 16" y dado a que el dueño del predio no permitió el ingreso aun cuando se cuenta con la servidumbre, desde contratista de obra reitera la importancia de contar con el permiso de ingreso una vez bajen los niveles del río y que permitan la intervención e instalación de los 330 m de tubería de impulsión que va por el mismo trazado de la tubería actual por lo que solicitan las gestiones del Municipio.

Al respecto, Secretario de Infraestructura del Municipio de San Antero indica que la situación fue puesta en conocimiento con la Secretaria de asuntos jurídicos y del Alcalde en reunión interna, para gestionar el acompañamiento policivo que permita adelantar las intervenciones. Solicitud que debe allegarse por parte de la interventoría y contratista con 15 días de anticipación.

Desde el MVCT, se recalca que en el marco del convenio 1007-2020 suscrito entre el PDA, Municipio y MVCT, es necesario que el municipio adelante y garantice el permiso con el propietario a fin de poder ingresar y adelantar las intervenciones requeridas. Por lo que se solicita adelantar las gestiones con la suficiente antelación a fin de evitar contratiempos que generen atrasos en la ejecución de actividades.

Delegada de Aqualia solicita se pongan copia las gestiones que se adelanten a fin de contar con las respectivas trazabilidades.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones. Las partes indican que no se tienen temas a tratar.

Al respecto Secretario de Infraestructura indica que desde que se empezó a trabajar en la planta la comunidad ha reportado presencia de sedimentos en el servicio, al respecto desde Aqualia indica que se realizará la consulta con el área de tratamiento a fin que se emita una respuesta respectiva.

2 Compromisos


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar permiso de ingreso al predio para realizar actividades en el punto de captación e instalación de tubería de impulsión.	Municipio de San Antero	Presentar avances en próxima mesa de seguimiento.
2	Remitir copia a delegado de Aqualia frente a las gestiones que se adelanten.	PDA	Según se desarrollen
3	Citar a próxima mesa técnico de seguimiento incluyendo al Municipio de San Antero	MVCT	13/-Nov/2024
4	Gestionar tema de sedimentos en el servicio con el área de tratamiento de Aqualia	Aqualia	13/Nov/2024

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento: [Mesa Técnica de Seguimiento Convenio CUR 1007-2020 San Antero-20241106 164323-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

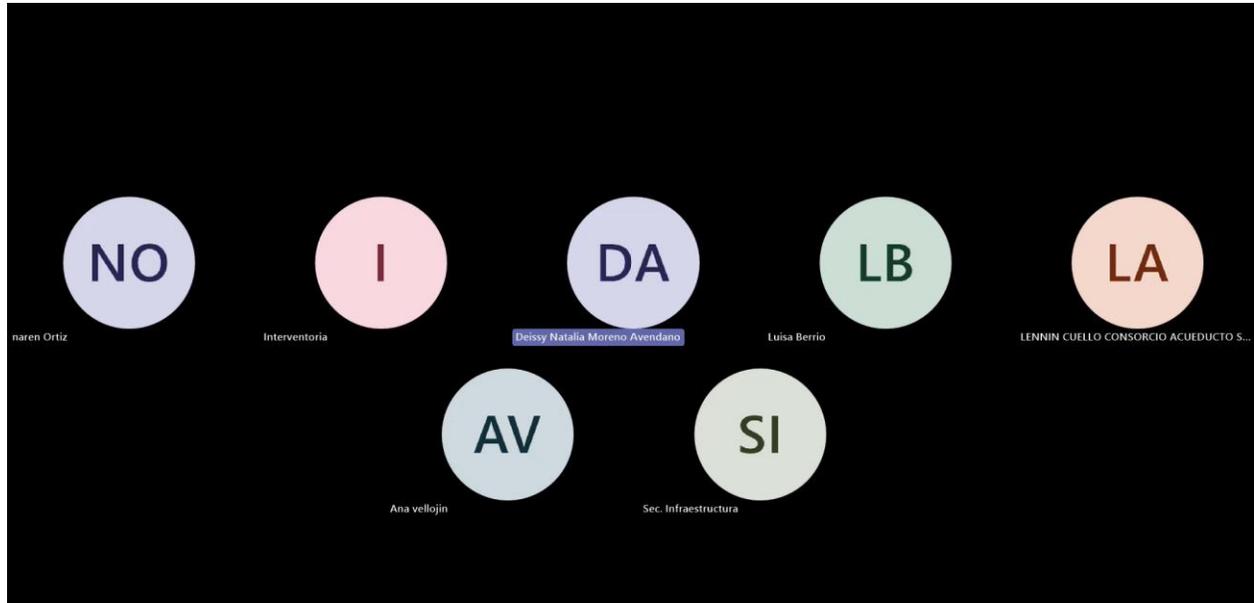

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 13 de noviembre de 2024
