



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 4 NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de noviembre de 2024.
HORA:	10:30 a.m. a 12:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realizo reunión el 5 de noviembre de 2024 de revisión hidráulica de la reformulación No. 1 en el MVCT. Con lo siguiente:

A. Permisos de vertimiento, el contratista informa que se entregaron nuevas coordenadas y el Municipio realizo trámite ante Corporinoquia.

B. Permisos de ocupación de cauce: se tiene permiso de 8 puntos de ALL, el municipio radico permiso de 2 puntos de ALL ante Corporinoquia y 2 permisos de pasos elevados sanitarios.

c. Tramos de Aguas Lluvias: se tienen 3 tramos nuevos, se elimina redes en el barrio Guaratara, se cambian diámetros en la cll2 y cll 6.

D. Tramos sanitarios:

Se solicita que el tramo Cra 12 y Cra 11 con cll 5 rediseñado en 10", se mantenga el diámetro viabilizado de 8", por ser tramo inicial.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

E. De acuerdo con la información suministrada en la reunión del 5 de noviembre, el profesional hidráulico del Ministerio continua con la revisión hidráulica.

F. Se debe revisar el EOT y se debe presentar oficio de soporte para los tramos sanitarios eliminados solicitados por el Municipio.

El 29 de octubre de 2024 el Ministerio envía observaciones del presupuesto a EPC

El 5 de noviembre de 2024 el Ministerio envía observaciones estructurales a EPC.

El 5 de noviembre de 2024 en reunión, el Ministerio realiza observaciones hidráulicas a EPC.

El 8 de noviembre de 2024 el Ministerio envía observaciones de Geotecnia a EPC.

El proyecto Hidráulico continua en revisión del especialista del Ministerio.

El proyecto Eléctrico se encuentra en revisión del especialista del Ministerio.

El Ministerio informa que a la fecha no se ha recibido respuesta a las observaciones solicitadas.

EPC informa que con la entrega de las observaciones se realiza mesa de trabajo para definir radicación de la reformulación No. 1 al Ministerio.

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

EPC informa: El municipio realizó la contratación para la reubicación del laboratorio y zona de operación sin embargo es necesario que previo al inicio de Estas actividades se efectúe una coordinación con los propietarios de los predios aledaños a la planta de tratamiento y la zona de acceso debido a las posibles afectaciones que puedan ocurrir con el desarrollo de las obras dicha coordinación está a cargo de la secretaría de planeación del municipio

De igual forma el contratista de las actividades de traslado de laboratorio y e instalaciones de operación también se encuentra participando en el proceso para generar una solución que permita el desarrollo de las actividades a la brevedad posible

Una vez efectuó el traslado de las instalaciones se podrán articular las obras de la plata de tratamiento iniciando por la demolición de la caseta de operación existente lugar donde se proyecta las nuevas estructuras de la planta.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Estas combinaciones son necesarias para minimizar el impacto sobre el proceso de potabilización y efectos sobre la prestación de servicios.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

En reunión del 14 de noviembre de 2024, EPC ing. Jessica González informa que la contratista continua con los diseños de pasos elevados y cuenta con tres meses para presentar los diseños, presupuesto e implantación, hasta el 26 de diciembre de 2024.

Se realizó reunión con el Municipio, EPC y Ministerio el martes octubre 29 de 2024 a las 10 a.m. donde el Alcalde informo que se encuentra trabajando en la reparación de la fase I, también informa que con un avance de reparaciones del 50% no se requerían pasos elevados para la fase I. El Alcalde va a Solicitar a EPC el cambio de tubería por manguera teniendo inestabilidad en el terreno existente y por funcionalidad del proyecto.

EPC programa reunión con contratista el 20 de noviembre de 2024 para revisión de avance de los diseños de pasos elevados.

EPC informa que los diseños van a ser revisados y aprobados por la Interventoría.

Interventoría entrega a EPC cotización de aprobación de estudios y diseños para el 22 de noviembre de 2024 para que EPC inicie modificación al contrato de Interventoría.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

-El contratista de obra e Interventoría entregaron informe final a EPC el 21 de octubre de 2024. EPC se encuentra en revisión del informe y lo remitirá al Municipio para su revisión.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa y entrega:

1. Acta de terminación con fecha 30 de agosto de 2024.
2. Acta de entrega de la propiedad al Municipio firmada el 12 de noviembre de 2024.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Aprobación de Pólizas que ampara acta de terminación del contrato firmada el 8 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta de observaciones de presupuesto, estructurales, geotécnicas, hidráulicas, oficio revisión EOT- Paratebueno	Contratista de Obra e Interventoría y EPC	27-11-2024
2	Reunión revisión reformulación No. 1 - observaciones - Paratebueno	EPC - Contratista de Obra e Interventoría, mvct.	29-11-2024
3	Revisión avance consultoría pasos elevados- San Bernardo	EPC - Contratista consultor e Interventor	20-11-24
4.	Entrega cotización aprobación estudios y diseños pasos elevados a EPC - San Bernardo	Interventoría	22-11-2024

FIRMAS:

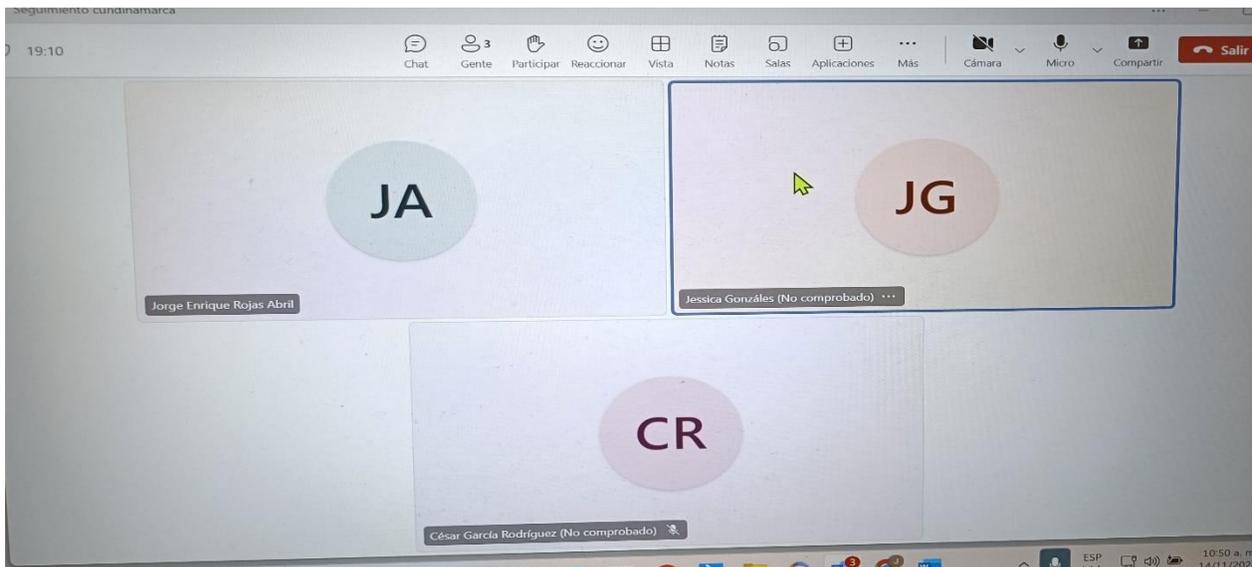



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
Fecha: 14-11-24
