



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 01 de noviembre de 2024 |
| HORA: | De 10:00 a 11:00 horas |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | Iván Alberto Gómez - Ecopetrol Rocio de Pilar Castellanos - Ecopetrol Héctor Valderrama - Ecopetrol Amelia Luna Sáchica - Oficina de Planeación Municipal Tibú Oscar Cano - Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy. |
| INVITADOS: | N/A |

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al municipio de Tibú, en el proceso de estructuración de la solicitud de reformulación Nro. 5 del proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU".

DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión por parte del MVCT y se revisó el estado de cumplimiento de los siguientes compromisos:

-Informe de visita del componente eléctrico a la PTAP por parte el Municipio de Tibú. La visita fue realizada el 09 de septiembre de 2024 y se remitió al MVCT copia del informe el 09 de octubre de 2024.

-Recorrido para revisión de interferencias de la línea de impulsión con las redes de Ecopetrol. Se encuentra pendiente de realizar.

-Definición del Municipio de Tibú, para el ejecutor de las obras del Acuerdo de Cooperación Nro. 2 relacionadas con la construcción de la nueva línea de impulsión y estación de bombeo. El Municipio manifestó que revisó internamente la propuesta pero no está interesado en ser el ejecutor de las obras indicadas.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

-Con respecto a la reunión programada por el Municipio de Tibú, para adelantar una reunión con el DNP para la revisión del proyecto, no se ha podido concretar la reunión en razón a que los profesionales del DNP no han tenido la disponibilidad.

Por parte de Ecopetrol, se manifiesta su preocupación por el bajo avance en la estructuración de la reformulación por parte del Municipio de Tibú. Al respecto el municipio indicó que no tienen los especialistas necesarios para hacer una revisión detallada de cada componente, por lo que solicitaron apoyo al DNP, pero deben acogerse a los tiempos disponibles de dicha entidad.

Por parte del MVCT se indicó que se ajustó el costeo del diagnóstico, incluyendo las redes de distribución y el cronograma de ejecución de dicha actividad. Asimismo, se indicó que se realizaron varias reuniones internas, donde se definió por parte de la Directora los recursos para ejecutar el diagnóstico y será Findeter el ejecutor de los mismos.

Ecopetrol manifestó que se solicitó reunión con la nueva Subdirectora con el fin de revisar aspectos del Acuerdo de Cooperación Nro. 1 y la estructuración del Acuerdo de Cooperación Nro. 2.

Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.


COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | Avanzar en el proceso de estructuración de los formatos de la solicitud de reformulación. | Municipio de Tibú | Permanente |
| | | | |

FIRMAS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUxOGIxNzEtOTYzYS00ZTU0LWE1NWMtYzY4NjIxZmE3MGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%22%2c%22Oid%22%3a%225f0027b9-7c28-4ef9-af5f-41537249b04c%22%7d



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

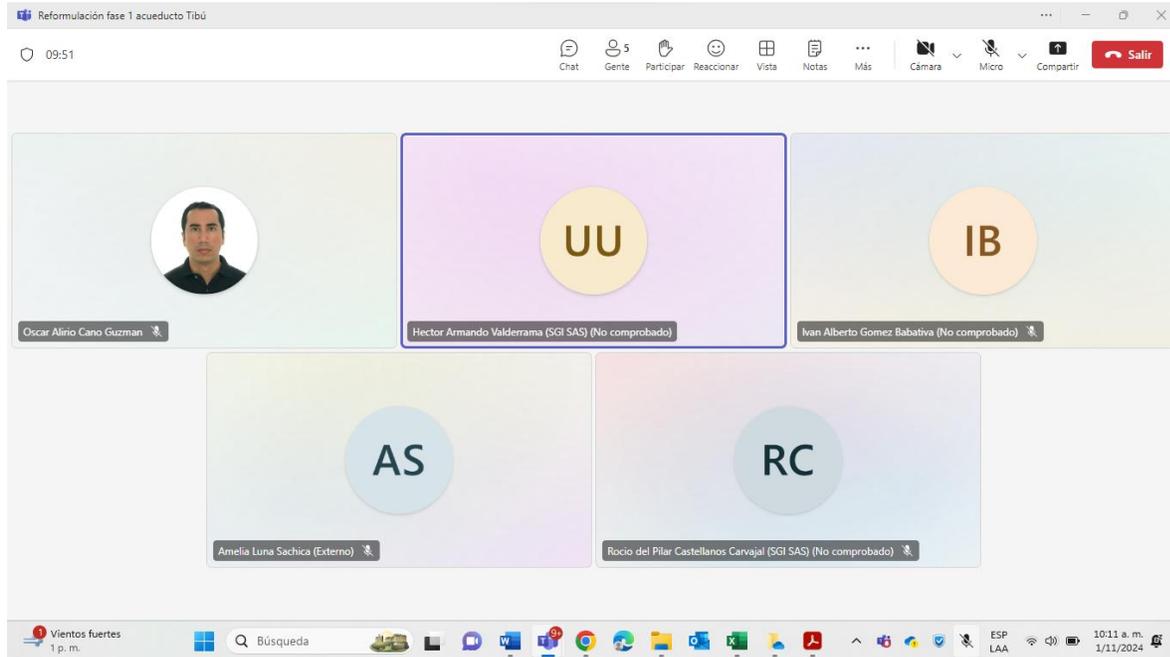

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 01-nov-2024
