

ACTA No. 5 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de Diciembre de 2024.
HORA:	12:30 p.m. a 1:30 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

Ingeniera María Ruiz de Piedecuestana informa que se tiene un avance de 70,38 % contra un 69,85% de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses e informe semanal 29 del 8 de noviembre de 2024.

Ingeniera María Ruiz de Piedecuestana informa que el contratista está realizando acta de mayores y menores cantidades de acuerdo con el terreno encontrado, para revisar posible reformulación del proyecto.

El contratista entrega el acta de mayores y menores a Piedecuestana el 18 de diciembre de 2024.

Se programa reunión con el Ministerio para el 23 de diciembre de 2024 a las 10 a.m.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión técnica	MVCT, Contratista Obra e Interventoría, Piedecuestana	23-12-2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2	tramite prorroga al convenio 1371- 2023	MVCT- Piedecuestana	30-11-2024
3	Cumplir con las reuniones de veeduría Ciudadana	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	30-11-2024
4	Actualización del sigevas	Piedecuestana	15-11-2024

FIRMAS:

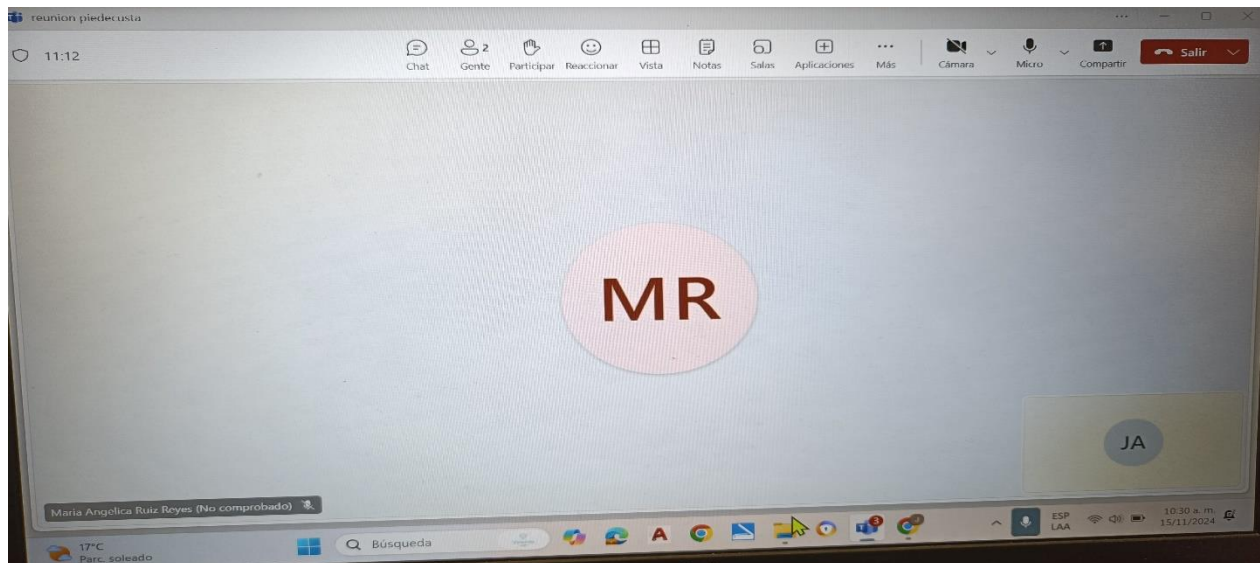

Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS

Fecha: 12-12-24
