



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de Diciembre de 2024.
HORA:	10:30 a.m. a 11: a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. **Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"**

DESARROLLO:

Ingeniera Leydy Buitrago de interventoría informa que con informe del 9 al 15 de diciembre de 2024 con informe semanal 30, se tiene un avance de 72,89 % contra un programado del 71,57% de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses.

Se informa que todos los suministros se encuentran en obra. Dificultad de traslado de materiales.

Con respecto a los realces de muros existentes, se está gestionando para el mes de enero de 2025 de necesidades del proyecto, para realizar estabilización de la tubería.

Obra de contención mínima y reforzamiento de columnas para paso aéreo. Se entrega información del contratista a Interventoría el 10 de enero de 2025. para remitir a Piedecuestana.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Entrega informe posible reformulación	Contratista Obra a Interventoría	10-01-2025
2	Reunión seguimiento	MVCT- Piedecuestana	13-01-2025
3	Cumplir con las reuniones de veeduría Ciudadana	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	31-01-2025

FIRMAS:

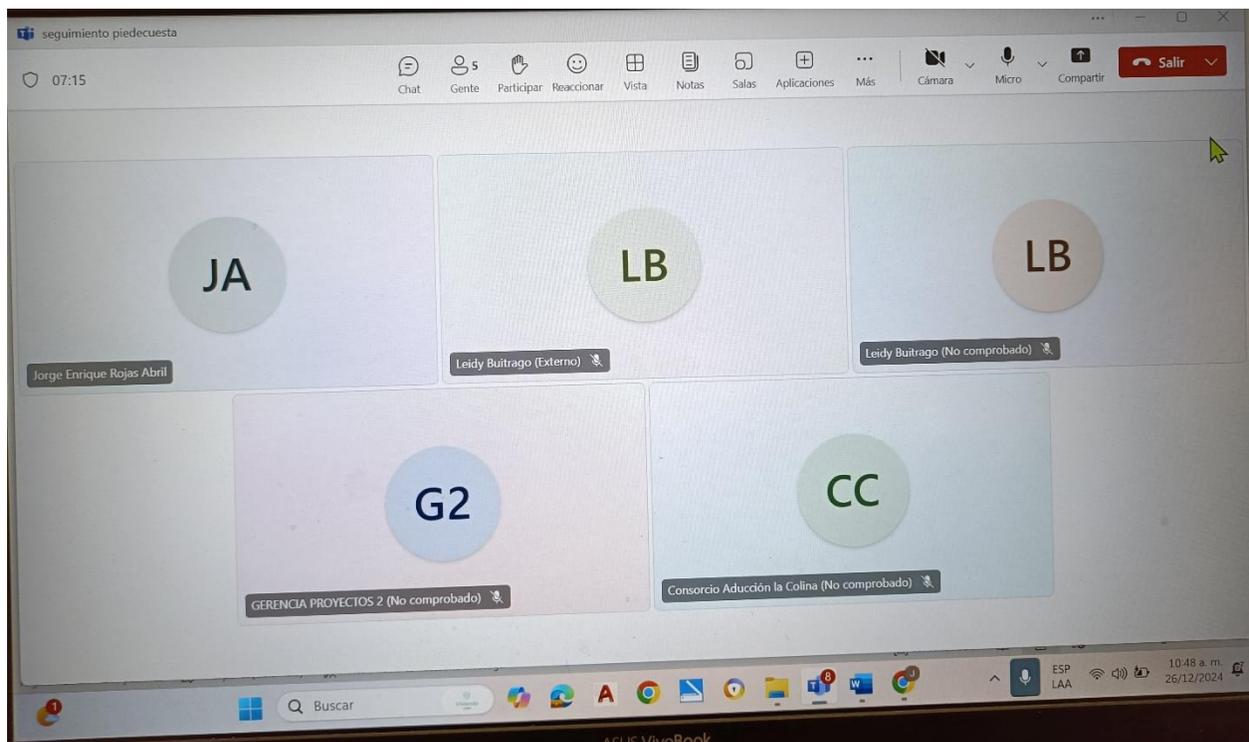

Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS

Fecha: 26-12-24
