



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de enero de 2025
HORA:	De 02:30 pm a 03:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión Rubén Eli Noriega – Jefe Área TécnicaContratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San AnteroAQUALIA Ana Vellojin Argel – Apoyo a la supervisiónAlcaldía Municipio de San Antero. María José Padilla – Apoyo Jurídico.MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría
2. Gestiones frente a predio - Alcaldía Municipal
3. Prórroga Permiso Intervención INVIAS
4. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento
5. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría y prórroga permiso intervención INVIAS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Interventoría informa que la semana pasada se reactivaron las actividades de instalación de tuberías, ya se cuenta con la prórroga del permiso de intervención por parte del INVIAS. Adicionalmente se está avanzando en la instalación de tuberías de 16 pulgadas, de la cual hacen falta alrededor de 450m para culminar el tramo. En la PTAP se han adelantado actividades de la construcción de los floculadores

Por otro lado, la interventoría informa que no se ha avanzado en la instalación de tubería en la entrada al punto de captación, lo anterior debido a que no se ha tenido respuesta por parte de la alcaldía de San Antero en el acompañamiento policial para entrar al predio en el que se deben realizar las actividades.

El Ministerio solicita registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

Interventoría informa de un avance en la ejecución de obra de 64.75% contra un 82,72% programado.

2. Gestiones frente a predio - Alcaldía Municipal

El PDA informa que ha realizado los requerimientos a la alcaldía de San Antero para el acompañamiento policial al momento de ingresar al predio, se ha remitido la programación para ingresar el 16 de enero de 2025 al predio

De igual manera el ministerio informa que ha realizado la debida gestión, en el cual remitió un oficio a la alcaldía de San Antero para solicitar las gestiones adelantadas para el acompañamiento policial, adicionalmente se han comunicado telefónicamente con personal de la alcaldía.

Interventoría informa que también se ha contactado con personal de la alcaldía de San Antero, donde le manifestaron que la solicitud ya se había remitido a la policía del municipio de Lorica.

Con respecto a las gestiones adelantadas para el acompañamiento policial, la alcaldía de San Antero informa que se ha remitido un oficio a la secretaria de gobierno del municipio de Lorica, y a la estación de policía del municipio de San Antero, los cuales manifiestan no tener jurisdicción en la zona, sin embargo realizaran acompañamiento y darían traslado a la solicitud realizada a la policía de Lorica. De igual forma la alcaldía de San Antero enviará a un delegado el 16 de enero de 2025.

De acuerdo con el cronograma las partes acuerdan encontrarse el día 16 de enero de 2025 a las 7 am en la entrada al predio en el que se instalará la tubería.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El PDA invita a la alcaldía de San Antero a que se realicen las gestiones prediales, teniendo en cuenta las responsabilidades enmarcadas en el convenio marco, responsabilidades en cuanto al tema de permisos, licencias, servidumbres, entre otros, que están en cabeza del municipio

3. Otros:

El PDA solicita saber si entre el contratista y AQUALIA han realizado el balance. Interventoría informa que a la fecha no se ha cerrado el balance, debido a que están esperando una información que se solicitó directamente a AQUALIA.

AQUALIA informa que remitirá la información entre el viernes 17 y lunes 20 de enero de 2025. El contratista informa que requiere de 5 días para realizar el balance después de la remisión de información por parte de AQUALIA, entregando el balance el 24 de enero de 2025.

Interventoría manifiesta que se requieren 2 días para realizar la revisión una vez entregue el contratista, aproximadamente el lunes 28 de enero de 2025 remitirá el balance a AQUALIA. Por último, AQUALIA menciona que después de recibido realizará la revisión en 2 días para poder entregar el balance al PDA el miércoles 29 de enero de 2025.

Por ultimo el consorcio menciona que el día de mañana 15 de enero de 2025 estará entregando la solicitud de prórroga por un tiempo inicialmente estimado de 4 meses a AQUALIA

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acompañamiento policial y de la alcaldía.	Alcaldía de San Antero	17/Enero/2025
2	Entrega del Balance al PDA	Contratista, Interventoría, AQUALIA	29/Enero/2025
3	Solicitud de prórroga	Contratista	15/Enero/2025

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento: [CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20250114 144524-Grabación de la reunión.mp4](#)


FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero Chat Compartida **Resumen** Asistencia Entrena

14 ene 2025 2:30 p.m. - 3:30 p.m.

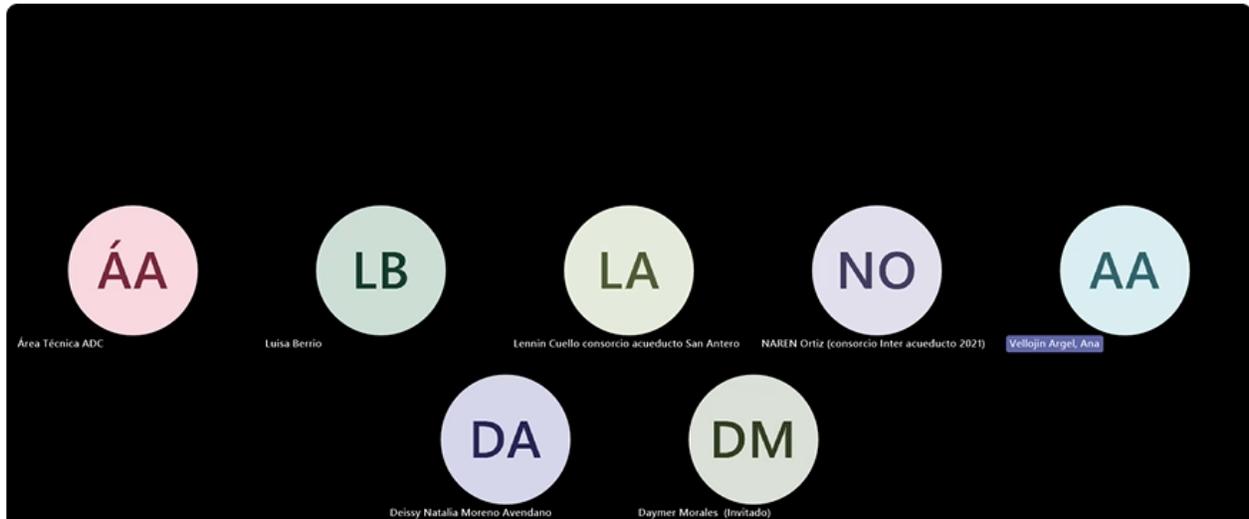

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 14 de enero de 2025
