

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta - Comité de seguimiento del 15 de enero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1388-2024 MVCT – Municipio de Pueblo Rico (Risaralda)

Proyecto: «Construcción Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Mediante el Aprovechamiento de las Aguas Lluvias (Scall) en Comunidades Indígenas Municipio Pueblo Rico (Risaralda)»

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de enero de 2025
HORA:	9:00 a 10:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Jose Agustín Vargas - Profesional Especializada MVCT Ana María Arcila - Supervisora Derivados PDA Risaralda Francy Elena Abad – Apoyo Componente Social PDA Risaralda Laura Jiménez – Residente interventoría Esneyder Herrera - Residente obra Cesar Mauricio Parra - Apoyo a la supervisión Convenio MVCT
INVITADOS:	Equipo técnico y social del contratista de obra e interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento componente técnico del proyecto
2. Seguimiento componente social del proyecto
3. Seguimiento componente institucional del proyecto
4. Compromisos

DESARROLLO

En el marco de las acciones que adelanta por el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1388-2023 Proyecto denominado: "Construcción Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (Scall) en comunidades Indígenas Municipio Pueblo Rico (Risaralda)", el cual finaliza el 03 de abril de 2025, se desarrolla el siguiente comité con el Ejecutor del proyecto – PDA de Risaralda, contratista de obra e interventoría, en el cual se tratan los siguientes temas:

1. Seguimiento componente técnico del proyecto

Informa la interventoría del proyecto que el avance físico programado el del 100% contra un avance físico ejecutado del 100% de las obras del proyecto.

Este avance corresponde a la finalización de las obras de diez (10) sistemas de captación de agua lluvia (SCALL). En el mes de noviembre de 2024 el PDA de Risaralda realizó la entrega de los 10 SCALL al Municipio de Pueblo Rico. Se tiene en proceso de firma las 10 actas de entrega por parte del PDA de Risaralda para lego

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

pasar a firma del Alcalde Municipal de Pueblo Rico. Una vez se cuenten con las actas firmadas, el PDA adelantará el cargue de estas en el sistema SIGEVAS.

Por otra parte, el MINISTERIO solicita la entrega de los informes de supervisión del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, para lo cual el PDA informa que están en firma por parte del Alcalde de Pueblo Rico. El Ministerio solicitó al PDA la entrega y el cargue en el sistema SIGEVAS de los citados informes antes de que se finalice el mes de enero de 2025.

2. Seguimiento componente social del proyecto

El contratista de obra y la interventoría hace una presentación de los avances en este componente, informando que con corte al 11 de enero de 2025 se tiene un avance programado del 91,76% contrata un avance ejecutado del 91,76%.

Se informa que el componente social se compone de 3 fase. (1) Línea de comunicación, (2) Línea de participación ciudadana, y (3) Línea de capacitación. Las primeras dos fases ya se ejecutaron, y se encuentran cerrando la ejecución de la fase 3, en la cual se tiene previsto realizar la rendición de cuentas a los miembros del comité de la veeduría del proyecto, y la comunidad beneficiada, a través de la cual, el PDA de Risaralda rendirá un informe detallado de la ejecución técnica y presupuestal en el marco de la ejecución del proyecto. Se tiene previsto revisar en el mes de enero de 2025, el plan de trabajo y la fecha específica para adelantar esta rendición de cuentas con presencia del Ministerio en territorio.

Sobre el particular, el Ministerio informó que se tiene previsto realizar visita al territorio en el mes de febrero de 2025 con el objetivo de hacer el cierre del componente social. Se informa que la fecha será acordada con el PDA de Risaralda y la disponibilidad de recursos para la autorización de comisiones en el Ministerio.

3. Seguimiento componente institucional del proyecto

Es importante señalar que al comité asistió el profesional designado por el Ministerio para apoyar el seguimiento del componente Social José Agustín Vargas, quién adelanta la revisión de la información que se tiene del proyecto, específicamente en los que tiene que ver con el aseguramiento institucional.

El contratista de obra y la interventoría presentan la información de los avances que se tiene con corte al 11 de enero de 2025, informando que el porcentaje de avance programado es del 80,00% contrata un avance ejecutado del 80,00%.

Informan sobre la constitución de los Comités de Saneamiento Básico y Educación e Higiene constituidos por miembros de la comunidad indígena, para la operación, mantenimiento de los SCALL. Se especifica que las capacitaciones están relacionadas con saneamiento básico, educación en higiene, uso del sistema SCALL, donde se explica el funcionamiento de cada componente (panel solar, planta de tratamiento, caseta, tanque de almacenamiento, elementos de envasado de agua, otros). Adicionalmente, se capacita para realizar el mantenimiento periódico a todo el sistema

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se informa que se desarrollaron en conjunto con las comunidades el reglamento interno de funcionamiento del comité de saneamiento básico y el reglamento intercultural de uso del sistema.

Por otra parte, el contratista de obra y la interventoría informan que el 8 de enero de 2025 se iniciaron las capacitaciones que se tiene establecidas en el numeral 4.1 del anexo técnico institucional del proyecto, las cuales van dirigidas a los comités de saneamiento básico y educación e higiene constituidos por miembros de la comunidad indígena. Las capacitaciones las está impartiendo la Corporación Educativa MILENIUM, la cual tiene programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Se tiene previsto que en el mes de enero de 2025 se finalicen estas capacitaciones.

Por parte del contratista de obra se informa que a pensar de que se hicieron gestiones para firmar un convenio interadministrativo con el SENA para impartir estas capacitaciones, no fue posible, teniendo en cuenta que se presentaron dificultades con el pensum, la logística y los tiempos que establece el numeral 4.1 del anexo técnico del proyecto.

Teniendo en cuenta la información presentada sobre los avances del componente institucional, el profesional Agustín realizó entre otras, preguntas relacionadas con la conformación que tienen para la ejecución del proyecto, si el cronograma de avance está en función de productos y actividades, lo que se ha ejecutado y lo que aún falta para cerrar el componente institucional.

Adicionalmente, informó que se requiere que la Alcaldía de Pueblo Rico garantice un acompañamiento más allá del 9 de abril de 2025, fecha en la finaliza el proyecto, para garantizar que haya continuidad en la operación del proyecto. Se solicita al PDA de Risaralda que haga las gestiones correspondientes para que una vez sea entregado el proyecto al Municipio, este tenga ese compromiso de seguir con el acampamiento a las comunidades.

Así mismo el profesional solicitó lo siguiente:

Enviar un informe a más tardar el 24 de enero de 2025 revisado y validado por el PDA de Risaralda, en el cual se incluya:

- Las gestiones realizadas hasta la fecha y las que hacen falta para cerrar el componente
- Incluir todas las gestiones y soportes que se adelantaron para la contratación con el SENA.
- Actualizar el sistema SIGEVAS en lo que corresponde con el componente institucional
- Enviar un cronograma donde se identifique el avance en función de los productos y actividades que indica el anexo técnico del proyecto.
- Una vez sea revisada esta información por parte del Ministerio, se citará a reunión para la revisión de las recomendaciones que salgan producto del análisis de la información allegada.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta


4. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega al Ministerio las actas de entrega y recibo a satisfacción de las obras finalizadas en el proyecto.	Ejecutor - PDA Risaralda	Enero de 2025
Cargue de los informes de supervisión de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 en el sistema SIGEVAS	Ejecutor - PDA Risaralda	Enero de 2025
Envío de informe con las gestiones adelantadas en el componente institucional y demás actividades solicitadas por el profesional Agustín Vargas	Ejecutor - PDA Risaralda	A más tardar el 24 de enero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión CUR1388-2023 MVCT.

Fecha: Enero 15 de 2025.

Nota: A la presente se anexan pantallazos de la asistencia de los participantes.

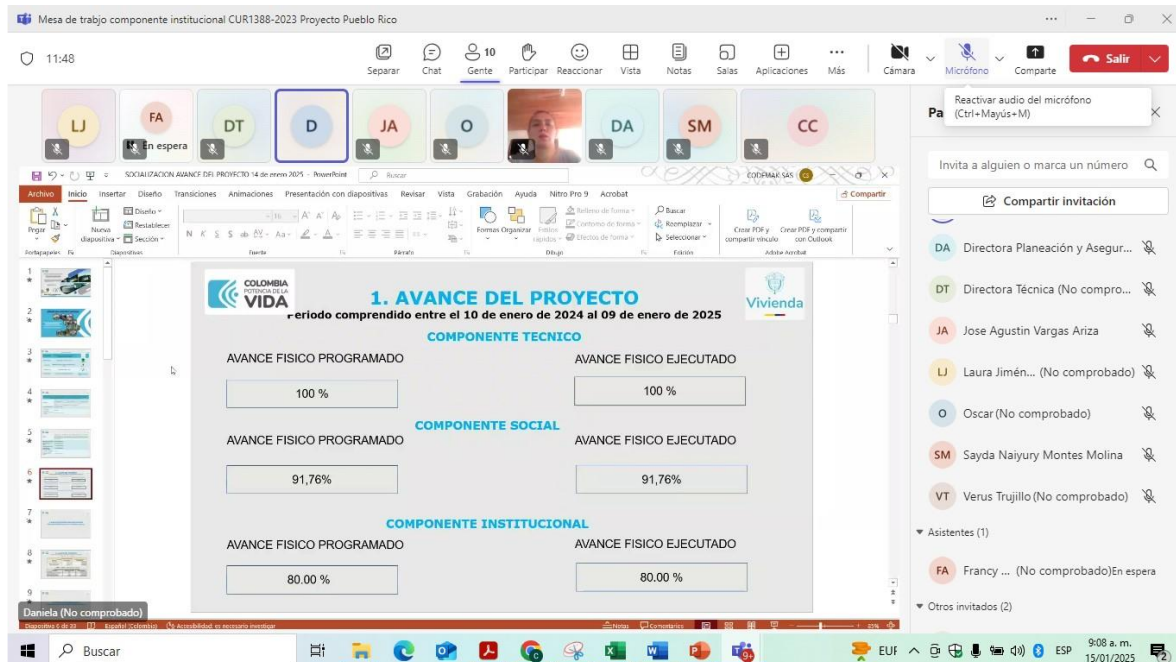

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo componente institucional CUR1388-2023 Proyecto Pueblo Rico

23:56

Separar Chat Gente 10 Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

LJ DT **D** JA O VT DA SM FA CC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ETAPA I PRELIMINAR

POSIBLE CONVENIO CON EL SENA



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Quitar](#)

Laura Jiménez (No comprobado)

www.minvivienda.gov.co

Buscar

Próx... ESP 9:20 a. m. 15/01/2025

Transcripción

componente de gestión social.

Entonces se tomó la decisión que esas personas que van a hacer servimos de apoyo para nosotros, para el funcionamiento del sistema también nos van como las personas seleccionadas para capacitar esas 5 personas que es eligieron en la conformación del Comité de saneamiento, son las que vamos a preparar como tal en la Comunidad para que se capaciten en el uso del sistema, aquí también en este, en esta etapa me solicitan la caracterización, la actualización de la base de datos, esto con apoyo en los profesionales sociales del componente de gestión social, se hizo la respectiva actualización de datos.

D Daniela (No comprobado) 9:20 a. m. Pues ya basándonos en el censo y también con apoyo de las autoridades y líderes de cada comunidad, entonces fue efectiva esta entrega y esta tabulación de información

Mesa de trabajo componente institucional CUR1388-2023 Proyecto Pueblo Rico

24:57

Separar Chat Gente 10 Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

LJ DT **D** JA O VT DA SM FA CC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ETAPA I PRELIMINAR

SE REALIZA CONVENIO ADMINISTRATIVO CON LA CORPORACION EDUCATIVA MILLENIUM



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Quitar](#)

Laura Jiménez (No comprobado)

www.minvivienda.gov.co

Buscar

Próx... ESP 9:21 a. m. 15/01/2025

Transcripción

Siempre hubo inconvenientes porque el SENA se maneja por varios Días por diferentes centros de formación, cada uno maneja su centro de tecnología, su centro de agropecuario.

¿Entonces, como nos decían, Sera nosotros?

Podemos colaborar asignándoles un instructor, pero ahí sí debemos verificar, contar con disponibilidad.

El instructor que el instructor se traslada en territorio, haciendo así entonces siempre hubo esa trazabilidad desde el mes de febrero, siempre se radicaron como respectivos oficios y también correos de la gestión por parte de nosotros también porque ya contábamos con las 50 personas que se iban a capacity.

D Daniela (No comprobado) 9:21 a. m. Espie disponibilidad instructor y también por falta de actualización de la plataforma
