



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	12 de febrero de 2025
HORA:	De 10:00 a 10:52 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Manuel Enrique Peña Teherán Secretario de Planeación municipal de Magangué e-mail: <a href="mailto:planeacion@magangue-bolivar.gov.co">planeacion@magangue-bolivar.gov.co</a></li><li>- Álvaro José Salcedo Jefe de Proyectos Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:alvaro-jose.salcedo@veolia.com">alvaro-jose.salcedo@veolia.com</a></li><li>- Walter Hernández Gerente de Planeación y Construcción, Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:walter.hernandez@veolia.com">walter.hernandez@veolia.com</a></li><li>- Félix Antonio Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:felix-antonio.dominguez@veolia.com">felix-antonio.dominguez@veolia.com</a></li><li>- Daniel Fabián Cortés Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:daniel-fabian.cortes@veolia.com">daniel-fabian.cortes@veolia.com</a></li><li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul>

### OBJETO:

Asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto “código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), con la finalidad de lograr el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.

### ORDEN DEL DIA:


1. Asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto 1-2021-60 tendiente a lograr el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

**DESARROLLO:**

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El equipo técnico de Veolia Sabana SA ESP manifestó que una vez revisadas las observaciones del componente de formulación, diagnóstico e hidráulica enviadas por el MVCT el pasado 06/feb/2025, no existen objeciones para llevar a cabo su respectiva subsanación y en esa medida se indicó que todas serán debidamente atendidas.


Entre las inquietudes planteadas por la Entidad Formuladora se preguntó al MVCT: ¿cuál es el alcance del estudio hidrológico solicitado para este proyecto?, entendiéndose que éste corresponde esencialmente a un alcantarillado sanitario.



El MVCT explicó que conforme a lo expuesto por Veolia SA ESP en la mesa de trabajo virtual del 09/may/2023, el proyecto demandó un rediseño en razón al cambio de emplazamiento de la EBAR cuenca 3, debido a una actualización del análisis de riesgo por inundación del río Magdalena y del complejo cienaguero cercano al casco urbano. En ese orden de ideas el estudio hidrológico de este proyecto debe incluir los resultados de dicho análisis de riesgo por inundación, tales que evidencien que la nueva ubicación de la EBAR cuenca 3 y el área urbana a beneficiar con este proyecto no se verá afectada por inundaciones, al menos para el periodo de retorno de diseño considerado.

De otra parte, el MVCT explicó que el estudio hidrológico también debe aportar insumos básicos para el diseño detallado de todas las estructuras o componentes del proyecto que tengan contacto directo con cuerpos superficiales de agua, o que se encuentren en sus áreas de influencia.

En cuanto a la EBAR cuenca 3 destinada para aliviar los flujos por conexiones erradas de la red de alcantarillado sanitario, Veolia SA ESP señaló que la descarga de esa EBAR en la ciénaga esta contemplada en el PSMV radicado ante la CSB, luego se solicitó al MVCT aclarar el tema del permiso ambiental para esa descarga.

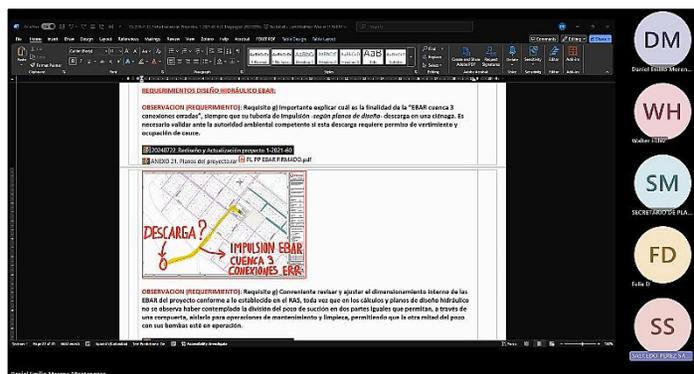

El MVCT señaló que, si bien la descarga de esa EBAR puede estar incluida dentro de los alcances del PSMV de Magangué, eso no necesariamente significa que exista la autorización ambiental para hacerlo, más aún cuando al revisar la documentación del PSMV allegada a este Ministerio, no se observó ninguna referencia o autorización implícita sobre el particular. En ese sentido lo conveniente es que la Entidad Formuladora valide formalmente ante la CSB si la descarga de la EBAR por conexiones erradas, e incluso, el proyecto en general requiere de permisos o autorizaciones ambientales para su ejecución (construcción) y operación.

Veolia SA ESP preguntó si existen observaciones del componente de topografía del proyecto, lo cual para el caso de alcantarillados es un tema neurálgico. El MVCT señaló que ese componente y los demás que a la fecha no tienen observaciones, se encuentran en evaluación por parte del equipo de Especialistas de la Subdirección, quienes son contratistas y actualmente se encuentran formalizando sus respectivos contratos de prestación de servicios y retomando los temas de evaluación de cada proyecto; el MVCT solicitó la mayor comprensión frente a este tema de contratación de los Especialistas de apoyo.

El MVCT preguntó para qué fecha se tiene previsto entregar las subsanaciones del componente formulación, diagnóstico e hidráulica del proyecto. Veolia SA ESP indicó que en 2 meses entregará al MVCT los documentos ajustados y con las subsanaciones correspondientes.

El MVCT recordó que tiene toda la disposición de ayudar y asistir técnicamente a Veolia SA ESP y al municipio de Magangué para lograr la subsanación de las observaciones que tiene el proyecto y, en consecuencia, cumplir los requisitos de la Res. MVCT 661/2019. Bajo ese entendido el MVCT celebrará las mesas técnicas que sean necesarias para suministrar las aclaraciones, orientaciones y asistencia del caso.

2. El MVCT agradeció la participación de los asistentes a esta mesa de trabajo. No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar al MVCT el 100% de las subsanaciones del componente de formulación, diagnóstico e hidráulica del proyecto 1-2021-60.	Veolia SA ESP	21/abril/2025

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 10 Alcantarillado cuenca 3 Magangué					
Attended participants	5					
Start time	2/12/25, 9:57:59 AM					
End time	2/12/25, 10:52:44 AM					
Meeting duration	54m 45s					
Average attendance time	47m 38s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/12/25, 10:00:13 AM	2/12/25, 10:52:44 AM	52m 31s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Felix D (Unverified)	2/12/25, 10:01:48 AM	2/12/25, 10:52:38 AM	50m 49s			Presenter
SALCEDO PEREZ SALOME	2/12/25, 10:06:54 AM	2/12/25, 10:52:41 AM	45m 46s	salome.salcedo@colmercedes.edu.co	salome.salcedo@colmercedes.edu.co	Presenter
Walter Hdez (Unverified)	2/12/25, 10:07:46 AM	2/12/25, 10:52:39 AM	44m 52s			Presenter
SECRETARIO DE PLANEACION MAGANGUE (Unverified)	2/12/25, 10:08:32 AM	2/12/25, 10:52:44 AM	44m 12s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/12/25, 10:00:13 AM	2/12/25, 10:52:44 AM	52m 31s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Felix D (Unverified)	2/12/25, 10:01:48 AM	2/12/25, 10:52:38 AM	50m 49s		Presenter	
SALCEDO PEREZ SALOME	2/12/25, 10:06:54 AM	2/12/25, 10:52:41 AM	45m 46s	salome.salcedo@colmercedes.edu.co	Presenter	
Walter Hdez (Unverified)	2/12/25, 10:07:46 AM	2/12/25, 10:52:39 AM	44m 52s		Presenter	
SECRETARIO DE PLANEACION MAGANGUE (Unverified)	2/12/25, 10:08:32 AM	2/12/25, 10:52:44 AM	44m 12s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Manuel Peña (municipio de Magangué).

Álvaro Salcedo, Walter Hernández, Félix Dominguez, Daniel Cortés (Entidad Formuladora).
