



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01-2025

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de febrero de 2025
HORA:	De 11:00 am 12:00 pm
LUGAR:	Virtual Plataforma Teams
ASISTENTES:	Jessica Gonzales – Ing. Apoyo EPC Manuel Gonzales – R/L suplente Interventoría Johan Rodríguez Residente interventoría Felipe Lavado – Coordinador Interventoría Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	Jessica Gonzales – Ing. Apoyo EPC Manuel Gonzales – R/L suplente Interventoría Johan Rodríguez Residente interventoría Felipe Lavado – Coordinador Interventoría Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista

### ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Estado tramite inicio contrato de obra

### DESARROLLO:

- Se inicia la reunión con la presentación de los asistentes.
- Se reporta de parte de EPC que se debe proceder con la reformulación del proyecto ya que estaría desactualizado.
- La interventoría presenta su informe preliminar donde indica que se identificaron errores de diseño



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- No se cumple con la norma técnica arquitectónica
- No se tiene medidas de protección del sistema eléctrico por norma se debe presentar.
- Discrepancias entre especificaciones técnicas, planos y presupuesto para el componente eléctrico, arquitectónico e hidráulico.
- Topografía del año 2021, se debe actualizar topo batimetría para analizar si hubo cambios en el comportamiento del río.
- En el componente estructural hay discrepancias entre planos y memorias, se requieren nuevos ensayos incluso del acero ya instalado.
- Los componentes álgidos son el estructural, eléctrico y geotécnico.
- En el componente estructural se incumple NSR-10.
- La reformulación No. 6 fue elaborada y presentada por EMSERSOPO sin que hubiera una interventoría.
- Interventoría indica que no se recomienda iniciar las actividades de obra hasta que se subsane la totalidad de las observaciones, representa una carga administrativa para la interventoría que no se asumirá.
- Los contratos de obra e interventoría no tienen el alcance de la actualización de los diseños, en reunión con EMSERSOPO ellos indican que a la fecha no tienen recursos para asignar a esta actualización.
- Para el próximo viernes 28 de febrero de 2025 reportará las conclusiones de las mesas de trabajo internas entre contratista e interventoría con el fin de definir cuáles son los componentes que deben ir a reformulación.
- EPC remitirá copia de informe inicial de la interventoría al MVCT para conocimiento el día 21 de febrero de 2025.
- Para el próximo 07 de marzo de 2025, EPC debe reportar si EMSERSOPO ya definió fuentes de financiación.
- EPC indica que a la fecha en el plan de acción del municipio no se dejó plata adicional para este proyecto lo que impediría que el PDA aportara el dinero faltante.

- Se solicita a EPC reiterar al Municipio de Sopo a importancia de contar con los recursos para culminar las obras ya que hay una infraestructura construida que no opera.
- Una vez se defina fuentes de financiación y el alcance de la reformulación se debe remitir



**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Conclusiones de las mesas de trabajo internas entre contratista e interventoría con el fin de definir cuáles son los componentes que deben ir a reformulación	EPC	28-02-25
2	Copia de informe inicial de la interventoría al MVCT	EPC	21-02-2025
3	reportar si EMSERSOPO ya definió fuentes de financiación.	EPC	07-03-25

**FIRMAS:**



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

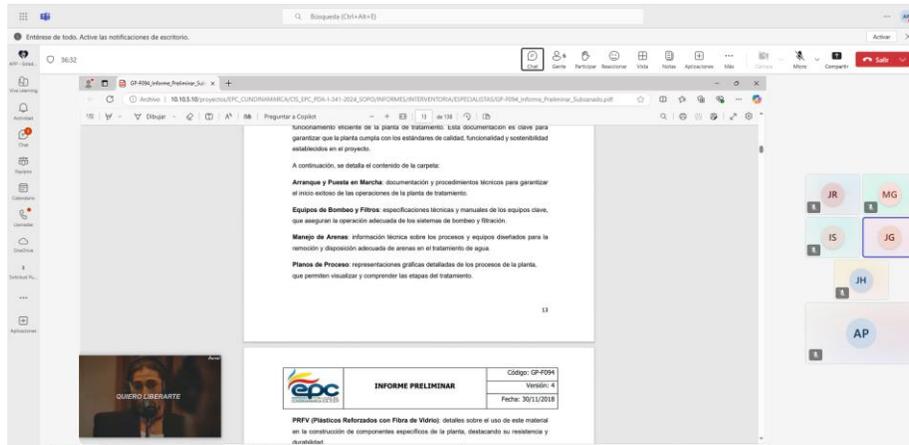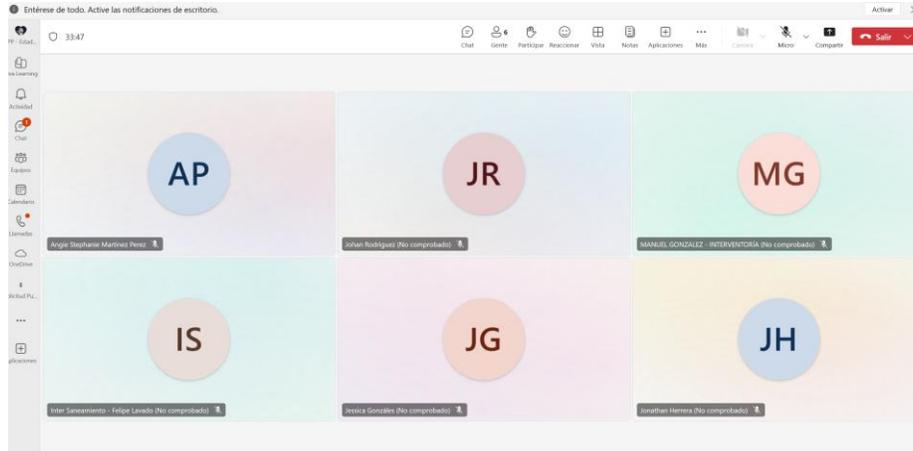

**ANGIE MARTÍNEZ PÉREZ**  
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Angie Martínez Pérez  
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez  
Fecha: 21 de febrero de 2025
