

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de abril de 2025
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Yeniffer Jiménez, Ingeniera Civil, Consultoría del proyecto, consultoriachoco@gmail.com Yudy Surgey Moreno, Ingeniera Civil, apoyo de área técnica PDA. Alvaro Andrés Corcho Ramírez, Ingeniero Civil, Contratista, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos, DIDE, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Héctor Emilio Mosquera, Ingeniero Civil, área técnica del PDA de Chocó, areatecnica@aguasdelchoco.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de los compromisos y estado del proyecto **1-2023-76 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN.**
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 14 de abril de 2025 la Ingeniera Yeniffer Jiménez de la consultoría del proyecto **1.2023-76 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN.** Por parte del PDA, quien es el formulador del proyecto, se encuentra la Ingeniera Surgey Moreno. Quien brinda la asistencia por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra el ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. Se inicia con la recapitulación del estado del proyecto en cuestión, se indica que, por parte del ministerio se encuentra en revisión el componente estructural y de topografía, y que se espera que en las próximas semanas se tenga la evaluación de estos componentes.


3. Sobre el componente de geotecnia la ingeniera Yeniffer Jiménez indica que no se ha podido establecer fechas de entrega, ya que el encargado de este producto, quien es subcontratista de la consultoría, y que se encuentra a la espera de confirmación de los tiempos del profesional, sin que este se haya comprometido.
4. El Ingeniero Alvaro Corcho propone realizar una mesa de trabajo y citar a el profesional con el fin que se comprometa ante el ministerio con unas fechas pactadas, esto ya que la solicitud de información se ha realizado en un tiempo mayor a 6 meses.
5. Sobre el componente hidráulico que fue requerido el 31 de marzo, la ingeniera Yennifer Jiménez indica que se encuentra en actualización por parte del hidrólogo, y que en ese momento se encuentran en los cambios de los planos hidráulicos, temas pendientes para la aprobación del componente.
6. Se trata el tema ambiental, en este caso la Ingeniera Surgey Moreno, indica que se encuentra a la espera de respuesta por parte de CODECHOCÓ.
7. Sobre el tema institucional, se indica que el municipio se encuentra en la actualización del formato diagnóstico, y se espera que este sea radicado a finales del mes de abril.
8. Se recuerda que dentro de los requerimientos pendientes se encuentra la actualización de los Paz y Salvo por pago de subsidios.
9. El Ingeniero Alvaro Corcho solicita a la ingeniera Yeniffer Jiménez que se adelante la actualización del presupuesto, e insta a conformar con el geotecnista de la consultoría para realizar la siguiente mesa de seguimiento.
10. La mesa de trabajo finaliza a las 3:25 p.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Evaluación de los componentes de geotecnia y estructuras	Grupo de evaluación	09/05/2025
2	Envío diagnóstico entidad prestadora	PDA	30/04/2025
3	Radicación de geotecnia	Consultoría	Pendiente por determinar.
4	Mesa de trabajo para seguimiento	Todos	Pendiente por determinar.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

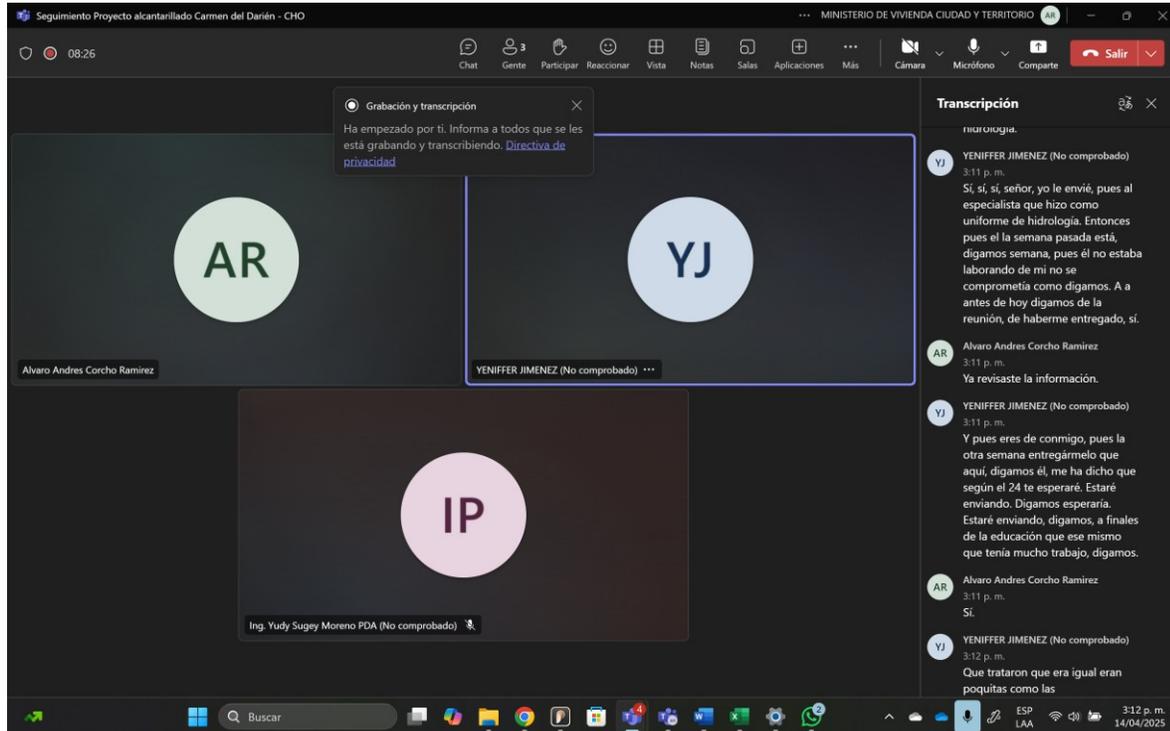

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 16/04/2025
