

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: FASE I DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Omar Camilo Bermeo Noguera, Evaluador de apoyo componente Predial, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Jairo Arley Urbina Gomez, Evaluador de apoyo componente Predial, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Yeselin Villadiego Pinto, Asesora, Despacho de la Ministra, MVCT. Zuri Pava, Asesora de la Unidad de Servicios Públicos, Municipio de Playón, Santander. Silvia Fernanda Jaimes Calderón, Unidad de Servicios Públicos, Municipio de Playón, Santander. Sandra Milena Reyes Ruiz, Coordinadora de gestión de proyectos de la ESANT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento sobre el proyecto “FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con la asistencia del Municipio, el PDA como Formulator y el MVCT, para revisar el avance en la subsanación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 23 de abril de 2025, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado actual del proceso de evaluación al proyecto "FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Esta mesa de asistencia inicia con el saludo de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo presenta los antecedentes generales informando sobre los compromisos de la pasada mesa realizada el 21/03/2025, donde como compromiso quedó el remitir por parte del Formador los componentes Institucionales y de Topografía, sobre el institucional aun no se ha recibido información, sobre el de topografía el 21/04/2025 se recibe información, ante lo cual la Ingeniera Reyes informa que la ingeniera Alix Gonzales evaluadora de apoyo del componente de topografía ya remitió por correo las observaciones actualizadas y se han puesto en contacto con ella para resolver inquietudes directamente. Por parte del componente Institucional la doctora Pava informa que el Municipio directamente está desarrollando las gestiones y que espera la próxima semana remitir el componente a evaluación.

Se continua con el componente Predial donde el Doctor Bermeo procede presentando en pantalla la información del proyecto y dando observaciones sobre el plano predial y la documentación aportada para que se proceda con la subsanación de la misma, recibiendo inquietudes por parte del Municipio y del PDA y resolviendo las dudas. Quedando pendiente que remitan la documentación ajustada para proceder con la evaluación.

Luego se pasa al componente Técnico de Estructuras, donde el Ingeniero Urbina informa que ya se remitieron observaciones actualizadas del componente para su atención, ante lo cual la ingeniera Reyes informa que están gestionando las subsanaciones con el consultor.

En cuanto al tema Ambiental el Ingeniero Naranjo indaga sobre el PSMV y los permisos de ocupación de cauce, la Doctora Pava informa que aun no se tiene la actualización del PSMV sigue en proceso con la Autoridad Ambiental, y sobre las ocupaciones de cauce informa que aun no se ha iniciado el proceso. Ante esto el Ingeniero Naranjo informa que los permisos ambientales son un requisito para la Viabilidad del Proyecto, en el caso que decidan solo buscar el concepto técnico podrían quedar bajo inicio de trámite, pero para la viabilidad deben presentarse las resoluciones aprobatorias de los permisos y del PSMV.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Por ultimo se coordina la próxima mesa para el 14/05/2025 y se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir a MVCT el componente institucional actualizado	Municipio de El Playón / PDA de Santander	30/04/2025

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:

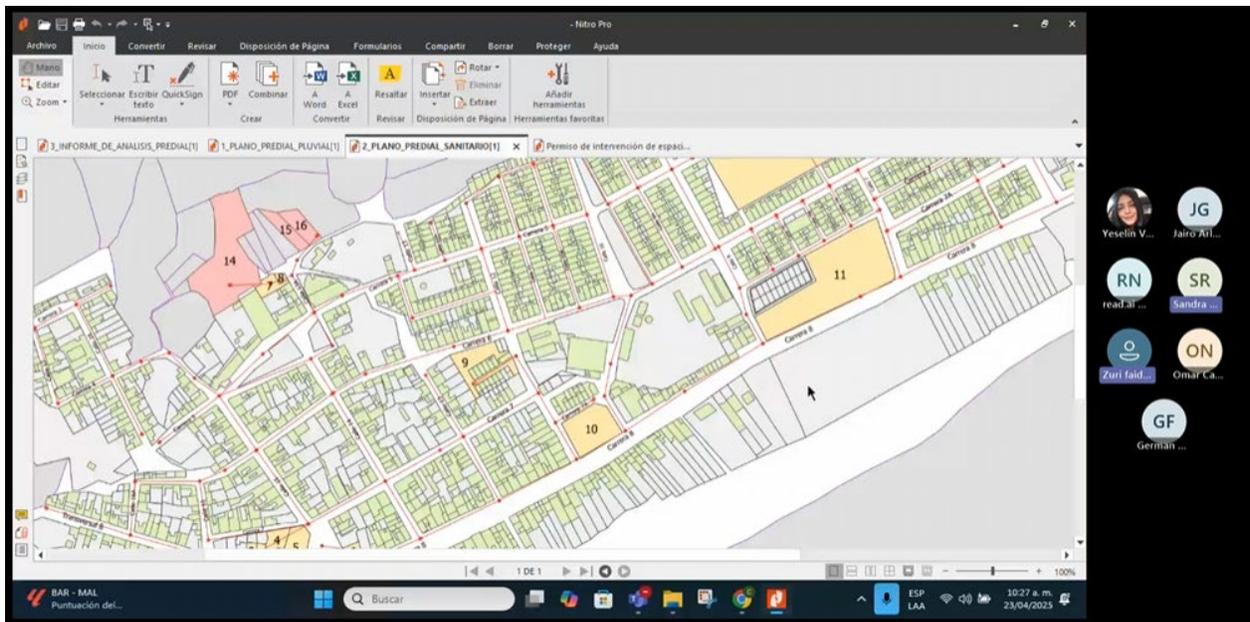

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 28/04/2025
