

## Informe CUR Cundinamarca

Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>

Mié 20/05/2020 15:59

**Para:** Oscar Fernando Acosta Mendoza <OAcosta@minvivienda.gov.co>

**CC:** Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>

 1 archivos adjuntos (160 KB)

GCT-F-27-Informe Cur CUNDINAMARCA.docx;

Buenas tardes Oscar.

Adjunto estoy haciendo llegar el borrador del informe CUR de:

CUNDINAMARCA

Para la revisión.

Cordial saludo,



Felix E. Guerrero Orejuela.

Asesor

fguerrero@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 832

Calle 18 No. 7-59. Bogotá D.C.

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO:</b> INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</p>	<p>Versión: 4.0</p>
	<p><b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p>	<p>Fecha: 06/09/2019</p>
		<p>Código: GCT-F-27</p>

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: abril 30 de 2020

#### 1. Datos del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos

<b>NÚMERO DEL CONVENIO</b>	112 de 2009
<b>OBJETO DEL CONVENIO</b>	Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por las entidades firmantes del convenio destinados a la implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos periódicos de avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 del decreto 3200 de 2008.
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	12 de noviembre de 2009
<b>BENEFICIARIO</b>	Departamento de Cundinamarca
<b>NIT</b>	Nº 899 999 114-0
<b>VALOR CONVENIO</b>	El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. Se asignaron recursos para el Departamento de Cundinamarca por valor de \$30.581.687.825, después de descontar el valor cobrado por el MVCT para el seguimiento se cuenta con un valor neto de \$29.970.054.069.
<b>PLAZO</b>	Hasta Dos (2) Años después de la fecha prevista para el cumplimiento de ejecución de las obras del PDA, término que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre las partes
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 de noviembre de 2009
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	No Aplica
<b>ADICIÓN</b>	No Aplica
<b>PRÓRROGA</b>	No Aplica
<b>SUSPENSIÓN</b>	No Aplica
<b>FECHA TERMINACIÓN REAL</b>	No Aplica

#### 2. Datos del Supervisor del Convenio

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Juan Pablo Serrano Castilla.		
<b>DEPENDENCIA - MEMORANDO</b>	Subdirección de Estructuración de Programas - Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. (Sin memorando)		
<b>SUPERVISORES ANTERIORES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
	Fernando Sanin Camacho Contratista MVCT Comunicación Nº 7300341201 del 10-05-2013	20-05-2013	28-10-2018



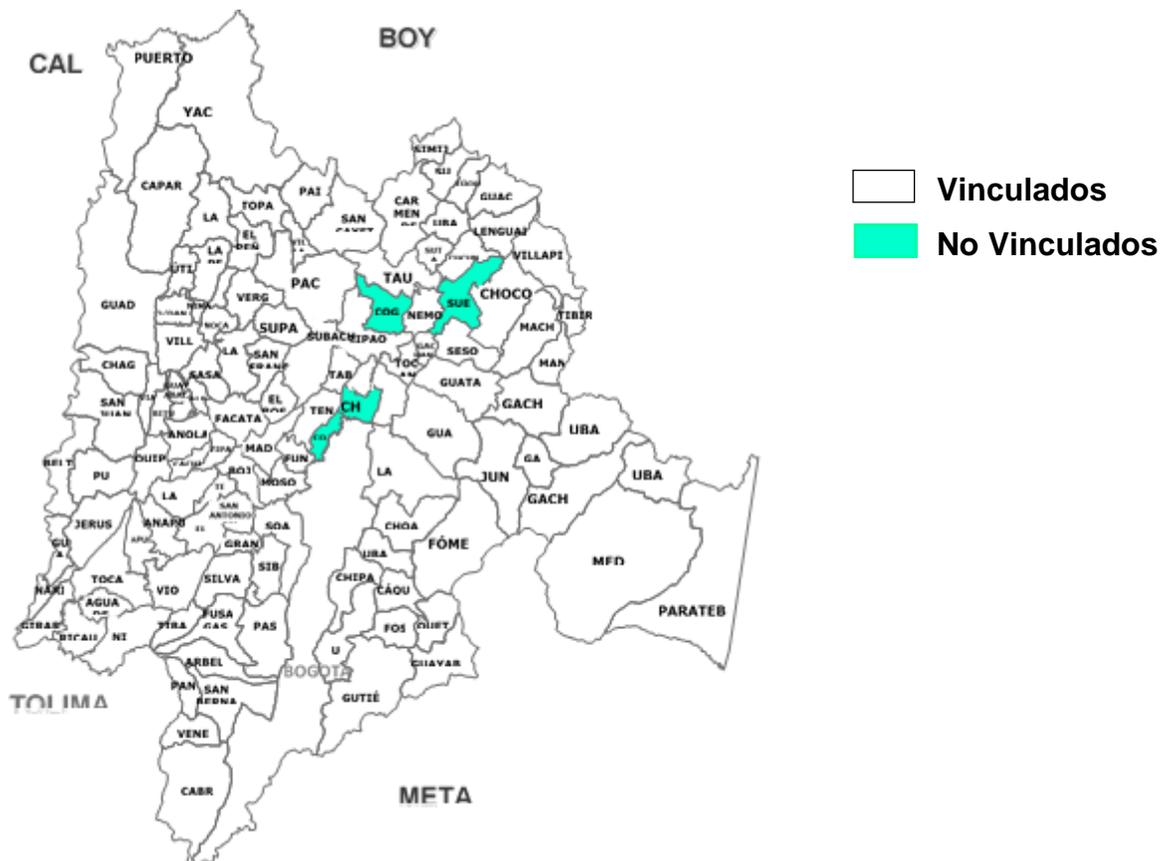
### 3. Información Física del Convenio.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 (antes Decreto 2246 de 2012, Decreto 3200 de 2008 y Decreto 3170 de 2008), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, definió el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP – PDA, como un conjunto de estrategias y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico por parte de cada una de las entidades territoriales.

El Gestor del Departamento de Cundinamarca, como responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento, presentó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2019, siendo aprobado en el Comité Directivo No 97 del 14 de marzo de 2019.

#### 3.1. Relación de municipios que hacen parte del PDA.

A la fecha, se encuentran vinculados en Cundinamarca el 96,5% de los municipios del Departamento al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, lo que corresponde a 112 municipios de los 116 que lo conforman y adicionalmente se encuentran también vinculados las tres autoridades ambientales con jurisdicción en Cundinamarca que son la CAR, CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUIA.





Municipios vinculados al PDA

No.	Municipio	Alcalde	No.	Municipio	Alcalde
1	Agua de Dios	Luis Felipe Tapias Cardenas	57	Nariño	Gustavo Martinez Ramirez
2	Albán	Liliana Bernal Contreras	58	Nemocón	Julian Alfredo Rodriguez Montaña
3	Anapoima	Hugo Alexander Bermudez Riveros	59	Nilo	Freddy Alberto Amado Angulo
4	Anolaima	Luis Hernando Martinez Zabaleta	60	Nimaima	Josue Ortiz Moreno
5	Apulo	Maribel Rocio Hernandez Vanegas	61	Nocaima	Juan Carlos Vasquez Arias
6	Arbeláez	Gisel Karina Garzon Avellaneda	62	Pacho	Nestor Vicente Ostos Bustos
7	Beltrán	Julio Cesar Guzman Ospina	63	Paime	John Javier Lillo Jimenez
8	Bituima	Javier Alberto Cortes Cristancho	64	Pandi	Diego Arley Arenas Manrique
9	Bojacá	Jhon Alberto Molina Mora	65	Paratebueno	Jose Armando Cardenas Achury
10	Cabrera	Julio Moreno Correa	66	Pasca	Jenny Katerin Mora Hortua
11	Cachipay	Efrain Moncada Sanchez	67	Puerto Salgar	Jaime Maldonado Mora
12	Cajicá	Fabio Hernan Ramirez Rodriguez	68	Pulí	Jose William Herreño Lozano
13	Caparrapí	Gonzalo Ramirez Gaitan	69	Quebradanegra	Gerardo Alvarez
14	Cáqueza	Jaime Hernando Carillo Velasquez	70	Quetame	Camilo Andres Parrado Rodriguez
15	Carmen de Carupa	Giovanni Murcia Leyva	71	Quipile	Nidia Cruz Ortega
16	Chaguaní	Luis Carlos Guerrero Pardo	72	Ricaurte	Gloria Ricardo Doncel
17	Chipaque	Camilo Albeiro Pardo Muñoz	73	San Antonio del T.	Jose Flaminio Vanegas
18	Choachí	Carlos Alberdi Velasquez Garzon	74	San Bernardo	Jesus Hernando Avila Bohorquez
19	Chocontá	Roddrigo A. Chicuasque Fernandez	75	San Cayetano	Elver Edilson Umaña Sierra
20	Cucunubá	Jose Benito Martinez Pascagaza	76	San Francisco	Gonzalo Alonso Gonzalez Herrera
21	El Colegio	Andres Hernando Guerrero Puerto	77	San Juan de R.	Camilo Andres Mogollon Amazo
22	El Peñón	Neftali Silva Bustos	78	Sasaima	Danny Enrique Rico Zamora
23	El Rosal	Gustavo Alberto Campos Acero	79	Sesquilé	Hector Orlando Diaz Gomez
24	Facatativá	Guillermo Eduardo Aldana Dimas	80	Sibaté	Edson Erasmo Montoya Camargo
25	Fómeque	Jorge Arturo Romero Romero	81	Silvania	Nohora Elizabeth Sanchez Suarez
26	Fosca	Jorge Gilberto Rey Romero	82	Simijaca	Edgar Aguilar Castro
27	Funza	Daniel Felipe Bernal Montealegre	83	Soacha	Juan Carlos Saldarriaga Gaviria
28	Fúquene	Fabio Domingo Cortes Alarcon	84	Sopó	Miguel Alejandro Rico Suarez



Municipios vinculados al PDA

No.	Municipio	Alcalde	No.	Municipio	Alcalde
29	Fusagasugá	Jhon Jairo Hortua Villalba	85	Subachoque	Jairo Martinez Cruz
30	Gachalá	Hector Hernan Barreto Parra	86	Supatá	Virgilio Gutierrez
31	Gachancipá	Karen Milena Leon Aroca	87	Susa	Ximena Ballesteros Castillo
32	Gachetá	Monica Romero Parra	88	Sutatausa	Jose H. Rodriguez Quiroga
33	Gama	Juan Pablo Linares Gomez	89	Tabio	Pablo Enrique Camacho Carrillo
34	Girardot	Jose Francisco Lozano Sierra	90	Tausa	Oscar Hernando Olaya Rincon
35	Granada	Jorge Alberto Sierra Padilla	91	Tena	Luis Carlos Vargas Lozano
36	Guachetá	Jeffer Manuel Siatoba Barbosa	92	Tenjo	Sonia Patricia Gonzalez Bernal
37	Guaduas	German Herrera Gomez	93	Tibacuy	Juan Carlos Riveros Muñoz
38	Guasca	Omar Javier Cifuentes Romero	94	Tibirita	Maria Antonia Martin Mateus
39	Guataquí	Diana Victoria Devia Pulido	95	Tocaima	Julian Rodrigo Mora Pineda
40	Guatavita	Ruby Jimena Prieto Prieto	96	Tocancipá	Jorge Andres Porrasvargas
41	Guayabal de S.	Juan Manuel Lobo Beltran	97	Topaipí	Camilo A. Cifuentes Castañeda
42	Guayabetal	Sonia Yamile Moreno Baquero	98	Ubalá	Crispin De Jesus Beltran Urrego
43	Gutiérrez	Juan Pablo Sanchez Moreno	99	Ubaque	Aida Liliana Velasquez Pardo
44	Jerusalén	Guillermo Enrique Gonzalez Bernal	100	Ubaté	Jaime Torres Suarez
45	Junín	Jose Numael Jimenez Castillo	101	Une	Fredy Alonso Cubillos Poveda
46	La Calera	Carlos Cenen Escobar Rioja	102	Útica	Edgar Fabian Linares Triana
47	La Mesa	Cornelio Humberto Segura Barragan	103	Venecia	Luz Arelys Ariza Laiton
48	La Palma	John Jairo Pulido Pulgarin	104	Vergara	Adriana Maria Hernandez Olarte
49	La Peña	Luis Angel Farfan Triana	105	Vianí	Eduin Andres Bulla Ruiz
50	La Vega	Eduar Ricardo Matiz Padilla	106	Villagómez	Misael Duarte Sanchez
51	Lenguazaque	Francisco Augusto Lopez Rodriguez	107	Villapinzón	Nelson Javier Torres Romero
52	Machetá	Julio Solano Cardenas Garzon	108	Villeta	Freddy R. Hernandez Morera
53	Madrid	Jorge Andres Tovar Forrero	109	Viotá	Wilder Gomez Osorio
54	Manta	Guillermo Arturo Robayo Piñeros	110	Yacopí	Wilkinson Alfonso Florido Alvarez
55	Medina	Dario Ernesto Piñeros Marta	111	Zipacón	Crist Indira Ramos Nope
56	Mosquera	Gian Carlo Gerometta Burbano	112	Zipaquirá	Wilson Leonar Garcia Fajardo

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO:</b> INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</p> <p><b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p>	<p>Versión: 4.0</p>
		<p>Fecha: 06/09/2019</p>
		<p>Código: GCT-F-27</p>

Municipios no vinculados al PDA

No.	Municipio	Alcalde
1	Chía	Luis Carlos Segura Rubiano
2	Cogua	Flor Maria Murcia Murcia
3	Cota	Nestor Orlando Guitarrero Sanchez
4	Suesca	Zully Constanza Quilaguy Sintura


En la fecha de la presentación de este informe, el Gestor informa el vencimiento de algunos convenios tripartita. Actualmente se encuentran en una campaña de socialización con las nuevas administraciones municipales para proceder a firmar los nuevos convenios, incluyendo las disposiciones establecidas en el Decreto 1425 de 2019..

Los municipios con convenios vencidos son:

Choachi, Anapoima, Arbelaez, Bojacá, Carmen de Carupa, Cucunuba, El Peñon, Guasca, Guayabetal, Nemocon, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Quebradanegra, Quipile, San Juan de Rioseco, Sasaima, Susa, Tabio, Topaipi, Vergara, Villeta y Viotá.

### 3.2. Miembros del Comité Directivo

NICOLAS GARCIA BUSTOS	Gobernador de Cundinamarca
NIDIA C. RIAÑO RINCÓN	Secretaria de Ambiente de Cundinamarca
JUAN PABLO SERRANO CASTILLA.	Subdirector Estructuración de Programas. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
BEATRIZ EUGENIA GIRALDO.	Departamento Nacional de Planeación.
LILIANA BERNAL CONTRERAS	Alcaldesa Municipio de Alban
JAIME TORRES SUÁREZ	Alcalde Municipio de Ubaté
LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ	Director de la CAR
MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS	Director de Corpoguavio.
DORIS BERNAL CÁRDENAS	Director de Corporinoquía.
NELCY RIVERA A.	Delegada FIA.
JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. Gerente. Gestor del PDA de Cundinamarca

	<b>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 06/09/2019
		Código: GCT-F-27
<b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		

### 3.3. Estado actualizado instrumentos de planeación PDA.

Instrumento de Planeación	Aprobado	Fecha	Acta No.	Observaciones
Reglamento Operativo del Comité Directivo	SI	13 de febrero de 2013	51	Vigente y publicado en página Web.
Manual Operativo	SI	6 de mayo de 2013	52	Expedido mediante Decreto 180 de 2013 del Departamento. Vigente y publicado en página Web.
Plan General Estratégico y de Inversiones 2016-2020	SI	27 de febrero de 2017	75	Actualizado el 15 de marzo de 2018 en la sesión 86 y el 14 de marzo de 2019 en la Sesión 97
Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2019	SI	14 de marzo de 2019	97	Actualizado el 26 de diciembre de 2019 en la sesión 104. Este plan se encuentra publicado en página web.
Plan de Aseguramiento de la Prestación	SI	14 de marzo de 2019	97	Actualizado el 23 de mayo de 2019 en la sesión 99 del Comité Directivo
Plan de Gestión Social 2019	SI	14 de marzo de 2019	97	Actualizado el 23 de mayo de 2019 en la sesión 99 del Comité Directivo
Plan Ambiental 2016-2020	SI	27 de febrero de 2017	75	Actualizado el 14 de marzo de 2019 en la Sesión 97 y el 23 de mayo de 2019 en la sesión 99 del Comité Directivo
Plan de Gestión del Riesgo 2017 – 2020	SI	30 de mayo de 2017	77	Actualizado el 24 de octubre de 2018 en la sesión 91 y el 14 de marzo de 2019 en la Sesión 97 del Comité Directivo

### 3.4. Estado de Proyectos.

En el cuadro siguiente se relaciona el estado de proyectos en los municipios del departamento de Cundinamarca que han sido radicados ante el mecanismo de viabilidad del Viceministerio de Agua y Saneamiento y que han sido financiados con recursos de la Nación – Audiencias Públicas, cuyos recursos fueron desembolsados en desarrollo del convenio CUR N° 112 de 2009.

Código	Sector	Municipio	Nombre	Valor Total	Valor Audiencias Públicas	Estado Evaluación
1-2013-384	Alcantarillado	La Peña	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales, municipio de La Peña, Cundinamarca.	\$1.732.760.912	\$ 1.663.960.143	Viable



**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y  
SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 4.0

Fecha: 06/09/2019

Código: GCT-F-27

Código	Sector	Municipio	Nombre	Valor Total	Valor Audiencias Públicas	Estado Evaluación
1-2013-388	Acueducto y Alcantarillado	Pulí	Construcción de obras del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio del Pulí	\$1.171.130.840	\$ 807.291.263	Viable
1-2013-394	Acueducto	La Peña	Construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña.	\$401.219.491	\$ 358.628.194	Viable
1-2013-385	Acueducto y Alcantarillado	El Peñon	Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano, municipio de El Peñon	\$1.006.130.721	\$ 838.524.534	Viable
1-2013-813	Alcantarillado	Cajicá	Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá.	\$9.306.397.104	\$ 2.342.967.710	Viable
1-2010-153	Acueducto	La Mesa	Optimización red de distribución acueducto casco urbano del municipio de La Mesa.	\$8.519.050.093	\$ 1.048.406.528	Viable
1-2013-822	Alcantarillado	Mosquera	Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial y la construcción estación de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del barrio El Porvenir Río municipio de Mosquera fase II-optimización redes de alcantarillado pluvial	\$4.095.566.418	\$ 870.880.275	Viable
1-2014-99	Acueducto y Alcantarillado	Venecia	Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Venecia.	\$2.747.375.182	\$ 1.657.353.514	Viable
1-2015-199	Alcantarillado	Gama	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de Gama	\$3.388.150.176	\$ 1.114.045.979	Viable
1-2010-626	Alcantarillado	Soacha	Construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha.	\$45.899.604.145	\$ 12.117.737.537	Viable
1-2010-152	Acueducto	Anapoima	Optimización red de distribución del casco urbano municipio de anapoima departamento de cundinamarca.	\$5.591.142.118	\$ 2.096.814.388	Viable
1-2010-290	Alcantarillado	Facatativá	Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía el rosal del municipio de Facatativa.	\$3.603.029.494	\$ 359.238.888	Viable
1-2008-984	Alcantarillado	Zipaquirá	Construcción del interceptor y colector de aguas residuales y	\$8.789.762.420	\$ 3.022.506.939	Viable



Código	Sector	Municipio	Nombre	Valor Total	Valor Audiencias Públicas	Estado Evaluación
			aguas lluvias barandillas municipio de Zipaquirá			
1-2014-291	Acueducto	Cáqueza	Construcción plan maestro de acueducto y construcción planta de tratamiento de agua potable del casco urbano municipio de Cáqueza	\$8.808.457.505	\$ 663.707.887	Viable
1-2012-678	Acueducto y Alcantarillado	San Juan de Rioseco	Construcción de obras para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de cambao del municipio de San Juan de Rio Seco	\$1.627.445.196	\$ 1.496.381.213	Viable
1-2012-927	Acueducto	Guasca	Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Guasca fase II.	\$643.791.646	\$ 619.030.426	Viable
1-2008-229	Alcantarillado	Susa	Interventoría a la construcción obras plan maestro de alcantarillado casco urbano del municipio de Susa.	\$10.613.647.930	\$ 235.000.000	Viable
4-2007-3	Acueducto	Tocaima	Construcción del acueducto veredas la Salada, Malberto, Vila, Alto de la Viga, el Asomadero, el Verdal, Capotes, la Mata y Morro Azul fase II del municipio de Tocaima.	\$523.725.164	\$ 148.557.096	Viable
NA	Pre Inversión / Consultoría	Anapoima, El Colegio	Estudios y diseños de detalle del embalse de Calandaima	\$4.000.000.000	\$ 2.000.000.000	Viable
<b>TOTALES</b>				<b>\$123.586.386.555</b>	<b>\$33.461.032.524</b>	

Fuente: SINAS –

#### 4. Información Financiera del Convenio

##### 4.1. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

Los recursos asignados en el Convenio, están amparados bajo el Decreto 3170 de 2008, a la fecha han sido girados al Patrimonio Autónomo administrado por el Consorcio FIA, la relación presentada en el siguiente cuadro.

Departamento	Asignación Total	Asignado 2009	Asignado 2011	Asignado 2012	Asignado 2013	Total Asignado hasta 31-12-2017	% Asignado	Total sin Asignar	% Sin Asignar
Cundinamarca	<b>30.581.687.825</b>	15.061.792.000	8.000.000.000	4.581.607.115	2.938.288.710	<b>30.581.687.825</b>	100%	0	0 %

	<b>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Fecha: 06/09/2019
		Código: GCT-F-27

Fuente: Financiera MVCT

Departamento	Asignación Total	Girado 2010	Girado 2011	Girado 2012	Girado 2013	Total Asignado (*)	% Asignado	Total sin Asignar	% Sin Asignar
Cundinamarca	<b>30.581.687.825</b>	14.760.556.160	7.840.000.000	4.489.974.973	2.879.522.935	<b>29.970.054.069</b>	100%	--	--

(\*) El valor total asignado se le realiza un descuento del 2%, el cual corresponde al seguimiento que efectúa el MVCT.

Fuente: Informe FIA

#### Disponibilidad de Recursos

<b>DISPONIBILIDAD 31 MARZO DE 2020</b>				
FUENTE	RECAUDO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBLE
SGP	136.421.733.614,50	17.649.909.910,38	157.894.148.011,07	(3.822.504.486,19)
Recursos Nación	29.970.054.069,00	3.535.184.387,71	33.461.032.514,25	44.205.942,46
Regalías	64.536.000.647,94	7.411.456.694,16	70.523.822.455,95	1.423.634.886,15
Otros Recursos	419.378.685.476,00	34.798.126.561,77	453.351.037.412,61	825.774.625,16
Regalías- SGR Fondo Compensación Regional	38.922.722.656,00		38.785.536.925,75	137.185.730,25
<b>TOTAL</b>	<b>689.229.196.463,44</b>	<b>63.394.677.554,02</b>	<b>754.015.577.319,63</b>	<b>(1.391.703.302,17)</b>

Fuente: Consorcio FIA

Los Recursos Nación – Audiencias Públicas girados en el marco del Convenio CUR N°112 de 2009, se han manejado mediante el contrato de encargo fiduciario que el departamento de Cundinamarca tiene con el Consorcio FIA y cuyo ordenador del gasto es Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. como Gestor del PDA del departamento.

A 31 de marzo de 2020, se han recibido giros de Recursos Nación – Audiencias Públicas por un valor de \$29.970.054.069 los cuales han generado rendimientos de \$3.335.184.387,71, lo que ha permitido manejar recursos por la suma de \$33.505.238.456,71 de los cuales se han expedido CDRs por un valor de \$33.461.032.514,25, quedando como disponible la suma de: \$44.205.942,46

#### Plan Financiero del Proyecto.

Se relacionan los proyectos PDA, a los cuales, se les asignó recursos de la fuente del convenio, con su respectivo CDR. (CDR's expedidos):

Nº CDR	Fecha Expedición del CDR	Municipio	Concepto CDR	Valor por Fuente	Estado
1034	17/07/2013	La Peña	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales, municipio de La Peña.	1.540.547.743,00	Autorizado
1035	17/07/2013	La Peña	Interventoría a la construcción planta de tratamiento de aguas residuales, La Peña	123.412.400,00	Autorizado



**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y  
SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 4.0

Fecha: 06/09/2019

Código: GCT-F-27

Nº CDR	Fecha Expedición del CDR	Municipio	Concepto CDR	Valor por Fuente	Estado
1064	27/08/2013	Pulí	Construcción de obras del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio del Pulí	748.689.814,00	Autorizado
1065	27/08/2013	Pulí	Interventoría a la construcción de obras del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio del Pulí	58.601.449,00	Autorizado
1148	12/09/2013	La Peña	Construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña,	336.634.594,00	Autorizado
1149	12/09/2013	La Peña	Interventoría a la construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña.	21.993.600,00	Autorizado
1218	06/11/2013	El Peñon	Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano, municipio de El Peñon.	766.862.802,00	Autorizado
1219	06/11/2013	El Peñon	Interventoría al mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano, municipio de El Peñon.	71.661.732,00	Autorizado
1252	07/11/2013	Cajicá	Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá, Cundinamarca.	2.193.789.991,00	Autorizado
1253	07/11/2013	Cajicá	Interventoría a la construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá, Cundinamarca.	149.177.719,00	Autorizado
133	03/08/2011	La Mesa	Optimización red de distribución acueducto casco urbano del municipio de La Mesa	1.048.406.528,39	Autorizado
1687	12/05/2015	Mosquera	Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial y la construcción estación de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del barrio el porvenir río municipio de mosquera fase ii-optimización redes de alcantarillado pluvial	870.880.275,00	Autorizado
1778	12/08/2015	Venecia	Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Venecia	1.657.353.514,00	Autorizado
1914	07/10/2015	Gama	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de Gama	1.114.045.979,00	Autorizado



**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y  
SANEAMIENTO BÁSICO**


**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 4.0

Fecha: 06/09/2019

Código: GCT-F-27

Nº CDR	Fecha Expedición del CDR	Municipio	Concepto CDR	Valor por Fuente	Estado
25	30/05/2011	Soacha	Construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha.	11.490.989.978,93	Autorizado
26	30/05/2011	Soacha	Interventoría a la construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha.	626.747.558,00	Autorizado
405	14/12/2011	Anapoima	Optimización red de distribución del casco urbano municipio de Anapoima	2.096.814.387,82	Autorizado
445	12/01/2012	Facatativá	Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía el rosal del municipio de Facatativá.	359.238.888,00	Autorizado
451	16/01/2012	Zipaquirá	Construcción del interceptor y colector de aguas residuales y aguas lluvias barandillas municipio de Zipaquirá.	3.022.506.939,00	Autorizado
4748	25/01/2018	Caqueza	Construcción plan maestro de acueducto y construcción planta de tratamiento de agua potable del casco urbano municipio de Caqueza.	663.707.887,00	Autorizado
548	17/10/2012	San Juan de Rioseco	Construcción de obras para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de cambao del municipio de san juan de rio seco departamento de cundinamarca	1.382.642.161,11	Autorizado
549	17/10/2012	San Juan de Rioseco	Interventoría a la construcción de obras para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de cambao del municipio de San Juan de Rioseco.	113.739.052,00	Autorizado
680	30/11/2012	Guasca	Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Guasca fase II.	573.176.323,00	Autorizado
681	30/11/2012	Guasca	Interventoría construcción obras para la optimización del sistema de acueducto urbano municipio de Guasca fase II	45.854.103,00	Autorizado
7284	22/05/2019	Susa	Interventoría a la construcción obras plan maestro de alcantarillado casco urbano del municipio de Susa.	235.000.000,00	Autorizado

	<b>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Fecha: 06/09/2019
		Código: GCT-F-27

Nº CDR	Fecha Expedición del CDR	Municipio	Concepto CDR	Valor por Fuente	Estado
745	31/01/2013	Tocaima	Construcción del acueducto veredas la salada, malberto, vila, alto de la viga, el asomadero, el verdal, capotes, la mata y morro azul fase ii del municipio de Tocaima.	138.838.407,00	Autorizado
746	31/01/2013	Tocaima	Interventoría a la construcción del acueducto veredas la salada, malberto, vila, alto de la viga, el asomadero, el verdal, capotes, la mata y morro azul fase ii del municipio de Tocaima.	9.718.689,00	Autorizado
894	11/06/2013	Departamento	Estudios y diseños de detalle del embalse de Calandaima	2.000.000.000,00	Autorizado
<b>TOTAL</b>				<b>33.461.032.514,25</b>	

## 5. Información Contractual del Convenio.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	Mediante el Decreto 3170 de agosto de 2008, se asignó al departamento de Cundinamarca la suma de \$30.581.687.825, los cuales se comprometieron como aportes de la Nación en desarrollo del presente Convenio CUR N° 112 de 2009
Valor de Asignación:	\$30.581.687.825
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	Según cada desembolso por año de asignación se estableció el CDP respectivo.
No. Registro Presupuestal – Fecha:	Según cada desembolso por año de asignación se estableció el CDP respectivo.
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de recursos de los Planes Departamentales, administrados por el consorcio FIA
Nombre Entidad Fiduciaria:	CONSORCIO FIA
Fideicomitente (Beneficiario):	Departamento de Cundinamarca a través de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. como gestor del PDA de Cundinamarca.

## 6. Conclusiones y/u Observaciones

<b>CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR</b>
<p>Conclusiones y Observaciones.</p> <p>A continuación, se relacionan los logros y resultados obtenidos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el segundo semestre del año 2019 se han atendido en total 233 emergencias en 72 municipios con equipos, por desabastecimiento de agua y colmataciones del alcantarillado.</li> </ul>



### CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

- Se entregaron obras de rehabilitación de infraestructura en los municipios de Chocontá, Caparrapí, Guayabetal, San Juan de Rioseco, Topaipí, Anapoima, Pandi, Villagómez, Guaduas, Cáqueza, Sibaté, Bituima, Supatá, Fomeque, Nimaima, Bojacá, Beltrán.
- 68 proyectos en Ventanilla Departamental por valor de \$127.267 millones.
- 28 proyectos por valor de \$385.702 millones en Ventanilla Nacional
- Viabilización de 20 proyectos por valor de \$44.703 millones:
  - 11 proyectos por valor de \$37.574 son de infraestructura incluidos los proyectos metrología.
  - 1 proyecto por valor de \$1.248 millones de emergencias.
  - 1 proyecto de intradomiciliarias por valor de \$991 millones,
  - 5 proyectos de unidades sanitarias por valor de \$3.438 millones
  - 2 proyectos de residuos sólidos por valor de \$1.452 millones.
- 130.837 habitantes beneficiados con la terminación de 3 proyectos de acueducto urbano en el municipio de Facativá, San Antonio del Tequendama y Tibirita con una inversión aproximada de \$4.726 millones de pesos.
- 2.096 habitantes beneficiados con la terminación de 1 proyecto de alcantarillado urbano en los municipios de Girardot, con una inversión aproximada de \$4.000 millones de pesos.
- 34 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos entregados y adoptados por los municipios.
- 2 implementaciones de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- 16 PGIRS en ejecución
- 68 PSMVs aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.
- 55 trámites de PSMVs en trámite de aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
- 23 PSMVs en ejecución.
- Respecto a la formulación del Plan Ambiental 2020-2023 se adelantan las siguientes actividades:
  - Recopilación de información con las entidades pertinentes
  - Construcción del documento del plan ambiental
  - Mesas de trabajo con las Corporaciones.
- Foro de Expertos y Rendición de Cuentas: Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en agua potable y saneamiento básico y el Cuarto Panel de Expertos en: “Cambio Climático, una mirada desde lo Rural”. En este panel se abordaron temas de gobernanza del agua; protección de las cuencas hidrográficas y bosques; y desarrollo de infraestructura biomecánica de regulación hídrica, el gobernador Jorge Rey presentó el informe de gestión ‘Cundinamarca, el PDA más grande del país’
- En el marco del evento se llevó a cabo la graduación de la primera corte de participantes formados en los diplomados de la Escuela del Agua, el evento contó con la presencia de Cecilia María Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entidad con la cual el departamento hizo equipo. En el panel se dieron cita varias entidades del orden nacional y departamental; corporaciones autónomas regionales; alcaldes municipales; prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; y organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
- Gestión Social en Obras: Dentro de la garantía y trabajo articulado con las comunidades beneficiarias de las obras se cuenta con el Plan de Gestión Social en Obra (PGSO), donde las diferentes firmas contratistas de los proyectos de inversión tienen un profesional social quien es el encargado de su implementación; a su vez desde la Dirección de Servicio al Cliente se contó con un equipo de profesionales del área social quienes se encargan del seguimiento a dicha implementación, a través de estos se realizó apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas y acompañamiento en la implementación de actividades en proyectos de conexiones intradomiciliarias, unidades sanitarias, construcción de acueductos y alcantarillados y demás proyectos de inversión en ejecución durante el segundo semestre de 2019. Publicaciones en medios de comunicación: Gestión de redes sociales como Twitter, Facebook y la página web, dando a conocer los avances de los planes, programas y proyectos, a los clientes y grupos de interés.



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y  
SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 4.0

Fecha: 06/09/2019

Código: GCT-F-27

### CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Observaciones:

El Departamento de Cundinamarca a través de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP como Gestor del PDA de Cundinamarca viene desarrollando el Plan de conformidad con el PAEI 2019 aprobado y los recursos presupuestados, realmente girados y disponibles.

El Convenio CUR se viene ejecutando de conformidad con lo establecido contractualmente y todos los recursos establecidos en él, están desembolsados y comprometidos, respecto a lo desembolsado por el MVCT.

Los recursos asignados en el CUR se encuentran ejecutados en un 99%.

De los recursos desembolsados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio todos están comprometidos, y el saldo no contratado por \$ 44.205.942,46 es producto de los rendimientos financieros. No procede hasta la fecha ningún tipo de acciones para liquidar el Convenio

El seguimiento de los proyectos ejecutados por el PDA está a cargo del grupo de seguimiento de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

La supervisión de los proyectos que se ejecutan en el marco de los PDA está a cargo de la Entidad que contrata los mismos.

Liquidación del Convenio. A la fecha no proceden ningún tipo de acciones para liquidar el convenio.

\_\_\_\_\_  
JUAN PABLO SERRANO CASTILLA  
Subdirector de Estructuración de Programas  
Supervisor Convenio 113 de 2009

Elaboró: Felix Eduardo Guerrero Orejuela – Líder PDA Cundinamarca
