

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN - FUNCIONARIOS	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.	Fecha: 05/07/2019
		Código: GRF-F-23

Fecha: <table border="1"> <tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr> <tr><td>28</td><td>8</td><td>21</td></tr> </table>	DD	MM	AA	28	8	21	Nº Comisión
DD	MM	AA					
28	8	21					
Nombre Funcionario Juan Pablo Serrano Castilla	Identificación: 77.094.276						
Dependencia DIDE							
Extensión: 3809							

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas:

DEL			HASTA			DESTINOS
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
23	8	21	24	8	21	Bogotá-Montería-Sincelejo-Montería-Bogotá

Presenté informe de la comisión al Jefe Inmediato dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización del viaje, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0327 de 2018, modificada por las Resoluciones 314 y 393 de 2019.

La presente constancia se expide en Bogotá.

 _____ Firma del Funcionario	 _____ Vo. Bo. Jefe Inmediato Nombre: _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relación de documentos que tiene que ver con la comisión **Nº Dev.**

- Formato Cumplido de Comisión
- Colilla de pasabordos (original) y/o certificación expedida por aerolínea.
- Certificado de permanencia
- Recibos originales por gastos de viaje.
- Copia del Informe de comisión con el Vo. Bo. Del Jefe Inmediato

Nº	Observación
X	
X	
X	
X	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

Recibido

Fecha: _____ **Hora:** _____

Avianca  VUELO **AV9794**

BOGOTA  MONTERIA

BOG **MTR**

SALA	HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
	06:40	M	7A

PASAJERO: Serrano Castilla / Juan Pablo FECHA: Lun, 23 Agosto STATUS: AV*G

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Pase de abordar Avianca

[Eliminar pase](#)

Origen
BOGOTA
Lun, 23 Agosto | 07:25
Bogota El Dorado Intl, T1

Destino
MONTERIA
Lun, 23 Agosto | 08:48
Monteria Los Garzones, T

Tu talla M incluye
Equipaje de mano: 1x10kg
Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
47NMVK

Tiquete electrónico
134923303142401

Avianca  VUELO **AV8474**

MONTERIA  BOGOTA

MTR **BOG**

SALA	HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
3	12:40	M	7A

PASAJERO: Serrano Castilla / Juan Pablo FECHA: Mar, 24 Agosto STATUS: AV*G

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Pase de abordar Avianca

[Eliminar pase](#)

Origen
MONTERIA
Mar, 24 Agosto | 14:00
Monteria Los Garzones, T

Destino
BOGOTA
Mar, 24 Agosto | 15:15
Bogota El Dorado Intl, T1

Tu talla M incluye
Equipaje de mano: 1x10kg
Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
47NMVK

Tiquete electrónico
134923303142402

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 4.0
		Fecha: 16/08/2019
		Código: GRF-F-26
<p>EL SUSCRITO: <u>Gloria Patricia Tovar Alzate</u></p> <p>CARGO: <u>Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial</u> C. C. No. <u>40.381.591</u> DE <u>Villavicencio</u></p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA QUE:</p> <p>EL SEÑOR: <u>Juan Pablo Serrano Castilla</u> C.C. No. <u>77.094.276</u> DE <u>Valledupar</u></p> <p>CARGO: <u>Subdirector de Programas</u> DEPENDENCIA: <u>DIDE</u></p> <p>CON EL OBJETO DE: <u>Asistir a los comités gerenciales de reactivación económica de los departamentos de Sucre y Córdoba.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE: <u>Sincelejo y Montería.</u></p> <p>EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMISIÓN, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL</p> <p><u>23 y 24 de agosto de 2021.</u></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">  FIRMA DE QUIEN CERTIFICA </p> <p style="text-align: right;"> <u>Bogotá, 28 de agosto de 2021.</u> CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN </p>		
<p>Nota: Este formato debe ser presentado, debidamente diligenciado, dentro de los tres días calendario siguientes al término de la comisión. Este formato es válido únicamente para efectos de legalización de viáticos y gastos de viaje y no exime al funcionario o consultor de presentar informe de comisión detallado.</p>		

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Juan Pablo Serrano Castilla

Fechas de Comisión o Autorización:

Inicio			Final		
23	08	21	24	08	21

Rutas de Desplazamiento

Bogotá – Montería – Sincelejo – Montería – Bogotá

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Asistir a los comités gerenciales de reactivación económica de los departamentos de Sucre y Córdoba.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El día 23 de agosto siendo las 11:30 a.m. se da inicio al Comité de Reactivación Económica para el departamento de Sucre, en la cual participaron Alcalde de la San Benito Abad Doctor Manuel Cadrazco, delegados de las administraciones municipales de Galeras, San Benito, Sincelejo y San Marcos, Funcionarios de la Empresa de Aguas de Sucre Ing. Javier Geney Subgerente de la Prestación de los servicios públicos.


En esta reunión se establecieron compromisos los cuales se observan en la siguiente matriz

Proyectos Reactivación Económica Compromiso por Colombia				
Departamento	Municipio	Nombre del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Estado de la Contratación
SUCRE	Galeras	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS.	En ejecución	(24-08-2021) El municipio radicara ante la Empresa Aguas de Sucre la reformulación para revisión.
SUCRE	La Unión	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNIÓN SUCRE.	En evaluación	(23-08-2021) El MVCT enviará concepto técnico del Proyecto.
SUCRE	San Benito Abad	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD.	En ejecución	(07-08-2021) se solicita por parte del MVCT un Plan de Choque. Se indica que la primera semana de octubre se realizará visita a la obra.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

SUCRE	San Benito Abad	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE.	En evaluación	(01-09-2021) se pretenden entregar correcciones ante el MVCT por parte del PDA.
SUCRE	San Luis de Sincé	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCÉ.	En ejecución	Proyecto en ejecución sin contratiempo % de ejecución 67.1.
SUCRE	San Marcos	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	Adjudicado	Contrato de obra e interventoría adjudicado, pendiente de actas de inicio, se espera que antes del 1 de septiembre sean enviadas las actas.
SUCRE	San Marcos	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.	En ejecución	Ejecución 100%, se solicita por parte del MVCT una visita para que el PDA verifique el estado de la obra, el municipio indica que en la actualidad se encuentran realizando las conexiones intradomiciliarias.
SUCRE	San Marcos	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS FASE II DEPARTAMENTO DE SUCRE.	adjudicado	Contrato de obra e interventoría adjudicado, pendiente de actas de inicio, se espera que antes del 1 de septiembre sean enviadas las actas.
SUCRE	San Marcos	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS	En evaluación	Se realizó mesa técnica de topografía el día 20 de agosto se pretende radicar el proyecto el día 1 de septiembre ante el MVCT.
SUCRE	Sincelejo	EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO LA GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	En ejecución	Proyecto con 23% de ejecución avance normal.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

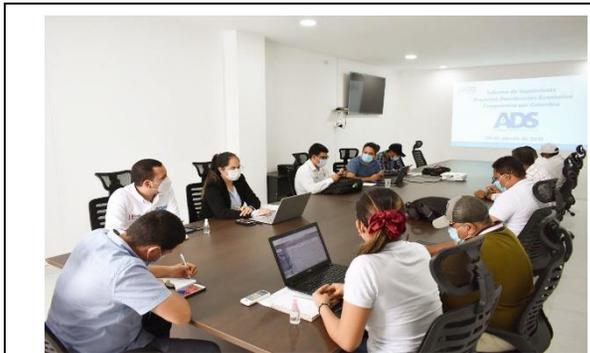

Fecha: 23/08/2021.
Reunión con el PDA Sucre.



Fecha: 23/08/2021.
Reunión con el PDA Sucre.



Fecha: 23/08/2021.
Reunión con el PDA Sucre.



Fecha: 23/08/2021.
Reunión con el PDA Sucre.

El día 24 de agosto de 2021, en la ciudad de Montería, se llevó a cabo el Comité de Gerencia de Reactivación Económica PDA Córdoba “Compromiso por Colombia”, Capítulo Agua, en el cual se revisó el avance de los diferentes proyectos:

Municipios	Nombre del Proyecto	Valor Proyecto	Aportes Contrapartidas	Aportes Nación	Población Beneficiada	OBSERVACIONES
Ayapel	Etapa I de la rehabilitación ampliación y sectorización de las redes de acueducto y aumento de la capacidad de almacenamiento a través de la construcción de tanque elevado y semienterrado en el municipio de Ayapel	\$19.354.870.851	\$7.876.982.323	\$11.477.888.528	24362	Proceso adjudicación se abrió, se recibieron 5 propuestas contrato obra. Apertura sobres 10 septiembre Plazo ejecución 15 meses.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Municipios	Nombre del Proyecto	Valor Proyecto	Aportes Contrapartidas	Aportes Nación	Población Beneficiada	OBSERVACIONES
Momil	Optimización y expansión del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Momil	\$15.510.920.982	\$6.312.584.121	\$9.198.336.861	4736	Prepliegos se estima fecha apertura finales de agosto. Para la Interventoría se recibió una sola propuesta - aún no está contratada.
Montería	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para las veredas Cedro Cocido y Santa Paula corregimiento de Leticia de Montería, departamento de Córdoba	\$17.004.722.750	\$0	\$10.202.833.650	5000	Viernes se reunió el comité, y se indicó que el municipio debe garantizar operador y los subsidios para avanzar (ya enviaron certificaciones). Se va a realizar ajuste al proyecto por diámetro tubería baja a 11 mil millones.
Sahagún	Optimización y ampliación del sistema de acueducto en el municipio de Sahagún fase II (act)	\$10.317.773.307	\$4.199.093.788	\$6.118.679.519	40815	Ya está adjudicado contrato obra e interventoría. En legalización contrato obra, se realiza socialización la otra semana para firma tentativo 1 o 2 septiembre. 7 septiembre fecha inicio (tentativa).
San Antero	Optimización del acueducto de San Antero y del corregimiento el Porvenir en el municipio de San Antero	\$18.002.325.855	\$10.002.325.855	\$8.000.000.000	33096	El 25 de mayo se inició la ejecución. Existe un inconveniente con la tubería, aún no ha llegado, se proyecta que llegue en septiembre, por eso hay un retraso 5%. Están construyendo tanque almacenamiento. Se proyecta que la ejecución dure 12 meses. (se proyecta terminar en mayo 2023) Ejecutor: Aqualia.
San Carlos y Cereté	Construcción y optimización del sistema de acueducto para las zonas rurales – Las Tinajas en Cereté y San Carlos	\$11.954.786.274	\$8.954.786.274	\$3.000.000.000	12690	Obra civil adjudicada. 16 julio adjudicación interventoría. Aqualia está tramitando permiso con la ANI.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Municipios	Nombre del Proyecto	Valor Proyecto	Aportes Contrapartidas	Aportes Nación	Población Beneficiada	OBSERVACIONES
Valencia	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Jaraguay municipio de Valencia	\$1.974.580.106	\$0	\$1.974.580.106	722	<p>Porcentaje de ejecución 60%. Ejecutor: PDA Córdoba.</p> <p>Por la lluvia y el invierno el suministro de materiales se ha retrasado, se ha dificultado el acceso. Se dio prórroga 3 meses fecha terminación proyectada inicialmente octubre, entonces se iría hasta enero 2022. El contratista reporto desequilibrio económico por alza materiales específicamente el hierro. El reajuste sería de más o menos \$200 millones.</p> <p>El PDA está revisando el tema verificando el plan de inversión del anticipo, matriz riesgos, entre otros.</p>
Valencia	Optimización y sectorización hidráulica de la red de acueducto del casco urbano del municipio de Valencia, departamento de Córdoba	\$18.875.366.831	\$7.681.532.896	\$11.193.833.935	18024	<p>Predio está a nombre empresas públicas ,la empresa está en proceso liquidación</p> <p>Se solicitó certificación para que indiquen eso. Se están realizando ajustes a presupuesto interventoría, no se contempló en la interventoría suministro, se debe incluir más profesionales. Contrato obra se inicia la próxima semana.</p>

Adicionalmente se revisó el avance de los proyectos:

- Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba.
 Se va a financiar por regalías Departamento y recursos Golfo.
 Actualmente se encuentran subsanando las observaciones que realizó DNP y planeación.
- Construcción de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), sistema de captación, línea de conducción, tanque de almacenamiento y obras conexas, para el municipio de Tierralta y zonas rurales aledañas.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

- En Evaluación.
- Construcción del acueducto regional rural del sur de Tierralta.
 - En Evaluación.
- Acueducto Regional Costanero.
 - Beneficia 10 mil habitantes.
 - Hay muchos usuarios conectados de manera fraudulenta. Se duplica población.
 - Se propone realizar en dos fases.
 - No se va a desconectar, se realiza ampliación al lado. Es de vital importancia que quede funcional.
 - Se prevé pasarlo por Ventanilla Departamental.
 - Ya se tiene permiso de la ANI.
 - Se solucionaron problemas de servidumbres.



Fecha: 24/08/2021.
Reunión PDA Córdoba.



Fecha: 24/08/2021.
Reunión PDA Córdoba..



Fecha: 24/08/2021.
Reunión PDA Córdoba.



Fecha: 24/08/2021.
Reunión PDA Córdoba..

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Conclusiones y recomendaciones:

La Gestora del PDA Córdoba solicita apoyo para programar una reunión con la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial para revisar temas del proyecto Regional del Costanero, desde el MVCT se coordina y se programa para el 1 de septiembre de 2021 en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del MVCT.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

Juan Pablo Serrano C.

Juan Pablo Serrano Castilla.
C.C. 77.094.276 de Valledupar.

Patricia

Gloria Patricia Tovar Alzate
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Montería, Córdoba FECHA: 24 Agosto 2021 HORA: 9:00am

TEMA: Comité Gerencial Reactivación Económica PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Gestor PDA Córdoba

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Eduardo Arredondo	Contratista	MVCT	316874099	EArredondo	Comité Gerencial	
2	Andrés Erco	Contratista	MVCT	3112101544	aeato	"	
3	Juan P. Serrano C.	Sobdirector	MVCT	3205408850	jserrano@municipalidad.gov.co	"	
4	Javier Lopez	Tecnico	PDA	3016251755	javierlopez@pda.gov.co	Comité Gerencial	
5	Gloria Cabrera	Gerente	Adic	3008701454	gloria.cabrera@pda.gov.co	Comité Gerencial	
6	Gledy Z. Guzmán	Contratista	MVCT	3112706397	gguzman@municipalidad.gov.co	Comité Gerencial	
7							
8							
9							
10							
11							
