

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

1-2021-51 OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUÁREZ, TOLIMA

DATOS GENERALES

FECHA:	MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Meet meet.google.com/gyk-tgcp-ukv
ASISTENTES:	<p>Por el municipio LUCELLY VILLALBA DE SUÁREZ – Alcaldesa municipal EDWIN FERNANDO LOZANO CAMPOS – Secretario de Planeación municipal</p> <p>Por EDAT ANDRÉS MAURICIO VARÓN RAMÍREZ – Ingeniero contratista EDAT enlace técnico del proyecto GINNA ALEXANDRA REINOSO directora técnica EDAT</p> <p>Por el Ministerio NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Presentación del estado del proyecto y su situación actual.
3. Manifestación por parte del municipio y de la EDAT sobre el proceso de subsanación solicitado y presentación de avances.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace un recuento del proyecto y de los compromisos adquiridos. Los cuáles se describen así:

"1-2021-51 OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUÁREZ, TOLIMA VALOR: \$3.764.085.173 ESTADO: EN EVALUACIÓN

Proyecto que se recibe para evaluación por Requerimientos el 12 de marzo de 2021, Se remite listado de observaciones a la entidad formuladora (EDAT) el 14 de marzo. Se celebra mesa de trabajo el día 04 de mayo, se subsana documentación. Se realiza mesa del trabajo el 28 de mayo en el cuál se ratifican los compromisos: 1. Por parte del municipio de Suárez continuar la gestión para culminar los trámites de servidumbres que aún no ha

logrado concertar (faltan 4 predios de 9) y la certificación de garantía de suministro de energía para los elementos (remitido el 05 de junio) y componentes del proyecto que lo demandarán; por parte de la EDAT agilizar el trámite ante CORTOLIMA para la obtención de los 4 permisos de paso y ocupación de cauces que demanda el proyecto; por parte del Ministerio obtener los conceptos de los profesionales de apoyo en los componentes presupuestal, topografía, estructural, predial y suelos; de los cuáles se obtuvo los conceptos de Predial (18 de junio); estructural (25 de junio) y Topografía (13 de julio) y remitidos a la entidad para subsanación. La entidad aún se encuentra en fase de subsanación de dichas observaciones.”

Se hace un recuento del proyecto, en el que se manifiesta que en el proceso de evaluación se está a la espera del cumplimiento en la entrega de las subsanaciones solicitadas.

Por parte de la EDAT toma la palabra el ingeniero Andrés Mauricio Varón enlace técnico de la EDAT, quién manifiesta que se han estado desarrollando las subsanaciones, en especial las asociadas a los componentes predial y los permisos ambientales que requiere el proyecto. En relación con los componentes suelos, topografía y estructuras, que ha habido inconvenientes con el consultor que estuvo al frente de los diseños, pero que se espera en un corto plazo poder mostrar los diseños ajustados al MVCT.

El ingeniero EDWIN LOZANO por parte del municipio manifiesta que se ha trabajado para agilizar dichos componentes, y que el municipio continúa comprometido en su subsanación. Refuerza la intervención la señora alcaldesa LUCELLY VILLALBA y manifiesta que dispondrá de lo necesario para alcanzar a cumplir con cada uno de los requerimientos que se han generado del proyecto y agradece el apoyo de la EDAT y del MVCT en todo el proceso.

El Evaluador de MVCT manifiesta la importancia de contar con la trazabilidad de todo lo actuado en el proceso de obtención de los permisos ambientales, para lo cual solicita se allegue los soportes de los radicados que evidencien el estado del trámite de los permisos respectivos.

Se establece entonces el compromiso de generar una mesa de trabajo en tres (3) semanas (tentativamente para el 22 de septiembre) en la que se espera ya contar con avances en la subsanación de los componentes técnicos y para hacer un análisis del estado de los componentes predial y ambiental

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 16:00 horas del día 01 de septiembre de 2021.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación




Fecha: 09-09-2021

Correos | Recibidos | SigveVAS | Correos | Calendario | Resultados | (1) WhatsApp | Facebook | (2) pin | Meet | +

meet.google.com/gyk-tgcp-ukv

Aplicaciones | Autodesk Viewer | F... | RAR to ZIP | CloudC... | Archive Extractor O... | (2) Roundcube Web... | Lista de lectura

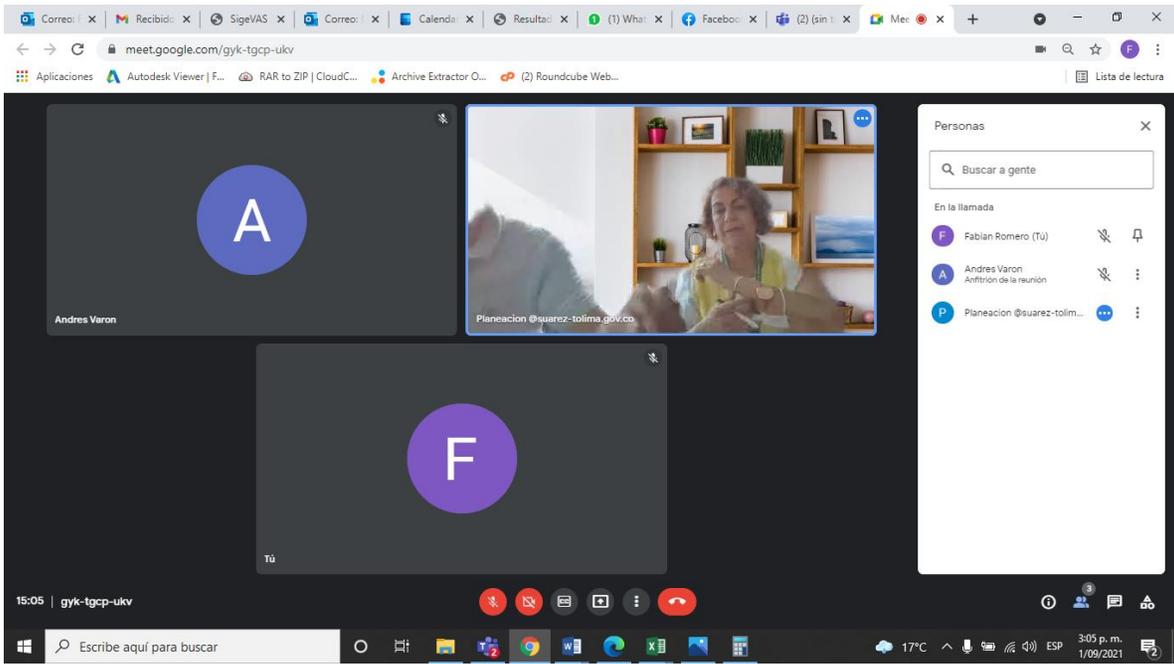

Personas

Buscar a gente

En la llamada

- Fabian Romero (Tu)
- Andres Varon
Anfitrión de la reunión
- Planeacion @suarez-tolim...

15:05 | gyk-tgcp-ukv

Escribe aquí para buscar

17°C | 3:05 p.m. | 1/09/2021
