

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	28 de julio del 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. horas
LUGAR:	<b>Sesión virtual</b>
ASISTENTES:	Mauricio Burbano / PDA Putumayo. Ing. Oscar Castro / Gerente ESP Ing. Jairo Martínez / Consultoría Ing. Johanna Mayoral / interventoría. Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador para hacer seguimiento al proyecto; **“CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”**.

1. Contextualización.
2. Seguimiento a compromisos y gestiones.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

Se indica al formulador que el proyecto “CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, se radicó y está en revisión según la Resolución 0661 de 2019, bajo la modalidad evaluación por requerimientos y en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento a los avances del proyecto y compromisos adquiridos.

#### 2. Seguimiento a compromisos y gestiones

La evaluadora líder del proyecto inicia la mesa de trabajo indicando que el objeto de la reunión es realizar seguimiento a todos los componentes del proyecto, como se relaciona a continuación.

#### Componente institucional

Se indica a la entidad formuladora la documentación que hace falta y se pacta como fecha de compromiso de entrega de la documentación el 28/07/22, luego de esto la documentación será remitida al especialista de este componente.

### **Componente predial**

Se indica que se tienen observaciones en predios, servidumbre, planos, etc., que fueron enviados a la entidad formuladora el 25/04/22.

El ing. Jairo manifiesta que tienen inconvenientes con un predio que no se pudo legalizar, por tal razón se hará una modificación al diseño este punto y se entregará la nueva versión de la documentación el próximo viernes 5 de agosto del 2022.

Por otro lado, indica que la plancha IGAC NO es exacta con relación a lo georreferenciado, sin embargo, se ajustará el plano predial y se revisará antes de la entrega.

### **Componente técnico**

Se informa a la entidad formuladora que se encuentran en evaluación por los especialistas el estudio topográfico, geotecnia, estudio eléctrico y diseño hidráulico.

En cuanto a la topografía, está será ajustada y entregada el 29 de julio del 2022.

**DISEÑO HIDRÁULICO:** se solicita a la entidad formuladora entregar la siguiente información:

Memorias de líneas de conducción y aducción

Aclaración de la estructura de entrada

Entregar planos en AutoCAD y firmados

Entregar nuevamente archivos en Epanet.

**AMBIENTAL:** se indica a la entidad formuladora entregar Permiso de concesión de aguas, para lo cual el ing. Oscar indica que se está esperando que la Autoridad Ambiental emita el permiso.

En cuanto al permiso de ocupación de cauce, se indica que ya se tiene la resolución y esta será entregada.

El proyecto contempla 2 pasos elevados, uno sobre una zanja en la línea de conducción y el 2do sobre una quebrada. Se recomienda revisar si se necesita ocupación de cauce en este paso elevado.

### **3. Conclusiones y compromisos**

El formulador se compromete a entregar la información institucional el 28/07/22, la información predial el 05/08/22 y la documentación faltante hidráulica el 29/07/22.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.


Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017.

La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Información institucional	Municipio / Consultor	28/07/22
2	Información predial	Municipio / Consultor	05/08/22
3	Información hidráulica	Municipio / Consultor	29/07/22

## FIRMAS:

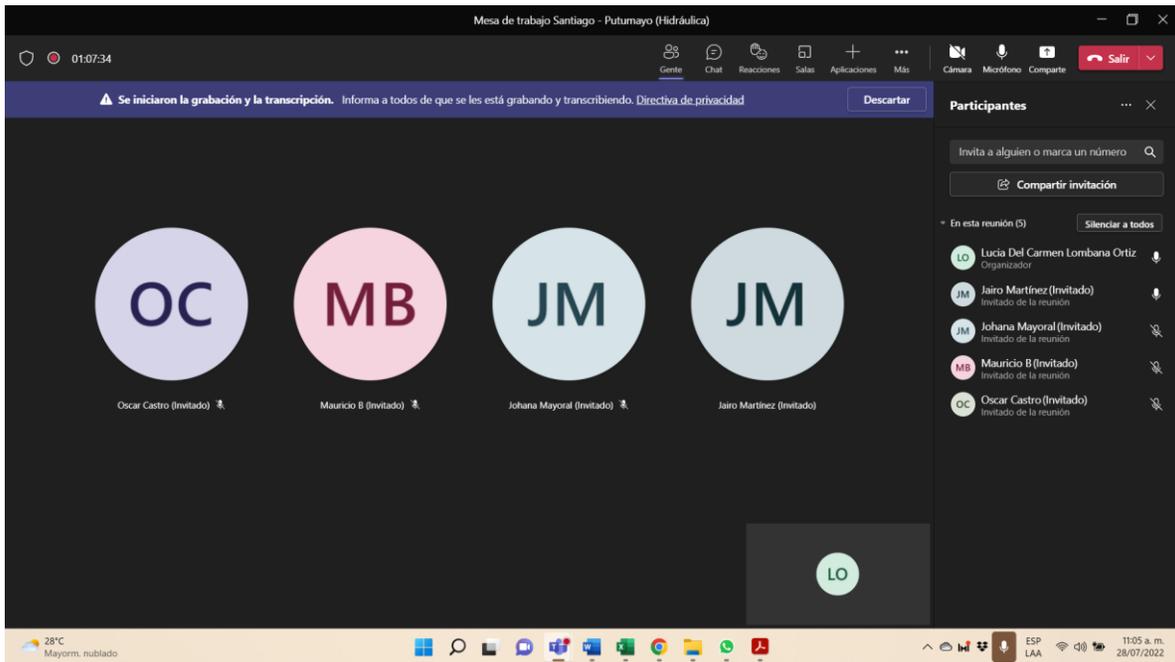

## DATOS DEL CONSULTOR

Nombre: Ing. Jairo Martínez

Cel. 320 7791228

Correo: jmc.nar@hotmail.com

Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 28-07-2022

Anexos: ninguno.
