

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de octubre de 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Julián Venegas Vargas / secretario de planeación. Sr. Humberto Segura / alcalde La Mesa Ing. Leonardo Álvarez / Especialista hidráulico EPC. Arq. Marcela Pineda / Dirección estratégica EPC Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento al avance del proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”.

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”, se encuentra en evaluación por requerimientos, y debido a que no se ha evidenciado avance en el proyecto, se realiza la presente mesa para acordar nuevas fechas de entrega de documentación ajustada a los cambios que sufrió el alcance del proyecto.

2. Seguimiento al proyecto

La ingeniera Lucia Lombana, inicia mesa de trabajo indicando que el objetivo de la reunión es programar nuevas fechas de entrega de la documentación ajustada al nuevo alcance del proyecto y además consultar al formulador si ha habido avances significativos en los ajustes de dicha información.

Se recuerda por parte del ing. Leonardo A., que el alcance del proyecto es; 5 tramos de alcantarillado sanitario en PVC de 12”, se contemplan 7 pozos de inspección y un paso elevado entre los pozos 18 y 23. El tramo de colector llega a un pozo existente e inicia en un pozo nuevo. Además, la Arq. Marcela comparte documento de diseño nuevo del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la Ing. Lucia L., evaluadora líder del proyecto, manifiesta que, según lo conversado en la mesa de trabajo anterior en el mes de junio, se quedó como compromiso la entrega de la documentación ajustada al nuevo alcance del proyecto el 29/06/22 y a la fecha de hoy no se ha allegado dicha información por tal razón se solicita nuevamente al EPC y al municipio entregar unas fechas de compromiso reales de radicación de las subsanaciones del proyecto en todos sus componentes; documental legal y Ambiental, institucional, técnico, presupuestal y predial, para así poder seguir con el proceso de evaluación del proyecto de acuerdo con los requisitos de la resolución 0661 del 2019.

Posteriormente se hace seguimiento a cada componente, indicando el avance de cada uno y programando fechas de compromiso de entrega de ajustes, como se indica a continuación.

Diseño Hidráulico: el formulador se compromete a entregar los ajustes hidráulicos el próximo 06 de octubre de 2022. La ing. Marcela y el ing. Leonardo manifiestan que ya se tiene el diseño completo con memorias, planos y documentos de diseño.

Componente Predial y ambiental: La ing. Lucia L., indica que las observaciones prediales fueron entregadas a la entidad formuladora el pasado 15 de marzo de 2022 y que a la fecha no se tiene entrega de ajustes. El secretario de planeación del municipio de La Mesa manifiesta que se encuentran trabajando en la documentación para poder hacer la entrega de los ajustes. Por su parte el sr. alcalde comunica que se han venido adelantando procesos de vía administrativa en el trámite de afectación de predios. Además, informa que se vienen adelantando las gestiones para el permiso de ocupación de cauce en el paso elevado que está proyectado sobre un cuerpo de agua. La ing. Lucia aclara que la documentación predial debe allegarse completa, incluyendo el plano predial sobre plancha IGAC contemplando el trazado completo del proyecto, al igual que toda la documentación requerida de predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso.

Geotecnia y topografía: se indica que las observaciones de geotecnia fueron entregadas a la entidad formuladora el pasado 01/03/22 y la última fecha de compromiso de entrega fue el 5 de julio de 2022, pero esta no fue cumplida. La ing. Marcela P., indica que se encuentran trabajando en la documentación y en próxima mesa de trabajo de seguimiento se dará una posible fecha de entrega de los ajustes. En cuanto a la topografía, igualmente se encuentran trabajando y más adelante se dará una fecha de entrega.

Diseño estructural: Se indica a la entidad formuladora que el paso elevado tiene revisión por parte del especialista, sin embargo, falta la documentación relacionada al diseño de los pozos para obtener el visto bueno del componente. EPC indica que la próxima semana les están entregando los diseños de los pozos.

Componente Institucional: la ing. Lucia L., indica que las observaciones de la documentación allegada fueron entregadas a la entidad formuladora el pasado 06/07/22 y a la fecha no se han entregado los ajustes. El municipio manifiesta que están recibiendo información de la entidad prestadora del servicio y más adelante darán fecha de entrega.

Presupuesto: La ing. Lucia L., manifiesta que se debe hacer entrega del presupuesto actualizado cumpliendo con los requisitos de la resolución 0661 del 2019.

Nota: Hubo cambio de secretario de planeación en el municipio de La mesa.


3. Conclusiones y compromisos


El próximo 06 de octubre del 2022, será entregada la información del diseño hidráulico. El próximo 27 de octubre del 2022, se realizará mesa de seguimiento al proyecto. La evaluadora líder enviará nuevamente el One drive del proyecto organizado por componentes, los formatos prediales e institucionales y las observaciones institucionales. Se recuerda que se hará acompañamiento del MVCT en el proceso de evaluación del proyecto. La mesa de trabajo se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de información hidráulica	EPC / Municipio	06/10/22
2	Mesa de trabajo de seguimiento	Todos	27/10/22

FIRMAS:

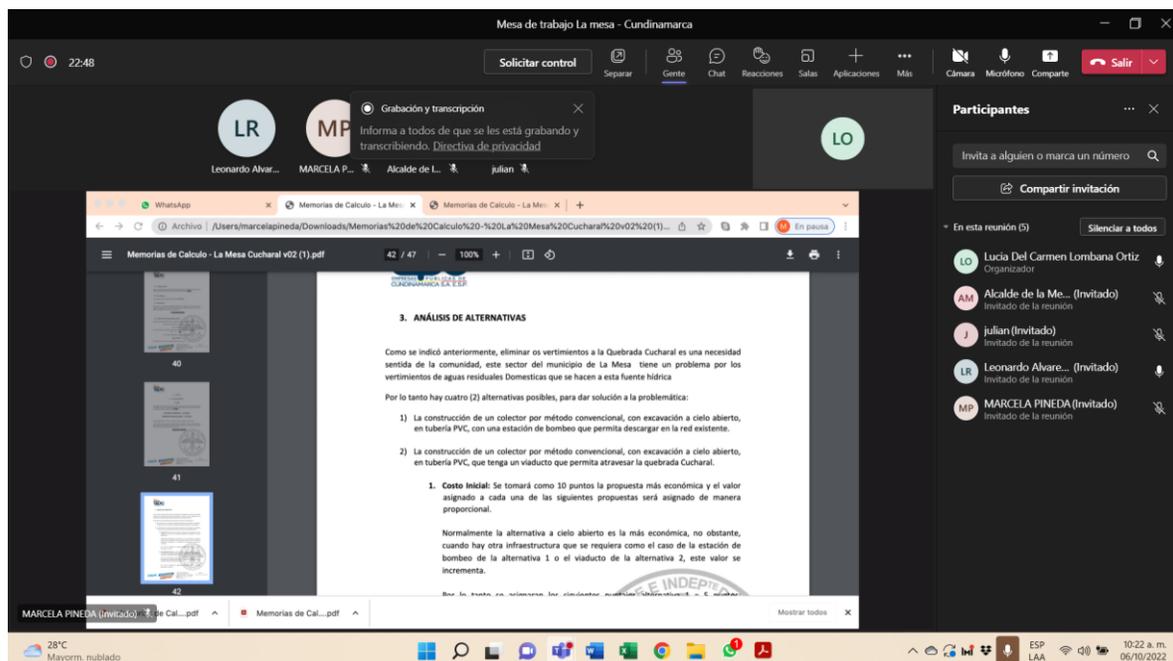

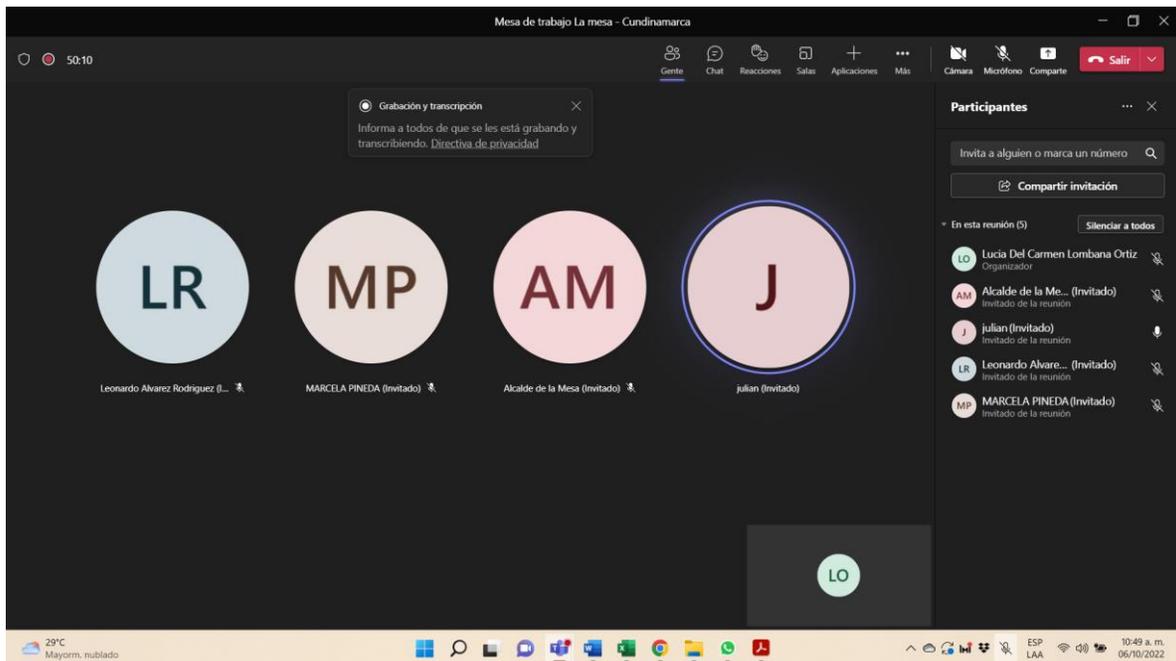

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	6/10/22, 9:59:14 a. m.	6/10/22, 10:56:36 a. m.
Leonardo Álvarez Rodríguez	6/10/22, 10:01:37 a. m.	6/10/22, 10:56:29 a. m.
MARCELA PINEDA (Invitado)	6/10/22, 10:04:11 a. m.	6/10/22, 10:56:24 a. m.
Alcalde de la Mesa	6/10/22, 10:18:32 a. m.	6/10/22, 10:54:59 a. m.
Julián (Invitado)	6/10/22, 10:29:56 a. m.	6/10/22, 10:56:35 a. m.

DATOS DEL CONSULTOR

Nombre: Empresas públicas de Cundinamarca EPC

Contacto: Arq. Marcela Pineda

Cel. 316 4533485

Correo: Marcela.pineda@epc.com.co

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 06-10-2022

Anexo: Ninguno.
