

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de febrero de 2023
HORA:	De 10:00 am a 4:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Germán Naranjo – Evaluador Líder MVCT Diana Patricia Pinto, Secretaria de Planeación Municipio de Mogotes, Santander 3165767028 Lady Morantes, Gestora PDA, ESANT, PDA de Santander, Eder Nieto, Seguimiento al Proyecto, ESANT, PDA de Santander, Guillermo Beltrán, Director de la Interventoría del Proyecto. Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co coordinador.gestion@esant.com.co Ladyestructuras@gmail.com eder.nieto@esant.com.co iq64diego@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para tratar los temas pendientes en todos los componentes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para definir el estado actual de ajuste y definir fechas de entrega.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 21 de febrero de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., la cual fue aplazada por solicitud del Consultor desde el 17/02/2023 fecha inicialmente planteada para esta mesa, con la finalidad de verificar el avance en la complementación y ajuste al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” revisando los compromisos de mesas anteriores. Esta reunión conto con la asistencia del Municipio, del equipo formulador del PDA, la Interventoría y la consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, inicia con los temas técnicos de suelos, estructuras y energía, los cuales continúan sin el visto bueno del MVCT, el Contratista indica que debido a un problema medico el geotécnia que estaba realizando los estudios no puede continuar y que al realizar el empalme para recibir la información no se encuentro la información de un sondeo, razón por la cual se debe repetir este sondeo lo cual implica una demora de al menos 10 días para la realización del estudio y la validación de los parámetros geotécnicos, con lo cual el consultor manifiesta que el 06/03/2023 entregaría este componente ajustado al MVCT para su evaluación, esto implica también que para esa fecha se entregue el componente de estructuras. Posteriormente informa que el componente de energía ya había sido presentado al especialista del MVCT ajustando las cotizaciones y las especificaciones técnicas, están en espera del visto bueno del especialista de energía del MVCT, el Ingeniero Naranjo se compromete a contactarse con el especialista para entender si aún falta algún elemento de este componente e indicarlo cuanto antes al formulador.


Posteriormente se trata el tema institucional en que se indica que a más tardar el día de mañana 22/02/2023 se tendría el certificado que hace falta. Por último, se trata el tema de presupuestos sobre el cual el contratista indica que remitirá a revisión un presupuesto sobre el cual solo hace falta ajustar las cantidades de cimentaciones que salgan de la validación del componente de geotecnia. Con lo cual posteriormente se compromete a realizar una mesa con los especialistas del MVCT para presentar el presupuesto definitivo. Sobre el componente presupuestal una vez se tenga el valor final se procederá a ajustar la documentación para su firma. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comuniqué al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Suelos y Estructuras.	Formulador	06/02/2023
2	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Institucional	Formulador	22/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.

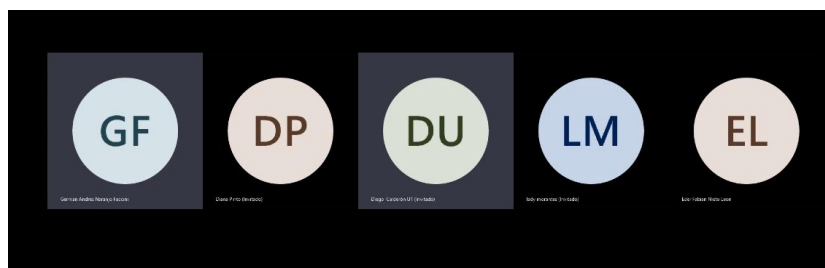

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 21-02-2023
