

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:22 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Valentina Cruz, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la consultoría y profesional del MVCT.

Se invitó a representantes del municipio de Condoto y de empresa AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A) quienes no asistieron.

2. Objetivo de la reunión.

Seguimiento a los pendientes con que cuenta el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA**

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO.

3. Desarrollo de la reunión.

- La mesa de trabajo tenía como motivo solicitar a representantes del formulador, principalmente consultoría y PDA Chocó, informar sobre el estado de los pendientes y ajustes solicitados al proyecto, puesto que los compromisos realizados previamente han sido incumplidos reiterativamente, por lo que se solicita que se establezcan nuevas fechas.

Es de recordar que el proyecto cuenta con pendientes de tipo documental, legal, técnico, financiero, ambiental y predial.

Aunque se han presentado avances parciales en el diagnóstico situacional (sistema de acueducto), análisis de alterativas (sistema de acueducto) y cumplimiento del componente institucional, y diseño hidráulico de la PTAP, sobre los demás requisitos estos se encuentran sin atención y se considera que los avances han sido poco frente a lo comprometido en mesa de trabajo anteriores.

- Por parte de la consultoría, mencionan que deberán realizar evaluación de los pendientes a la fecha para poder establecer los compromisos solicitados.

Se informa de parte de la consultoría, que mientras esto se realiza, se irán socializando ajustes en curso, como lo es el caso de la PTAP el cual había presentado avances importantes comentados en anteriores mesas de trabajo, por lo que se solicita al evaluador líder mesa de trabajo con el especialista del MVCT en plantas de tratamiento para el lunes 23 de octubre de 2023.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

Sobre lo tratado en la presente sesión se solicitó a la consultoría precisar fechas de entregas, ya que las anteriores comprometidas han sido incumplidas en varias

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ocasiones. La consultoría manifiesta que se reunirá con equipo de trabajo para realizar balances y estimar fechas de entrega,

Por otro parte la consultoría reporta que el próximo 23 de octubre de 2023 socializarán a través de mesa de trabajo a los profesionales del MVCT avances en los ajustes hidráulicos de la PTAP.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos: Diagnóstico situacional, análisis de alternativas, estudio hidrológico y diseño Hidráulico.	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	<i>Nota: Vencido. Se ha realizado entregas parciales que no cumplen integralmente los requisitos.</i>
2	Presentar ajustes técnicos: Estudio de tipografía, estudio de suelos, diseño estructural, diseño eléctrico, y documentos técnicos de soporte (especificaciones, 0 manuales, certificaciones, etc.)	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños hidráulicos.
3	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes realizados al proyecto.
4	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría	No se define fecha.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		PDA del Chocó	Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle
5	Presentar ajustes componente predial	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle, insumos que deberán ser soportes de las solicitud a realizarse ante la autoridad ambiental.
7	Presentar propuesta de vertimientos a CODECHOCO	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha.
8	Socialización de ajustes en la PTAP	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	23/10/2023

FIRMAS (reunión virtual):

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

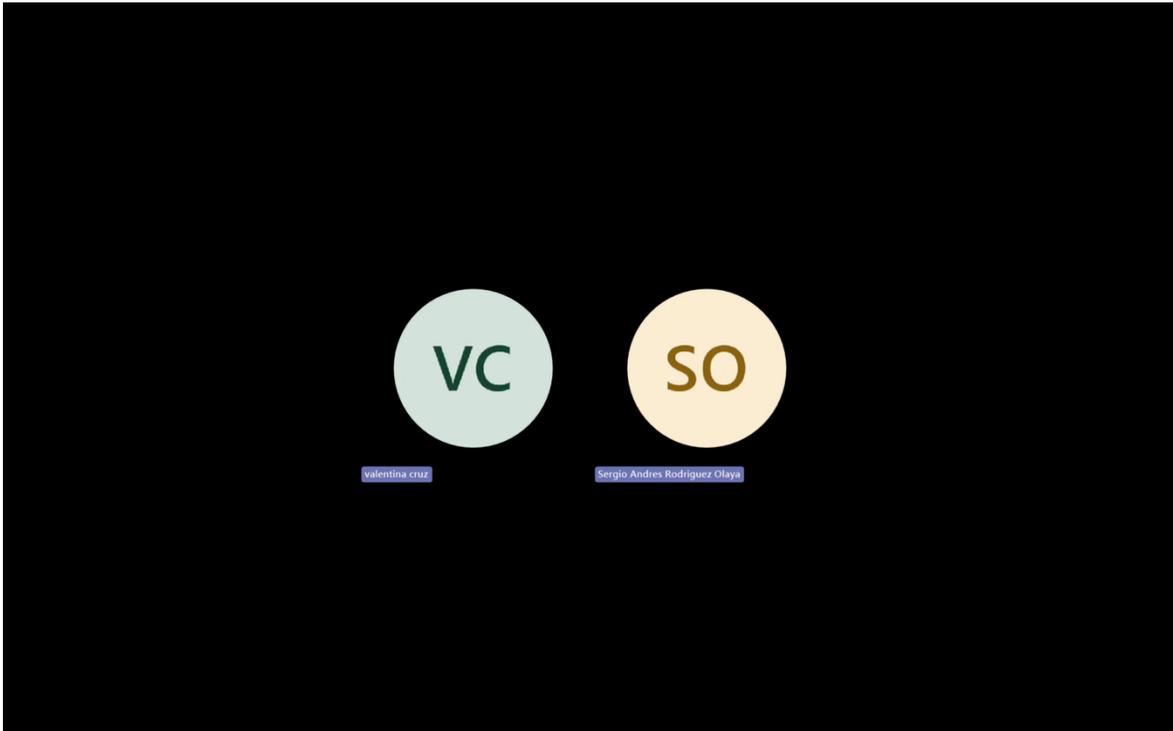

Anexos: (No aplica)
Elaboró(n): Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 17/10/2023
