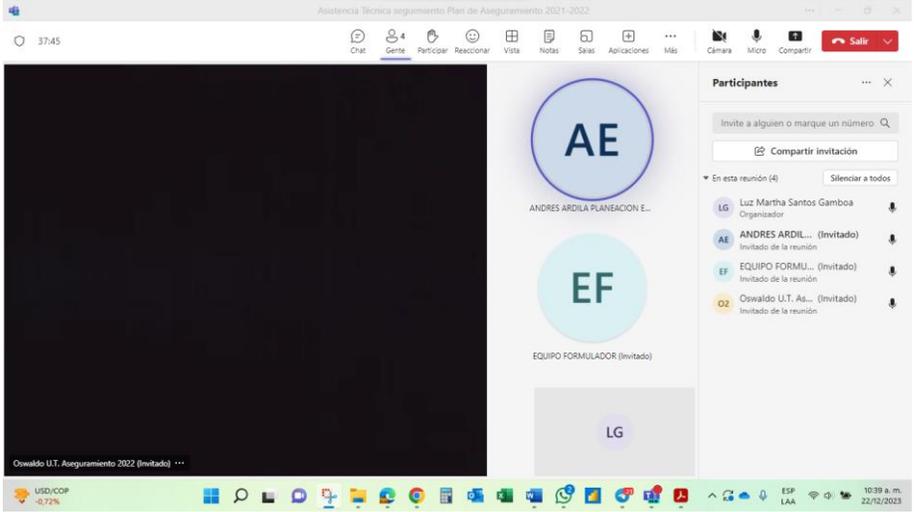


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 22-12-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. 10:40 a.m. horas
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	<p>Andrés Ardila Líder de Aseguramiento jefe Oficina Asesora de Planeación EDESA.</p> <p>Oswaldo Ruiz Coordinador Plan de Aseguramiento.</p> <p>Diego Martínez Representante legal suplente Unión Temporal Consorcio de Aseguramiento.</p> <p>Luz Martha Santos Gamboa Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial.</p> 
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Seguimiento al avance del Plan de Aseguramiento 2021-2022 y recomendaciones especiales para realización del informe de cierre y sus anexos.

DESARROLLO:

En cuanto al catastro de redes de los municipios priorizados de Guamal, Cubarral, El Dorado, San Juan de Arama y Fuente de Oro este mes no se registró avance ya que se han presentado dificultades en algunos de los municipios para obtener los permisos de intervención del espacio público para la realización de los apiques en vías pavimentadas. Se comenzó el avance del consolidando las bases definitivas para generar planos.

Los municipios adicionados en la primera modificación Puerto López, San Carlos de Guaroa, Cumaral, Mesetas y Uribe, en el programa de catastros de redes registran un avance del 87% se han presentado dificultades en algunos de los municipios para obtener los permisos de intervención del espacio público para la realización de los apiques en vías pavimentadas, actividades que se encuentra en procesamiento de información y consolidación de las bases de datos y generación de salidas gráficas. Si no es posible realizar los apiques en los municipios donde se tienen dificultades, se están tomando medidas correctivas en esta actividad y se realizó socialización de las bases de datos con los coordinadores de Edesa y gerentes de las empresas de Servicios Públicos de Puerto López y Mesetas, en reunión tanto en la entidad como la interventoría consideran valioso a nivel técnico la inspección de un pozo que el apique, por favor validar que efectivamente se este desarrollando la actividad ya que sin los apiques no se estaría realizando el catastro de redes de acueducto y se deberían realizar los respectivos ajustes presupuestales y de modificación del plan a que haya lugar.

El programa de mejoramiento de la calidad de agua: se realizó la compra y entrega e instalación de los equipos de dosificación por goteo volumétrico. Se finalizaron las instalaciones de los equipos todos los municipios. Se realizaron las respectivas capacitaciones está realizando el informe

La implementación y seguimiento a los indicadores de calidad del agua IRCA se terminó la instalación de dosificadores, implementación de dosificadores, con la entrega e instalación en diez (10) PTAP de bomba dosificadora de cloro y sulfatos como herramienta de mejora y capacitación, actividad que se encuentra adelantada en un 95.5%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A la fecha el avance del Plan de Aseguramiento está en el 88.5%

El día 22/12/2023 Se envió oficio al MVCT informando a cerca de la solicitud de prórroga del Plan de Aseguramiento.

Se recomienda por parte del MVCT hacer el envió de las fichas de seguimiento pendientes desde el inicio de ejecución del Plan de Aseguramiento

Octubre/2022
Diciembre/2022
Febrero/2023
Abril/2023
Junio/2023
Agosto/2023
Octubre/2023
Diciembre/2023

Se recomienda también remitir a este ministerio todos los informes respectivos de cierre junto con sus anexos. Así como la elaboración del informe ejecutivo en Word con el desarrollo y resultado del plan de aseguramiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Luz Martha Santos Gamboa 

Revisó:

Fecha:
