


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Reunión Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Fecha: 4 marzo 2024
Hora: 11:00 am

Asistentes:

Edgar René Muñoz Díaz - MVCT
Jorge Beltrán Calvo – MVCT
Rafael Gallardo Eraso – MVCT
Mayra Delgado – Secretaría de Agua PDA Norte de Santander

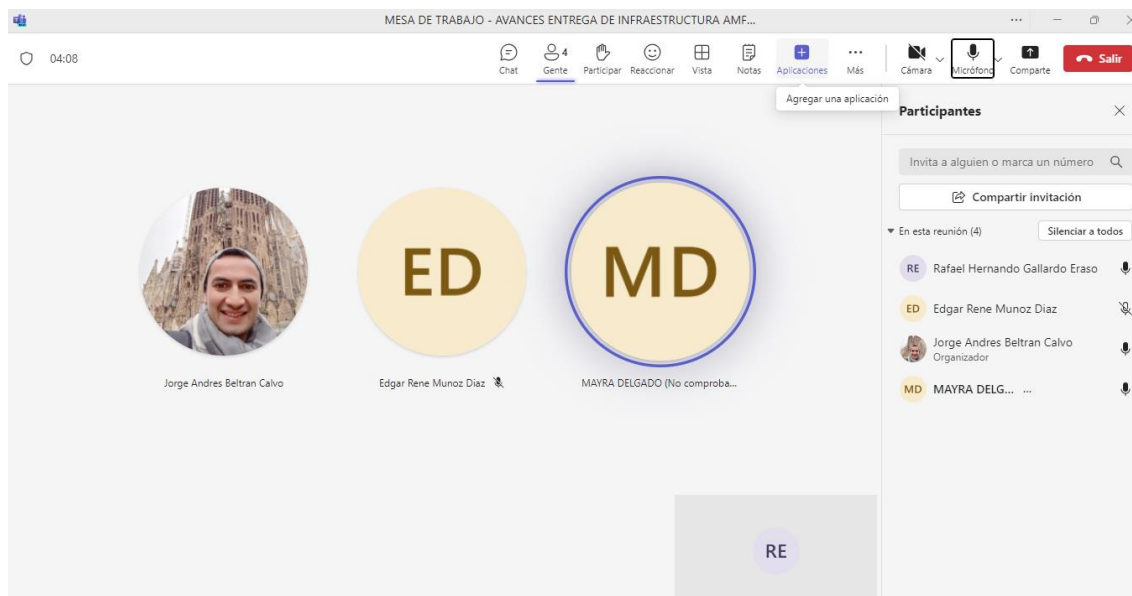

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a la entrega parcial del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER y recibo de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios

DESARROLLO:

El MVCT indicó que de acuerdo con los compromisos con la Sra. Ministra el 5 de abril debe estar entregando agua del Metropolitano a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, para lo cual, estos municipios deben recibir la infraestructura construida de manera parcial.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Así las cosas, hoy 4 de marzo de 2024 Ecopetrol S.A., debe entregar el sub proyecto 3 y parte del sub proyecto 4 al municipio de Cúcuta y se requiere información de los avances en la entrega por parte del ejecutor del proyecto de optimización de redes, el PDA de Norte de Santander a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios.

El representante del PDA informó que se hizo una socialización del proyecto a Aguas Capital y a los secretarios de planeación de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, quedando en la definición de la fecha, para hacer el recorrido y hacer la entrega parcial de las obras.

El PDA indicó que estaban trabajando de la mano con los operadores de los municipios, lo que facilitaría la entrega.

El PDA va a oficiar a los municipios para realizar la entrega parcial a los municipios, el oficio se enviará el día de hoy 4 de marzo de 2024, para hacer el recorrido el 11 de marzo de 2024.

El PDA solicita que el MVCT haga la próxima citación con los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, el MCVT hará la invitación para el 6 de marzo de 2024 a las 11:00 am, para definir y comprometer a los municipios para que el recorrido se haga el 11 de marzo (el PDA debe tener lista el acta de entrega parcial).

Deben definir con los municipios y el operador el tema tarifario, por lo que el MVCT citará para el miércoles 6 a las 10:00am a una reunión con Aguas Capital, al municipio de Cúcuta y a la Gobernación, para mirar el esquema tarifario.

COMPROMISOS:

- El PDA de norte de Santander enviará carta a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, para realizar el recorrido el 11 de marzo de 2024 y posteriormente se realizará la entrega parcial de las obras – 4 de marzo de 2024
- El MVCT citará a reunión para el 6 de marzo de 2024 a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios y La Gobernación. – 6 de marzo 11:00am
- El MVCT citará a reunión para el 6 de marzo de 2024 al municipio de Cúcuta, Aguas Capital y La Gobernación. – 6 de marzo 10:00am

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

