

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de abril de 2024
HORA:	De 09:21 a 09:57 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>De parte de la consultoría</p> <ul style="list-style-type: none">- Valentina Cruz, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto- Yeniffer Suárez, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto <p>De parte del MVCT</p> <ul style="list-style-type: none">- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la consultoría y profesional del MVCT.

Se invitó a representantes del municipio de Condoto y empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), quienes no asistieron.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Objetivo de la reunión.

Se solicitó por parte de representantes de la consultoría mesa de trabajo para presentar al nuevo al evaluador del proyecto la profesional que estará liderando ante el MVCT las solicitudes y requisitos del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”** y se realizará corte a la fecha sobre los avances y compromisos.

Por otra parte, con la intención de solicitud de viabilidad del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO”**, se realizará en conjunto con representantes de la consultoría mención sobre las actualizaciones necesarias que deben ir preparando una vez sean definidas las fuentes de financiación y se realice la solicitud de viabilidad ante el MVCT en caso que esta sea requerida.

3. Desarrollo de la reunión.

- A través de llamada telefónica, el Ing. Héctor Mosquera, Director técnico del PDA del Chocó, manifestó que no alcanzaba a conectarse a la reunión, y que posteriormente solicitaría reporte de lo acontecido a los representantes de la consultoría para los fines pertinentes.
- La Ing. Valentina Cruz, enlace encargado por parte de la consultoría para canalizar y atender observaciones y requerimientos, mencionó que, por nueva oportunidad laboral, trabajaría hasta este día con la consultoría, razón por la cual se encuentra en labores de empalme con la Ing. Yeniffer Suárez quien adelante asumirá dicha responsabilidad.

El Ing. Rodríguez (MVCT), realiza breve descripción de los últimos acontecimientos y gestiones sobre el proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**, sobre el cual destaca que, por decisión del formulador, se realizará una verificación del alcance del proyecto, excluyendo del presente el componente de alcantarillado y dejando únicamente el sistema de acueducto propuesto el cual es funcional para

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

un primera etapa. Esto anterior, mientras el formulador subsana aspectos técnicos y ambientales del alcantarillado.

Por otra parte, respecto del referido proyecto, menciona que el pasado 5 de abril de 2024, se recibieron ajustes técnicos parciales sobre el componente de acueducto, sobre los cuales los profesionales del grupo de evaluación se encuentran revisando. El día 15 de marzo será remitida el resultado de revisión, observaciones y pendientes del componente hidráulico. Sobre los demás aspectos, estos serán remitidos por separado al formulador, una vez estos sean reportados por lo especialistas del MVCT, entre los cuales se encuentran sobre: estudio de topografía, estudio de suelos y geotecnia, diseño estructural, y diseño eléctrico.

- Por otra parte, el proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO”**, a la fecha de la presente reunión, cuenta con concepto favorable sin financiación y sobre el mismo, se pretende solicitar la viabilidad una vez sean definidas las fuentes de financiación. De acuerdo con lo anterior, el Ing. Rodríguez (MVCT), procede a comentar lo siguiente.

Dicho concepto, tenía como condicionamientos presentar los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto, lo cual fue aportado por representantes del PDA y Municipio a través de los siguientes documentos y comunicaciones:

- Permiso de Concesión de Aguas. Se aporta la resolución 10170 del 7 de julio de 2023 “Por medio de la cual se otorga una concesión de Aguas Superficiales”. Caudal de la concesión 14 l/s, vigencia de 25 años.
- Permiso de Ocupación de Cauce – Se aporta la resolución 1087 del 7 de julio de 2023 “Por medio del cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce” para la captación.
- PSMV – Se aporta la resolución 1178 del 17 de agosto de 2022 “Por medio del Cual se Aprueba un Plan de saneamiento y Manejo de Vertimiento – PSMV”.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Permiso de Vertimientos – Se aporta la resolución 1716 del 9 de octubre de 2023 “Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimiento” para aguas residuales.
- Comunicado CODECHOCO 063 del 21 de febrero de 2024 aclarando que NO requiere permisos de ocupación de cauce para pasos tuberías por escorrentía y vertimientos, e informando conocimiento sobre cambio en tren de tratamiento de AR.

Por otra parte, el alcance del proyecto contaba con el componente “Apropiación, validación e implantación (Geotecnia y Estructuras)”, sin embargo, representantes del formulador presentaron documentación técnica complementaria, la cual fue revisada por los especialistas del MVCT, encontrando cumplimiento de los requisitos solicitados por la Resolución 0661 de 2019, por lo que se excluye este ítem.

Adicionalmente, se presentó presupuesto actualizado, considerando que el mismo contaba con valores de hace aproximadamente un año, se excluyó el componente de componente “Apropiación, validación e implantación (Geotecnia y Estructuras)”, y se realizaron revisiones menores en las cantidades producto de la información complementaria presentada en los estudios de suelos y estructuras.

Para tener en cuenta que, sobre la información complementaria que se revisó sobre los componentes de suelos y estructuras, posterior al concepto técnico otorgado el año pasado, la misma fue revisada por los profesionales especialistas del grupo de evaluación y dicha información se encuentra conforme. Por tal razón, y según ha sido conversado, se excluye del alcance del presupuesto proyecto dicho componente de “apropiación, validación e implantación de estudios y diseños”, y lo propio debe realizarse en los documentos que sean del alcance.

El valor del proyecto con Concepto Favorable Sin Financiación contaba con un valor \$27.983´476.432,00, y con las actualizaciones mencionadas, se estimó un valor de \$28.038´601.156,00, lo cual fue revisado por la especialista de presupuestos del grupo de evaluación de proyectos.

En caso que sea defina la disponibilidad presupuestal sobre la financiación o cofinanciación del proyecto del asunto, sobre este monto el formulador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

deberá contemplar el 2% sobre estos recursos a ser aportados por la nación, sumando este concepto al valor del proyecto, y deberá radicarse la documentación actualizada con estas consideraciones: entre estas, la carta de presentación; ficha MGA; formato resumen de proyecto; especificaciones técnicas; cronograma de obra e inversión; Formato PFRV (Actualizado con la cotización vigente); presupuesto y soportes actualizados; Certificado de funcionalidad e integralidad; la información técnica actualizada (particularmente estudio de suelos y diseño estructural); Certificado de canteras y escombros actualizado; e informe interventoría actualizado.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

El formulador pretende dar alcance al proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO**", presentando el mismo por fases, la primera correspondiente al sistema de acueducto y la segunda al sistema de alcantarillado. El formulador deberá presentar oficio informando al MVCT motivos y justificación de la modificación del alcance y ajustar nombre con el objeto de la primera fase.

El 5 de abril se presentaron ajustes técnicos parciales sobre el proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO**", los cuales vienen siendo revisados por parte de los profesionales del MVCT. El día 15 de abril de 2024, se realizará entrega de resultados de la revisión sobre el diseño hidráulico del sistema de acueducto

Sobre el proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**", el cuenta con concepto favorable sin financiación, se tienen la intención de solicitar la viabilidad del mismo, para lo cual se requiere la definición de las fuentes de financiación y actualizar documentación con dicha solicitud.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Presentar resultado de ajustes técnicos aportados vía email el 05/04/2024 Proyecto Condoto	Profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos	Resultado de la revisión del componente hidráulico: 15/04/2024
3	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador depende de entregas de otros componentes.</i>
5	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	<i>Nota: El archivo presentado no se pudo consultar por los profesionales del MVCT. La consultoría revisará y presentará nuevamente para la respectiva revisión.</i>
6	Presentar ajustes componente predial y ambiental	PDA del Chocó Municipio Condoto	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El componente ambiental se encuentra en trámite.</i>

FIRMAS:

REUNION SEGUIMIENTO COND... Chat Archivos Resumen **Asistencia** Salas para sesión de ... +2 Unirse


12 abr 2024 09:21 - 09:57 Descargar

3 Asistieron	09:21 - 09:57 Hora de inicio y finalización	36m 38s Duración de la reunión	33m 8s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	---

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	09:21	09:57	36m 36s	Organizador
 Valentina	09:24	09:57	32m 51s	Moderador
 Yeniffer	09:27	09:57	29m 57s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

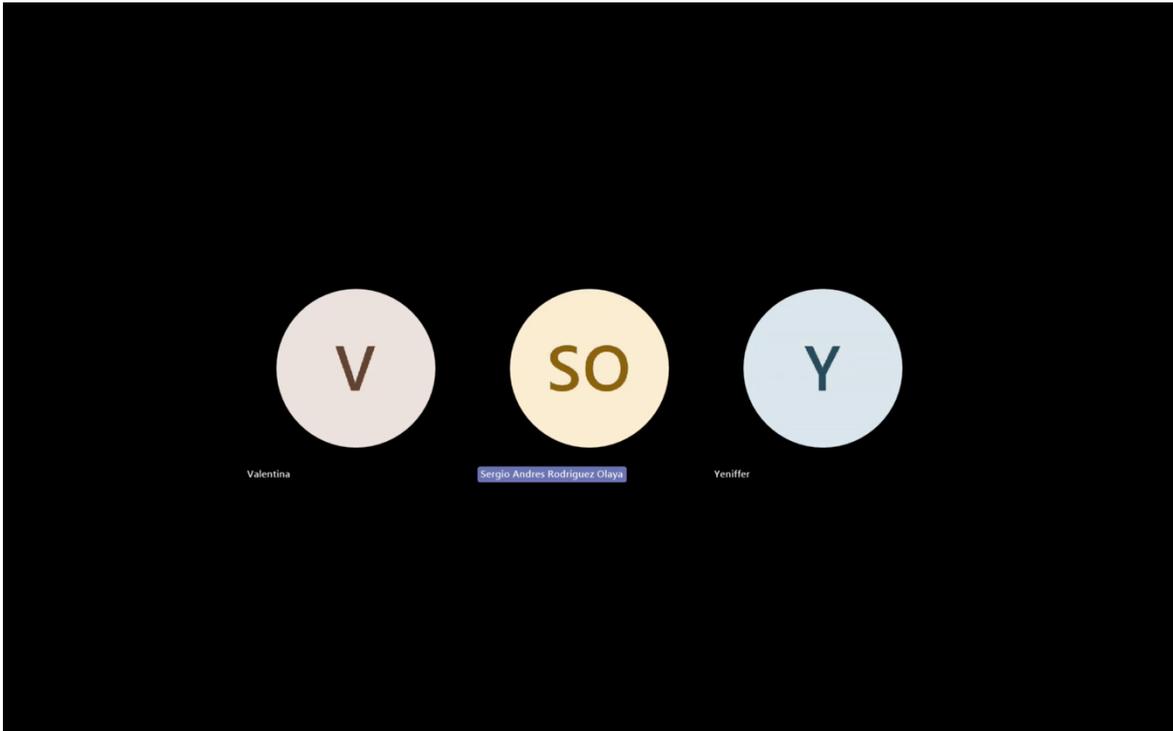

Anexos: (No aplica)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 12/04/2024
