

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **ACTA No. 03-2024**

#### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Leticia, Colombia, 21/06/2024
HORA:	De 09:00 AM a 10:00 M
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Miguel Angel Castro, Asesor Minvivienda Sayda Montes – Supervisora CUR 986-2021. Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda Ana Lucia López; Apoyo Supervisión Leticia Julio Martinez – Director de la oficina de servicios. David Cortez - Consorcio Terbi Jeison Medina – Consorcio Terbi Juan Carlos Mateus – Dir. De interventoría. Sebastian Rocha – Supervisor Findeter
INVITADOS:	N/A

#### **ORDEN DEL DIA:**

Reunión virtual de socialización costos de construcción alternativa seleccionada en el marco del proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS. CUR 986 DE 2021.

#### **DESARROLLO:**

Se hace una presentación de los asistentes y una breve exposición del objeto de la presente reunión convocada, la cual obedece principalmente a socializar los costos estimados a la fecha por parte del contratista de obra e interventoría para la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable.

El porcentaje de avance físico del proyecto, reportado por Findeter es de 9,60%.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El contratista de obra informó que el componente hidráulico se encuentra ya terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el diseño estructural de la planta, por lo que el contratista solicitó que se defina si el diseño de la planta se realizará por etapas o para una construcción total de la infraestructura.

Al respecto, por parte del MVCT se indicó que se consultó y revisó internamente en esta cartera, la posibilidad de financiar los costos estimados adicionales, frente a lo cual no se pudo conseguir recursos, teniendo en cuenta que actualmente hay restricciones en el presupuesto de la entidad por orden del presidente, motivo por el cual se hace necesario que Findeter solicite al Municipio la gestión de recursos, propios o a través de otras entidades para la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable.

Según lo estimado por la consultoría se podría hacer una primera etapa con capacidad de 88 lps, la cual contaría con dos carreras de tratamiento y tendría un valor total estimado de \$15.536 millones.

Findeter solicitó al Mpio, de Leticia informar cómo ha avanzado con la compra del predio adyacente a la planta de tratamiento, frente a lo cual, el Municipio indicó que ya remitió a la Sociedad de Activos Especiales - SAE., la intención de compra del predio y se está a la espera de respuesta por parte de dicha entidad. Por otra parte, con respecto a la identificación de linderos de la planta existentes, con la Secretaría de Infraestructura se está realizando la validación y se realizará entrega a Findeter el próximo miércoles 26 de junio de 2024.

Con lo anterior se da por terminada la reunión, con los siguientes compromisos.


**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir oficio al Municipio de Leticia con la necesidad de recursos para la construcción de la nueva PTAP.	Findeter	24-jun-24
2			

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

Link de la reunión virtual: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_Y2IxZjgxNjktN2QxOC00YjQzLWE5OWEtOWUxNDliOTc4NWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22oid%22%3a%22982df9f6-55e8-49d2-b8be-0134662ecbe4%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IxZjgxNjktN2QxOC00YjQzLWE5OWEtOWUxNDliOTc4NWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22oid%22%3a%22982df9f6-55e8-49d2-b8be-0134662ecbe4%22%7d)

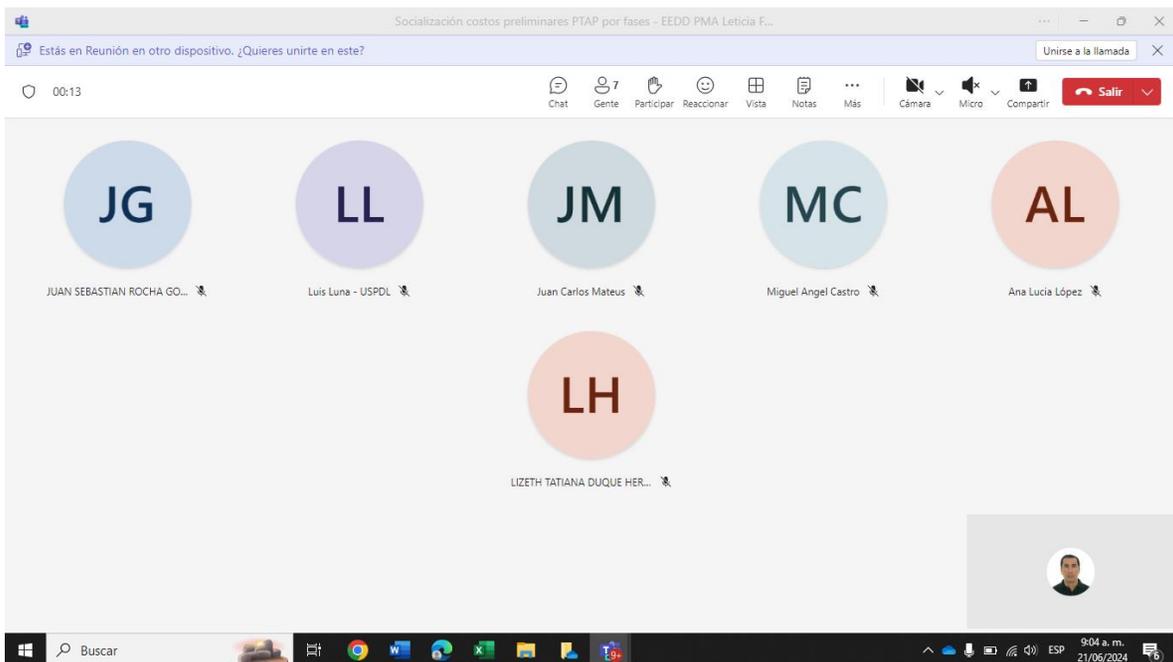

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 21-jun-2024
