



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30 de julio de 2024
HORA:	De 08:59 a 09:35 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	De parte de Aguas del Chocó S.A. E.S.P. Gestor PDA <ul style="list-style-type: none">- Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Área Técnica- Leidy Andrade, Área Financiera De parte de la consultoría <ul style="list-style-type: none">- Yeniffer Suárez, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto De parte del MVCT <ul style="list-style-type: none">- Oscar Fernando Acosta, Contratista Subdirección de Programas DIDE VASB- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), la consultoría y profesional del MVCT.

Se invitó a representantes del municipio de Condoto, quienes no asistieron.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Objetivo de la reunión.

Se solicitó por parte del evaluador del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**, la mesa de trabajo con el fin de realizar corte y seguimiento a los pendientes con que cuenta este a la fecha.

3. Desarrollo de la reunión.

- Dando continuidad a la mesa de trabajo realizada el 16 de julio de 2024, se realiza seguimiento a los compromisos establecidos en esta.

El Ing. Rodríguez (MVCT), realiza resumen a los asistentes sobre los requisitos pendientes:

- Componente documental y legal:
Con respecto de la carta de presentación y ficha MGA, se encuentran con observaciones pendientes de atender, sin embargo, con el fin de evitar reprocesos, una vez subsanado los demás componentes del proyecto serán ajustados los documentos.
- Componente institucional:
El componente fue revisado y los requisitos sobre este aprobados por parte del profesional de la subdirección de desarrollo empresarial. No obstante, se aclara que las certificaciones relacionadas con este componente deberán actualizarse dado el tiempo transcurrido de aquella revisión.
- Componente técnico:
Al igual que la carta de presentación y ficha MGA, el formato resumen del proyecto será ajustado una vez se encuentre de conformidad la demás documentación del proyecto.
Sobre los diseños hidráulicos, los pendientes fueron solicitados a través del correo electrónico del 15 de abril de 2024, los cuales se encuentran pendientes de atención. Se incluyen observaciones sobre los informes de diseño, memorias, manuales y planos. De acuerdo a lo expresado en la pasada mesa de trabajo, se esperaba entrega de estos estudios para el 19 de julio, lo cual fue incumplido.

Sobre el diseño eléctrico, no se han presentado las subsanaciones requeridas, estas consistentes principalmente en lo referido al presupuesto, APU, cotizaciones y especificaciones técnicas relacionadas con este requisito técnico. Con respecto de memorias de cálculo eléctricas, estas se presentan firmadas por un Ingeniero Electricista, pero en el pie de página aparece un ingeniero electromecánico.

Se encuentra también pendiente presentar la disponibilidad de servicio (energía), certificado de canteras y escombreras, certificado de funcionalidad e integralidad, cronograma de obra, especificaciones técnicas, entre las principales.

Sobre los diseños estructurales, el día 15 de julio de 2024 se presentaron por parte del formulador los últimos ajustes, los cuales fueron revisados por el especialista del MVCT; el día 16 de julio se informó cumplimiento de este requisito a través de correo electrónico.

Con relación al estudio de suelos, se recibieron ajuste por parte del formulador, y la especialista del MVCT se encuentra revisándolos y se espera contar con resultados el 2 de agosto de 2024.

Fueron revisados y encontrados con cumplimiento de requisitos: el estudio de topografía, el estudio hidrológico, diagnóstico situacional y análisis de alternativas, y el diseño estructural.

- Componente ambiental: Se requiere permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas, y se desconoce el estado de los trámites. Con relación al desagüe proveniente de la PTAP (uso de instalaciones y tratamiento de subproductos), se desconoce si se requiere permiso de vertimientos o disponibilidad de servicio en caso de conectarse al sistema de alcantarillado existente. En la presente reunión no se informó estado de los trámites.
 - Componente financiero: Una vez subsanado el componente técnico, se espera contar con el presupuesto coherente con la documentación técnica.
 - Componente predial: Sobre el componente predial, entre lo cual se encuentra pendientes relacionadas con plano de localización, acreditación de titularidad, servidumbres y formatos, en la presente reunión no se brindó información del estado de las subsanaciones sobre este requisito.
- La Ing. Suarez de parte de la consultoría, frente a lo anterior, comenta sobre los diseños hidráulicos, y los pendientes relacionados en el correo del 15 de abril de 2024, se encuentran en proceso de ajuste y se espera contar con estos para el final de la semana (19 de julio de 2024). Con relación a los pendientes respecto de los diseños eléctricos, estos serán ajustados con la versión actualizada del presupuesto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- De parte de AGUAS CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor PDA), respecto de los permisos ambientales, mencionan que los mismos se encuentran en trámite actualmente a la corporación; cuenta con certificados de evidencia del trámite, y se espera que la autoridad ambiental entregue los permisos en 10 días hábiles aproximadamente.

Sobre la evidencia del estado del trámite, el Ing. Rodríguez (MVCT) solicitó a los profesionales del PDA compartir correo electrónico con las mencionadas acreditaciones emitidas por CODECHOCO.

- Con relación al componente predial, por parte del PDA mencionan que les fue suministrada documentación legal a la consultoría para que la acondicione en el plano predial y ajuste los formatos correspondientes. Sin embargo, no se define fecha de entrega del componente hasta que sea verificada la documentación legal por parte de la consultoría.
- Se realizará reunión de seguimiento para el próximo 6 de agosto de 2024.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se realiza seguimiento sobre el estado de los pendientes del referido proyecto el cual cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

Los profesional del grupo de evaluación del MVCT actualmente se encuentran revisando subsanaciones parciales, correspondientes al estudio de geotecnia y se espera resultado para el 2 de agosto de 2024.

Sobre los diseños hidráulicos, el formulador manifiesta que se encuentra realizando las subsanaciones requeridas y espera contar con estas el 2 de agosto de 2024 para la revisión del evaluador del MVCT.

Sobre los demás pendientes comentados, entre los cuales se encuentran e los componentes ambiental y predial, están pendientes aportar los requisitos correspondientes. Sobre los permisos ambientales, se espera contar con estos en el mes de agosto de 2024, y el requisito predial se encuentra en ajuste por parte de la consultoría con información legal que fue suministrada a esta por parte del municipio y PDA.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos completos <i>Nota 1: Se han presentado parciales – los días 10 (estudio de suelos) de julio de 2024 a través de correo electrónico los cuales se encuentran en revisión de los profesionales del grupo de evaluación.</i> <i>Nota 2: <u>se espera entrega el 2 de agosto de 2024 sobre el componente hidráulico.</u></i>	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	<i>Nota: No se definen fechas de la entrega total de los requisitos por parte del formulador. Se han realizado entregas parciales, sin embargo, no se cuenta con el pleno de los requisitos</i>
2	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador depende de entregas de otros componentes.</i>
3	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador depende de entregas de otros componentes</i>
4	Presentar ajustes componente ambiental	PDA del Chocó Municipio Condoto	31/08/2024 <i>Nota: los permisos actualmente están en trámite y la fecha estimada es esperada de acuerdo al tiempo de respuesta de la entidad ambiental que otorga los requeridos.</i>
5	Presentar ajustes componente ambiental	PDA del Chocó Municipio Condoto Consultoría Interventoría	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador se encuentra ajustando y en la próxima mesa de trabajo actualizará el estado.</i>



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
6	Revisión de ajustes recibidos el 10 de julio de 2024 – estudio de suelos	MVCT	02/08/2024
7	Mesa de trabajo de seguimiento a los pendientes	PDA del Chocó Municipio Condoto Consultoría Interventoría MVCT	06/08/2024

FIRMAS:

SEGUIMIENTO SEMANAL PEND... Externo Unirse 4

30 July 2024 08:58 - 09:35 Descargar

8 Asistieron	08:58 - 09:35 Hora de inicio y finalización	36m 45s Duración de la reunión	16m 24s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes


Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	08:58	09:35	36m 42s	Organizador
Oscar Fernando Acosta Mend... OAcosta@minvivienda.gov.co	09:00	09:34	34m 35s	Moderador
hector emilio mo... (No comprobado)	09:00	09:03	3m	Moderador
Yeniffer (No comprobado)	09:03	09:10	7m 4s	Moderador
Yeniffer Jimé... (No comprobado)	09:14	09:34	20m 37s	Moderador
Leidy Andra... (No comprobado)	09:16	09:34	18m 38s	Moderador
HECTOR EMILIO MOSQUERA	09:25	09:34	9m 20s	Moderador
Hector Mosquer... (No comprobado)	09:33	09:35	1m 18s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre2	Cargo	Entidad/ Municipio	Teléfono o celular	Correo electrónico	Solicitudes/ temática
1	7/30/24 9:03:48	7/30/24 9:04:39	Oscar Fernando Acosta Mendoza	Contratista	MVCT - VASB	3175123735	Oacosta@minvivienda.gov.co	Proyecto Condoto Acueducto
2	7/30/24 9:04:05	7/30/24 9:05:17	Sergio Andrés Rodríguez Olaya	Contratista - Evaluador Líder	Subdirección de Proyectos DIDE VASB MVCT	3112763283	srodriguez@minvivienda.gov.co	Seguimiento a pendientes del proyecto
3	7/30/24 9:19:57	7/30/24 9:27:02	Yeniffer jimenez	Consultoría	Redes condoto	3138001048	Redescondoto@gmail.com	Reunión seguimiento
4	7/30/24 9:32:59	7/30/24 9:34:24	Leidy. Andrade Caballero	Financiera	Aguas del Choco	3117898461	Financiera@aguasdelchoco.gov	Certificados

Nota: no diligenció listado de asistencia Ing. Héctor Mosquera – Coordinador Técnico PDA Chocó, sin embargo, en la asistencia que reporta Microsoft Teams e impresiones de pantalla de la reunión se evidencia la participación. Correo electrónico areatecnica@aguasdelchoco.gov.co, celular 313-7052056.

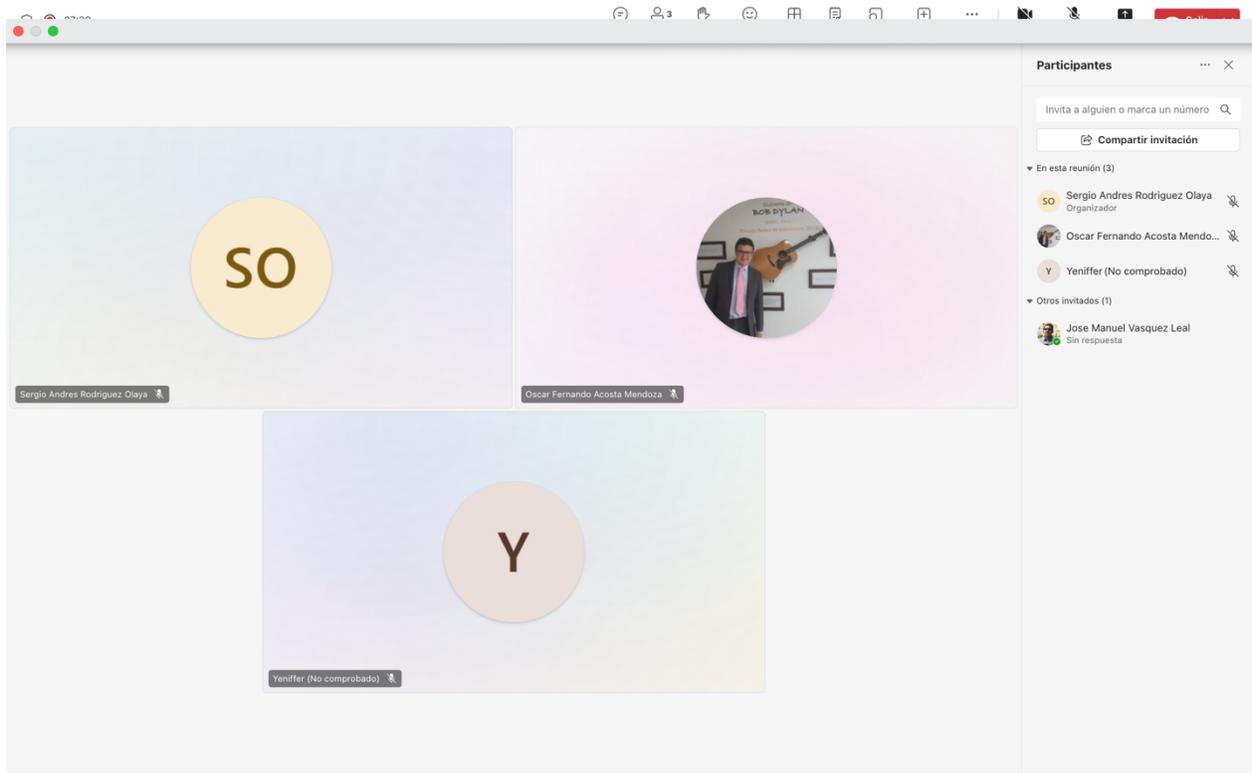



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Registro diligencia de formato virtual de asistencia)

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 30/07/2024

Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

00:51

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 30 de julio de 2024

HORA: 09:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez O.

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Oscar Fernando Acosta Mendoza

2. Cargo *

Contratista

3. Entidad/ Municipio *

MVCT - VASB

4. Teléfono o celular *

3175123735

5. Correo electronico *

Oacosta@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Proyecto Condoto Acueducto

Ver resultados

Encuestado

2 Anónimo

01:13

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 30 de julio de 2024

HORA: 09:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez O.

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista - Evaluador Líder

3. Entidad/ Municipio *

Subdirección de Proyectos DIDE VASB MVCT

4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electrónico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Seguimiento a pendientes del proyecto

Ver resultados

Encuestado

3 Anónimo

07:06

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 30 de julio de 2024

HORA: 09:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez O.

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

2. Cargo *

3. Entidad/ Municipio *

4. Teléfono o celular *

5. Correo electronico *

6. Solicitudes/ temática *

Ver resultados

Encuestado

4 Anónimo

01:26

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual Microsoft Teams

FECHA: 30 de julio de 2024

HORA: 09:00 am

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez O.

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

2. Cargo *

3. Entidad/ Municipio *

4. Teléfono o celular *

5. Correo electronico *

6. Solicitudes/ temática *
