

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 2 - Junio 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 6 de Junio de 2024.
HORA:	7:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER – CUR 1373-2023"

### **DESARROLLO:**

1. Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER – CUR 1373-2023"

La Esant entrega informe semanal No. 4 de fecha 4 de junio de 2024, con ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 con la siguiente información:

Contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.

Contratista: CONSORCIO PTAP MOGOTES. Contrato 056-24, valor \$2.652.003.426

Interventor: CONSORCIO INTERMOGOTE, contrato 060-24, valor \$241.094.202

Plazo: 6 meses

### **PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Descripción	Planeado	Ejecutado	Avance
Avance Físico	0,04%	0,42%	0,36%
Avance Financiero	1.125.210,60	11.252.106	

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTIVIDADES

En la presente semana se está realizando revisión de la información del proyecto

La Esant – Ingeniera Marcela Suarez León apoyo a la Supervisión informa que se está realizando balance del proyecto por el contratista de acuerdo a visita de obra del 30 de mayo de 2024, donde se reviso nuevamente el cambio de dos filtros a cuatro filtros, realineamiento de tubería por encontrarse en zona de cultivos y revisión de redes del proyecto, porque Espamogotes ya intervino y realizo reposición de redes incluyendo pavimento e instalación de piedra Barichara.

La Esant informa que entrega reformulación no. 1 del proyecto en un mes aproximadamente (& de julio de 2024).


El Ministerio solicita nuevamente e indica a la ESANT que desde el 23 de mayo de 2024 se ha solicitado el trámite de otrosí No. 1 del convenio 1373 de 2023 el cual vence el 31 de julio de 2024 y el contrato de obra tiene acta de inicio del 2 de mayo de 2024 y fecha de terminación 1 de noviembre de 2024.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Tramite de otrosí No. 1	ESANT	14-06-2024
2	Tramite de reformulación No.1	ESANT	6-07-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

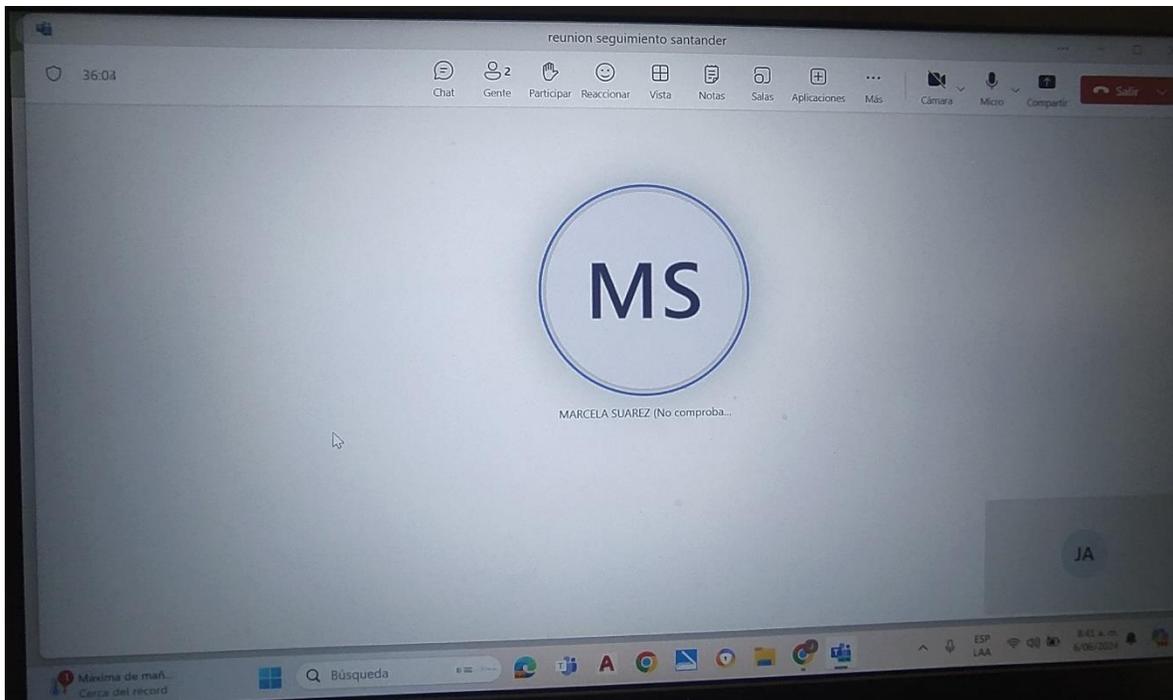

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: junio 6 de 2024
