

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 7 – Octubre 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de Octubre de 2024.
HORA:	10: 00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

El 11 de octubre 2024, Esant informa que el Municipio inicia proceso de avalúo en la segunda semana de octubre de 2024.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

Interventoría entrego a la ESANT toda la documentación del proyecto y la Esant se encuentra en revisión para iniciar con actas de terminación para el 18 de octubre de 2024.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

Con modificación 11, de precios no previstos y adicional en plazo 9, adicional en valor No. 2 de acuerdo con reformulación No. 3 aprobada por el Ministerio, se tiene fecha de terminación 24 de agosto de 2025.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Informe semanal del 5 de octubre de 2024. Se tiene un avance del 73,99% contra un programado del 77,39%.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

Se realizó reunión el 10 de octubre de 2024, programando reunión técnica el 11 de octubre de 2024 y reunión jurídica el 17 de octubre de 2024, con Findeter y Esant. Findeter se compromete a entregar el presupuesto final para la tercera semana del mes de octubre.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se realizó reunión de seguimiento de la reformulación No. 1 entre la Esant y al Ministerio el 10 de octubre de 2024, se realizó revisión general de anexos. El valor adicional de Ref. 1 es de \$423.935.581. Se debe revisar NP4 correspondiente a material seleccionado, se debe enviar soporte del consultor con respecto a cambio de trazado, se debe completar cuadro comparativo con cantidades y valores viabilizados, contratados, mayores y menores y reformulación No. 1.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de terminación de Socorro	Interventoría-ESANT	18-10-2024
2	Revisión reformulación No. 1 Mogotes.	Esant - MVCT	16-10-2024
3	Inicio proceso de avalúo, servidumbre Sra. Hilda Vélez Guayabos	Municipio	15-10-2024
4.	Reunión de seguimiento Lebrija.	Findeter, Municipio, Esant	17-10-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5.	Reunión de seguimiento Lebrija.	Municipio, Findeter, MVCT	11-10-2024
----	---------------------------------	---------------------------	------------

FIRMAS:

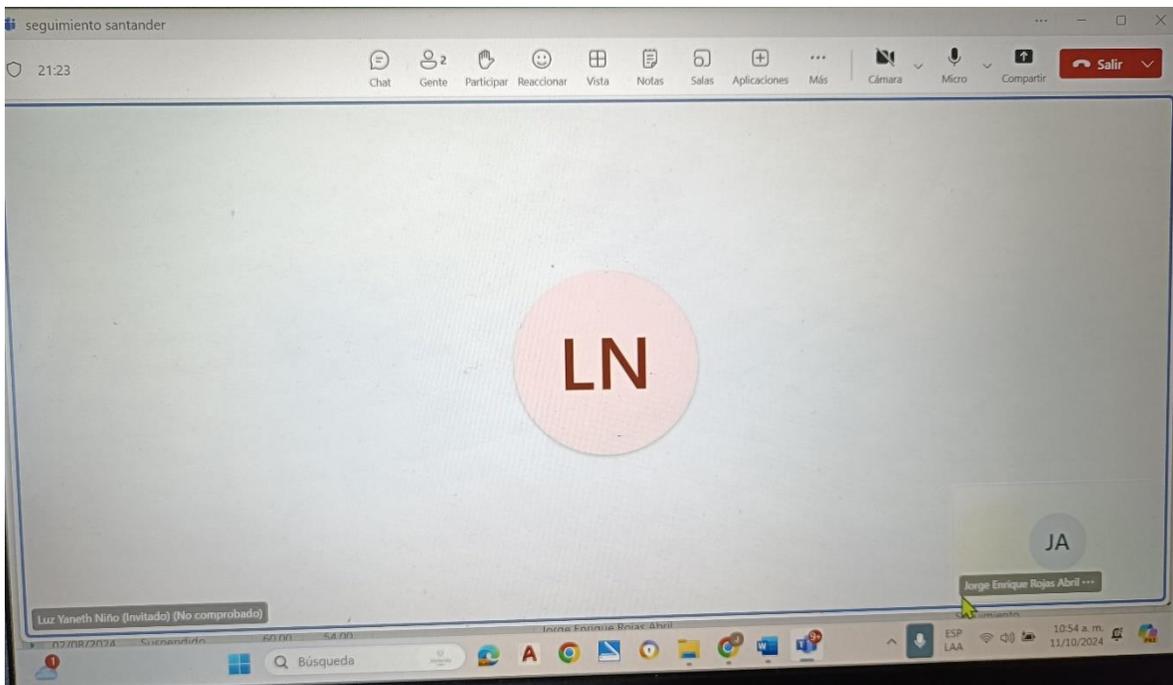

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: octubre 11 de 2024
