

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No.15 OCTUBRE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de Octubre de 2024.
HORA:	9:30: a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

### DESARROLLO:

Ingeniera María Ruiz de Piedecuestana informa que se tiene un avance de 50,54 % contra un 50,66 % de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses y informe semanal al 20 de octubre de 2024.

El contratista solicito ampliación en tiempo con una prórroga de 4 meses, la cual fue aprobada con nueva fecha de terminación del 16 de febrero del 2025.

Los bajos rendimientos se deben a la topografía del terreno para el acceso y la realizacion de excavaciones, instalación de tubería, rellenos en un mismo día.

Adicionalmente se presentan problemas con el suministro de accesorios. Se busco un tercer proveedor lo cual no ha sido viable por tiempo de suministro y costo.

El Ministerio informa que, con la prórroga de los contratos derivados por 4 meses, se tiene nueva fecha de terminación del proyecto el 16 de febrero de 2025, por lo que es necesario solicitar por parte de Piedecuestana y el Municipio prorroga al convenio 1371 de 2023 que vence el 31 de diciembre de 2024.


El Ministerio solicita se actualice la plataforma sigevas en el plan financiero-Autorizaciones y pagos-seguimiento con los contratos derivados, valores facturados y valores pagados a la fecha.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión solicitud tiempo terminación de obra, entrega al Municipio, liquidación de contratos derivados.	Contratista, Interventoría, Piedecuestana	25-10-2024
2	Solicitar prórroga al convenio 1371-2023	Piedecuestana	30-10-2024
3	Cumplir con las reuniones de veeduría Ciudadana	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	30-10-2024
4	Actualización del sigevas	Piedecuestana	30-10-2024

**FIRMAS:**

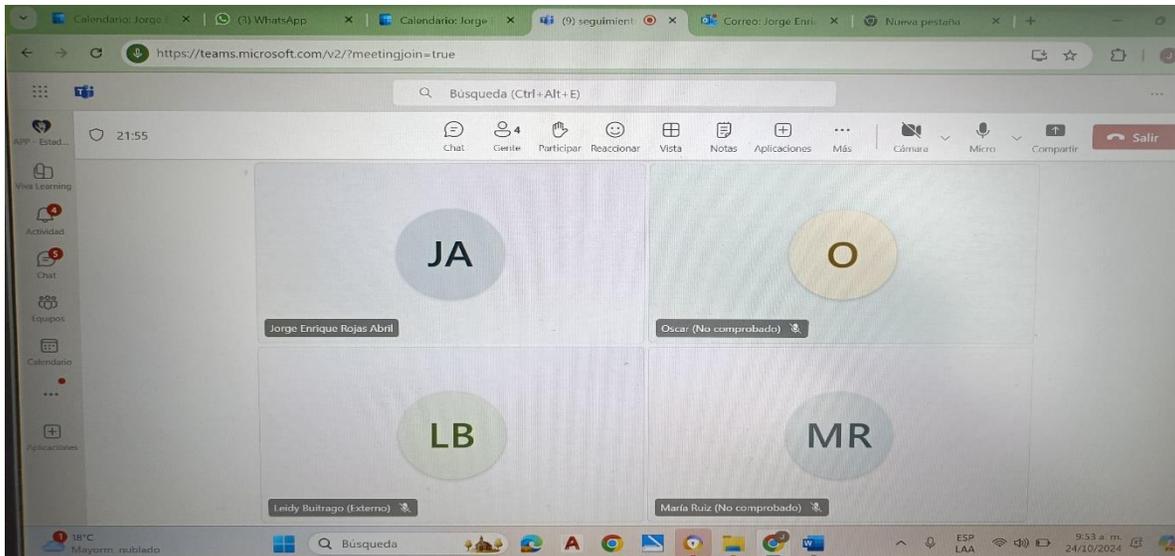

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: octubre 24 de 2024
