

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de octubre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 02:30 pm a 04:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Gillson Stheiman Mora Agudelo – Apoyo a la supervisión Convenio CUR 1078 de 2020, Madrid sur y sur oriental. Mayra Alejandra Castro – Apoyo a la supervisión proyectos Madrid Occidental y sur occidental Juan Manuel salguero – Apoyo a la supervisión EPC Jonathan Herrera – Supervisor EPC Hector Maffiu Apoyo a la Supervisión EAAM Anderson Gonzales – residente interventoría Sergio Mendez – Residente obra
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de los proyectos de Madrid oriental, sur oriental, sur, occidental y sur occidental

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 02:30 pm, con saludo a los profesionales presentes.
2. La reunión empieza con solicitud del MVCT para presentación del estado de cada uno de los proyectos iniciando con los proyectos a cargo del arquitecto Gillson mora apoyo a la supervisión del MVCT e indicando lo siguiente:

Orienta y Sur: suspendidas las obras por solicitud de INVIAS ya que el permiso de intervención dado por esta entidad se encontraba para ejecutar actividades sobre la franja del andén y zonas blandas, no por el centro de la vía como se estaba ejecutando, se está buscando reunión con INVIAS para revisar la procedencia de la actualización del permiso.

Para Madrid Oriental el avance de obra programado es del 84.74% contra un 91.5% ejecutado

Para Madrid Sur un avance de obra del 68% contra un ejecutado del 72.1%

Ante esta situación, la EAAM como responsable de los trámites y permisos ante terceros, indica que espera que para la próxima semana se de la reunión con INVIAS y así saber qué proceso adoptar para destrabar la ejecución de las obras.

Por parte del ministerio se solicita informar los resultados de la reunión y si es necesario el acompañamiento de esta entidad se realizara de inmediato.

Con la falta de definición del permiso por parte de INVIAS y la estructura de vía a construir, se afecta la presentación de las reformulaciones de los proyectos de Oriental y Sur, ya que se impacta el presupuesto de las obras y se necesita el permiso de INVIAS para la intervención vial.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar resultado de reunión con INVIAS	EAAM SA ESP	25/10/2024
2	Ajuste presupuesto de obras y documentos de reformulaciones	Contratista e interventor	30/10/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

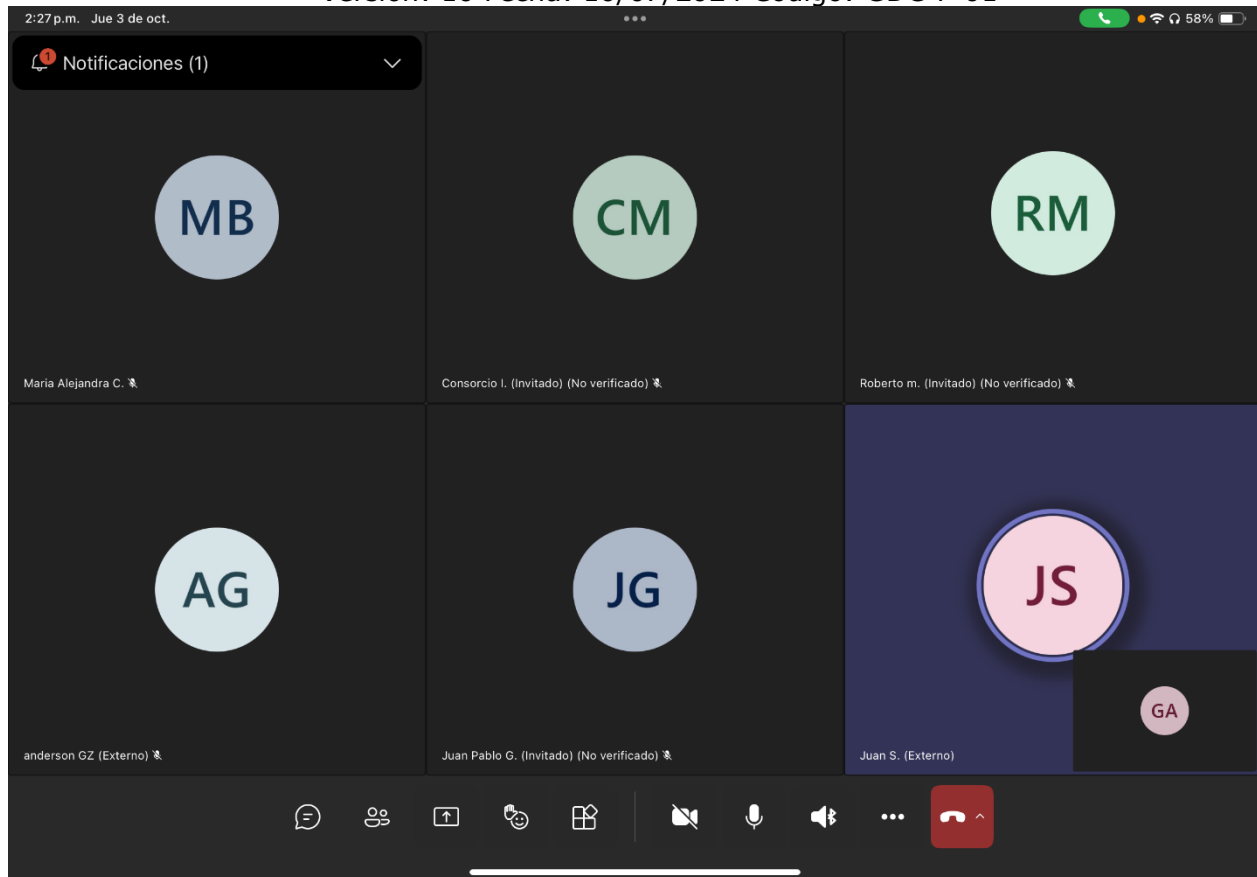

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 03/10/2024
