



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	07 de noviembre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 02:30 pm a 04:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Gillson Stheiman Mora Agudelo – Apoyo a la supervisión Convenio CUR 1085 de 2020, Madrid sur y sur oriental. Mayra Alejandra Castro – Apoyo a la supervisión proyectos Madrid Occidental y sur occidental Juan Manuel salguero – Apoyo a la supervisión EPC Jonathan Herrera – Supervisor EPC Hector Maffiu Apoyo a la Supervisión EAAM Anderson Gonzales – residente interventoría Sergio Méndez – Residente obra
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de los proyectos de Madrid oriental, sur y sur oriental

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 02:30 pm, con saludo a los profesionales presentes.
2. La reunión empieza con solicitud del MVCT para presentación del estado de cada uno de los proyectos iniciando con los proyectos a cargo del arquitecto Gillson Mora apoyo a la supervisión del MVCT e indicando lo siguiente:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Orienta y Sur: continúan suspendidas las obras por solicitud de INVIAS ya que el permiso de intervención dado por esta entidad se encontraba para ejecutar actividades sobre la franja del andén y zonas blandas, no por el centro de la vía como se estaba ejecutando, se está buscando reunión con INVIAS para revisar la procedencia de la actualización del permiso.

EPC SA ESP informa que resultado de la reunión del 23 de octubre con INVIAS se hace necesario la presentación de la solicitud de modificación del permiso de intervención, actividad a cargo de la EAAAM SA ESP

Se informa por parte de EPC SA ESP y de la EAAAM SA ESP que tanto los contratos de obra como de interventoría fueron suspendidos a partir del 01 de octubre para Madrid oriental y del 28 de octubre para Madrid Sur, el tiempo de suspensión para todos los contratos es inicialmente de un mes.

El proceso de reformulación queda suspendido a la fecha debido a que no se tiene claro el permiso de INVIAS, la estructura de la vía y por ende la estructuración del presupuesto de la reformulación.

Para el proyecto de suroriental, la EAAAM SA ESP informa que resultado de la audiencia de 18 de octubre de 2024, la liquidación unilateral no es procedente y que el contratista solicitó tiempo de 2 meses para realizar sesión del contrato y legalización del nuevo contratista a fin de suscribir acta de inicio en el mes de diciembre de 2024 con la etapa de preconstrucción la cual está programada para un mes.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical a INVIAS solicitud de modificación de intervención de vías.	EAAAM SA ESP	25/11/2024




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Ajuste presupuesto de obras y documentos de reformulaciones	Contratista e interventor	30/11/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión

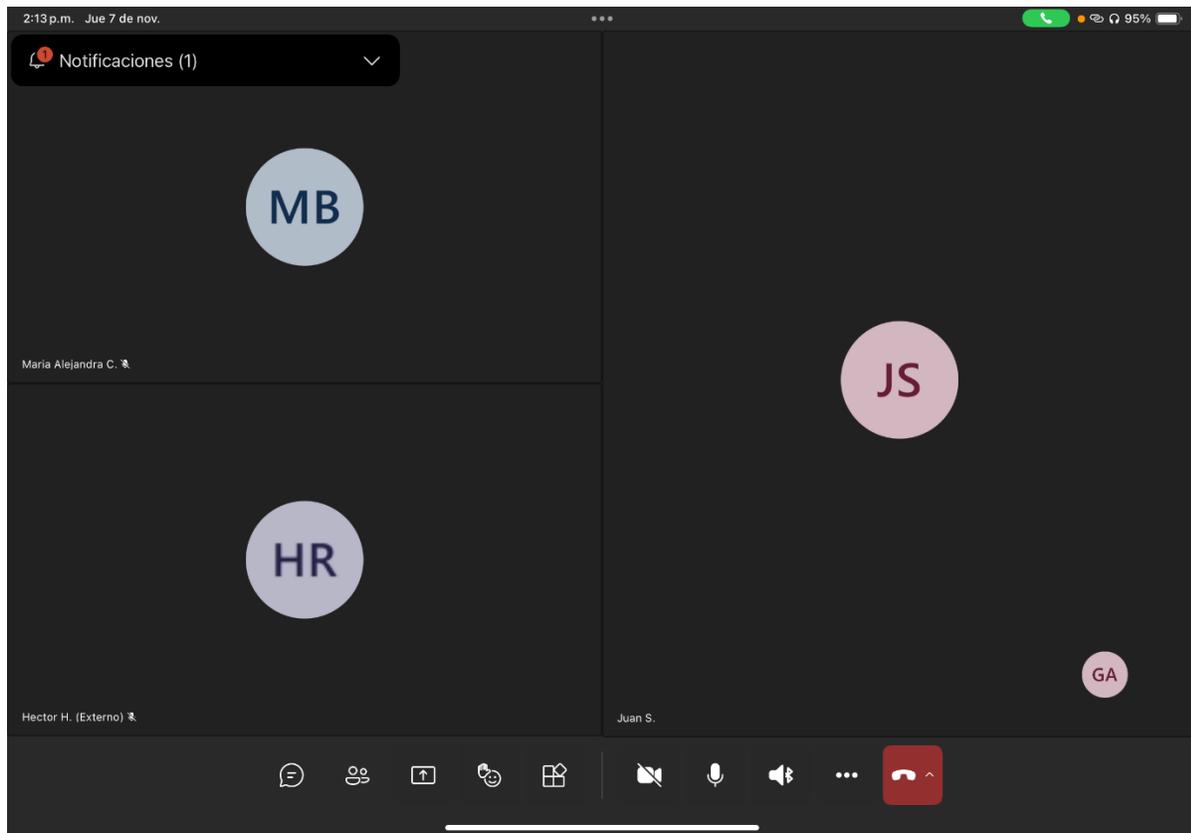

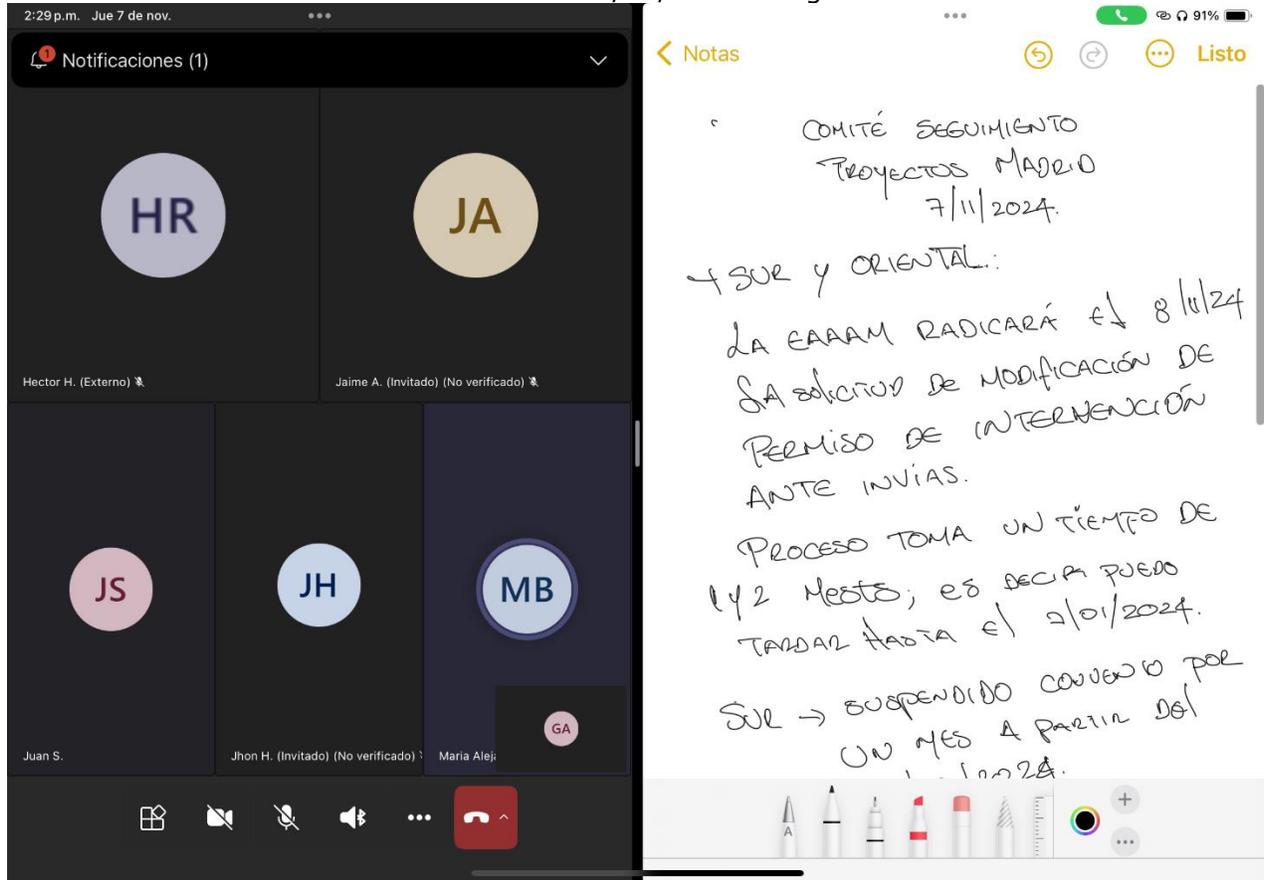

2:29 p.m. Jue 7 de nov. 91%

Notificaciones (1) < Notas Listo

HR JA

Hector H. (Externo) Jaime A. (Invitado) (No verificado)

JS JH MB

Juan S. Jhon H. (Invitado) (No verificado) Maria Aleji GA

COMITÉ SEGUIMIENTO
PROYECTOS MADRID
7/11/2024.

↳ SUR y ORIENTAL:

LA EAAAM RADICARÁ EL 8/11/24
LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE
PERMISO DE INTERVENCIÓN
ANTE INVIAS.

PROCESO TOMA UN TIEMPO DE
1 Y 2 MESES; ES DECIR PUEDE
TARDAR HASTA EL 2/01/2024.

SUR → SUSPENDIDO CONVOCADO POR
UN MES A PARTIR DEL
1/11/2024.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 25/11/2024
