



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2024 – Bogotá
HORA:	De 08:50 pm a 12:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Gillson Stheiman Mora Agudelo – Apoyo a la supervisión Convenio CUR 1085 de 2020, Madrid sur y sur oriental. Mayra Alejandra Castro – Apoyo a la supervisión proyectos Madrid Occidental y sur occidental Juan Manuel salguero – Apoyo a la supervisión EPC Jonathan Herrera – Supervisor EPC Hector Maffiu Apoyo a la Supervisión EAAM Anderson Gonzales – residente interventoría Sergio Méndez – Residente obra
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Estado de los proyectos de Madrid oriental, sur y sur oriental

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión a las 08:50 am, con saludo a los profesionales presentes.
2. La reunión empieza con solicitud del MVCT para presentación del estado de cada uno de los proyectos iniciando con los proyectos a cargo del arquitecto Gillson Mora apoyo a la supervisión del MVCT e indicando lo siguiente:

Orienta y Sur: continúan suspendidas las obras por solicitud de INVIAS ya que el permiso de intervención dado por esta entidad se encontraba para ejecutar actividades sobre la franja del andén y zonas blandas, no por el centro de la vía como se estaba ejecutando, se está buscando reunión con INVIAS para revisar la procedencia de la actualización del permiso.

EAAAM SA ESP informa que no ha radicado solicitud de modificación del permiso de intervención de vías debido a que se están adjuntando documentación solicitada por el INVIAS, se espera sea radicada el 20 de noviembre de 2024

EPC SA ESP informa que radicará al ministerio a mas tardar el 19 de noviembre la solicitud de reformulación de los proyectos de alcantarillado de Madrid Sur y Oriental; por parte del ministerio se informa que se procederá a revisar una vez esté radicada, sin embargo, es importante que para la aprobación se cuente con el permiso de intervención de INVIAS, así como el ajuste del presupuesto de ser necesario.

Para el proyecto de suroriental, la EAAAM SA ESP informa que se mantiene el compromiso de dar inicio al contrato de obra en la primera semana de diciembre y que actualmente se encuentra la EAAAM SA ESP revisando la información del nuevo contratista de obra.

Se solicita a la EAAAM SA ESP y EPC SA ESP revisar la pertinencia de la suspensión del convenio 1085 de 2020 y de ser procedente por parte de estas dos entidades radicar la solicitud con mínimo 15 días de anterioridad.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical a INVIAS solicitud de modificación de intervención de vías.	EAAAM SA ESP	25/11/2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Ajuste presupuesto de obras y documentos de reformulaciones	Contratista e interventor	30/11/2024
3	Revisión pertinencia suspensión convenio 1085 de 2020	EAAAM SA ESP y EPC SA ESP	28/11/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de la reunión

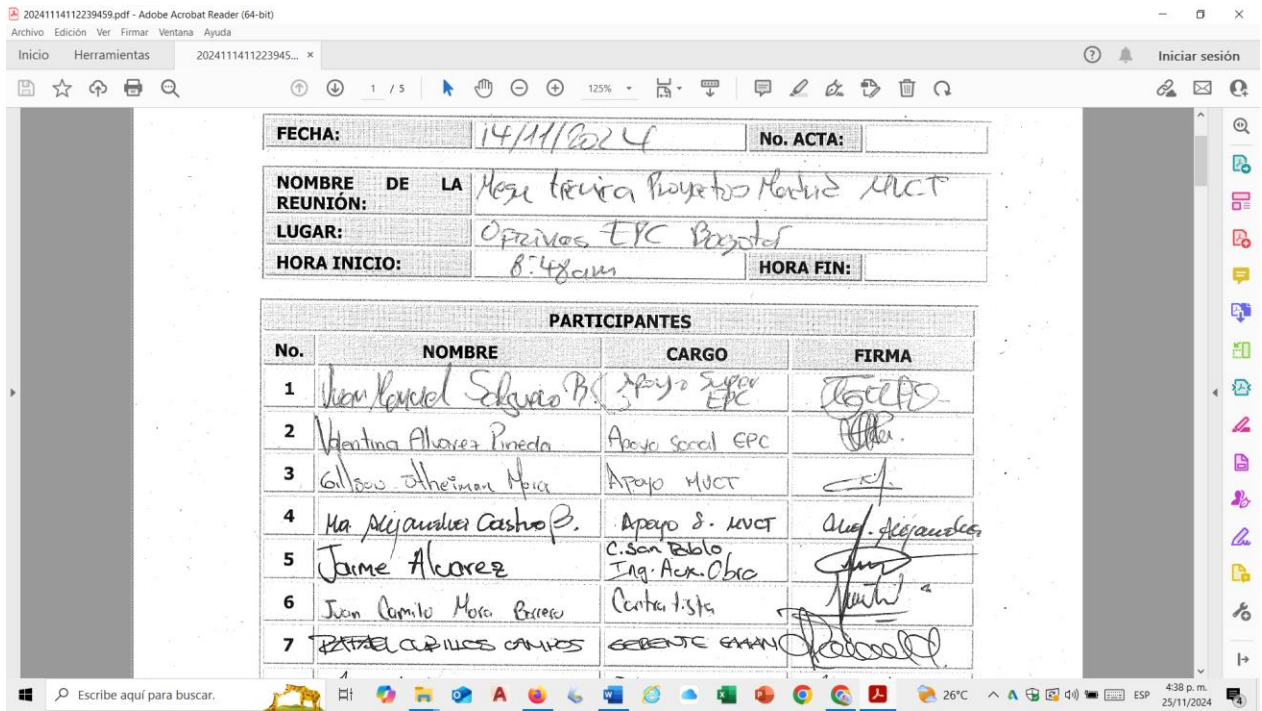

20241114112239459.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Inicio Herramientas 2024111411223945... x

FECHA: 14/11/2024 No. ACTA:

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Mesa técnica Proyecto Martini MACT

LUGAR: Oficinas EPC Bogotá

HORA INICIO: 8:48 am HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Manuel Salazar B.	Apoyo Supor EPC	[Firma]
2	Valentina Alvarez Pineda	Apoyo Social EPC	[Firma]
3	Gillson Stheiman Mora	Apoyo MUCT	[Firma]
4	Ma. Alejandra Castro P.	Apoyo S. MUCT	[Firma]
5	Jaime Alvarez	C. San Pablo Ing. Ac. Obra	[Firma]
6	Juan Camilo Mora Briceo	Contratista	[Firma]
7	RAFAEL CARLOS CAMPOS	GERENTE GENERAL	[Firma]

Escribe aquí para buscar.

438 p. m. 25/11/2024

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Stheiman Mora

Revisó:

Fecha: 25/11/2024

ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	14/11/2014	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Mesa técnica Proyecto Morán MUCT		
LUGAR:	Oficinas EPC Bogotá		
HORA INICIO:	8:48 am	HORA FIN:	

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Manuel Salgado B.	Apoyo Super EPC	[Firma]
2	Valentina Alvarez Pineda	Apoyo Social EPC	[Firma]
3	Gilberto Olheiman Mora	Apoyo MUCT	[Firma]
4	Mra Alejandra Castro B.	Apoyo S. MUCT	[Firma]
5	Jaime Alvarez	C. San Pablo Ing. Acx. Obra	[Firma]
6	Juan Camilo Mora Barrios	Contratista	[Firma]
7	RAFAEL CARILLOS CAMPOS	GERENTE EAAAH	[Firma]
8	Andrés Morales López	Interventor MLC	[Firma]
9	Juan Pablo García M.	D. Operativo A.A.	[Firma]
10	Alejo Martín Herrera Rodríguez	Apoyo Supervisión EAAAH ES	[Firma]
11			
12			
13			
14			

 epc EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:		No. ACTA:	
---------------	--	------------------	--

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Trazabilidad Sacacental - Montiel
2.	
3.	
4.	
5.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
* Ser: falta certificación de FUMAS acerca del permiso Resolución # 2974 del 2022. * Oriental: se debe velar la robustez de sus procesos del campo certificadas.

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- * Actualización Resolución Número 2974 del 2022 por parte de la EAPAM va dar en las adecuaciones técnicas del respectivo permiso, esto con el fin
- * Seraccidental: Por parte de la EAPAM falta realizar el otorgo adelantando del modificatorio del contrato suscrito. En la fecha 18/11/2024 queda publicado en el SEOP.
- * Por parte del contratista de obra va dar el 18/11/2024 la nueva programación y balance financiero y plan de chequeo. La intermentaría se demora 3 días hábiles
- * El 18/11/2024 contratista de obra inicia actividades de instalación concreto hidráulico sobre la cña 9.
- * El 21/11/2024 visita de verificación en campo
- * El 20/11/2024 intermentaría radica a la EAPAM la nueva programación, plan de chequeo y balance financiero.

FECHA:

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Mano de obra: esta en proceso de adjudicación, el 15/11/2024 queda publicando.

Serviciotel: 20/11/2024 queda aprobada la cosen el nuevo contrato, para continuar con el perfeccionamiento del contrato.

 epc EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:		No. ACTA:	
---------------	--	------------------	--

COMPROMISOS			
	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Compromisos descritos en el Acta		
2.			
3.			
4.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Jean Subiano	NOMBRE:	Ma. Alejandra / CAJ
CARGO:	Apoyo Sup. EPC	CARGO:	Apoyo Sup. MVCT / Apoyo MVCT
FIRMA:		FIRMA:	 
