



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de octubre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 2:45 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión Rubén Ely- Jefe Área TécnicaMVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión del convenio Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento al proyecto Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
2. Gestiones por tramitar
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realiza reunión virtual de seguimiento al avance del proyectos.

Desde el PDA, se realiza presentación del estado actual del proyecto, resaltando los siguientes datos relevantes:

- ✓ Fecha Terminación Convenio 08 de marzo de 2024.

CONTRATOS DERIVADOS

- ✓ Contrato de Obra AQLATAM-ACU-002-2021, Fecha de Terminación: 16 de febrero de 2025.
- ✓ Contrato de Interventoría AQLATAM-ACU-004-2021, Fecha de Terminación: 16 de febrero de 2025.
- ✓ Avance Físico a 30/09/2024: 51.67% vs Avance programado 51.28%



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Frente a los desafíos y temas pendientes, desde el PDA se informa que uno de estos era el permiso de intervención en el colegio El Progreso, sector empedrado, no obstante, las actividades en este sector ya fueron realizadas y el contratista a la fecha se encuentra en la limpieza del área intervenida.

Por otra parte, se informa que en el aplicativo SIGEVAS se encuentran reportados todos los informes mensuales de Interventoría, así como todos los actos administrativos asociados a los contratos derivados. Desde el Ministerio se solicita cargar los informes de supervisión del ejecutor.

2 Gestiones por tramitar

En cuanto al permiso de intervención en el predio de captación, desde el PDA se informa que el terreno se encuentra inundado, sin embargo es necesario contar con la servidumbre para la fecha en que se pueda hacer la intervención. Desde el Ministerio se indica que es necesario se cuente con todas las gestiones previas asociadas para realizar la intervención, de modo que un vez en terreno se den las condiciones adecuadas se proceda con la intervención de manera efectiva.


3 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar Informes mensuales de Supervisión del ejecutor	PDA	
2	Informar avance gestiones frente al predio donde se realizarán intervenciones de captación.	PDA	

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

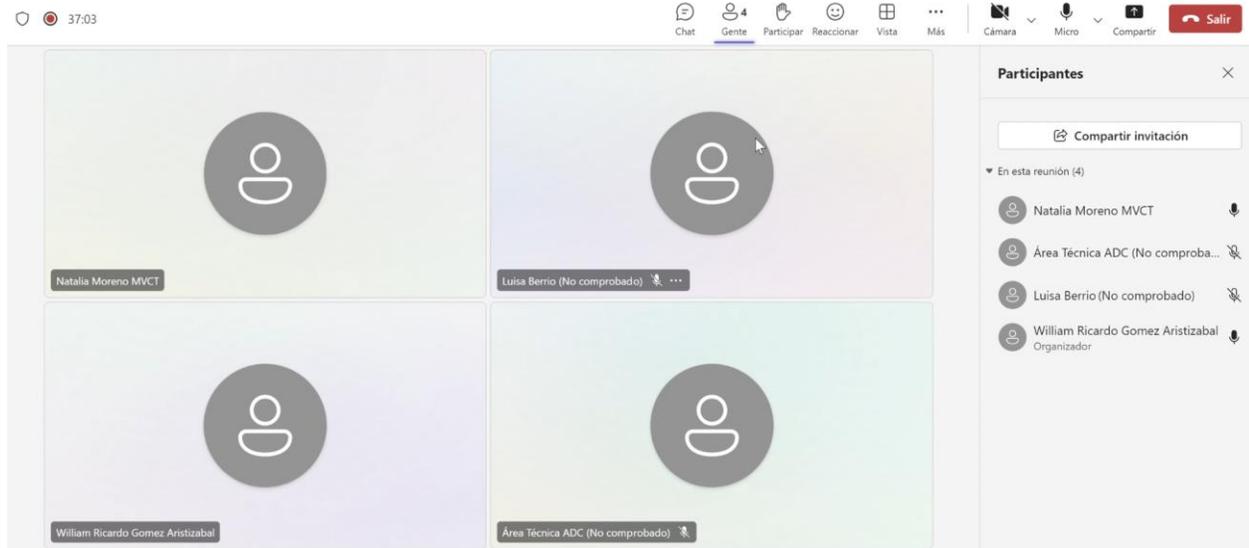

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 03 de octubre de 2024
