



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6 NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de noviembre de 2024.
HORA:	3 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

Ingeniera María Ruiz de Piedecuestana informa que se tiene un avance de 54,57 % contra un 54,15 % de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses e informe semanal 24 del 3 de noviembre de 2024.

El contratista solicito ampliación en tiempo con una prórroga de 4 meses, la cual fue aprobada con nueva fecha de terminación del 16 de febrero del 2025.

Los bajos rendimientos se deben a la topografía del terreno para el acceso y la realización de excavaciones, instalación de tubería, rellenos en un mismo día.

Adicionalmente se presentan problemas con el suministro de accesorios. Se busco un tercer proveedor lo cual no ha sido viable por tiempo de suministro y costo.

El Ministerio informa que, se recibió solicitud de otrosi No. 2 de ampliación en tiempo del convenio 1371-2023 que vence el 31 de diciembre de 2024, por parte de Piedecuestana por 6 meses hasta el 30 de junio de 2025, teniendo en cuenta la prórroga de los contratos derivados por 4 meses, se tiene nueva fecha de terminación del proyecto el 16 de febrero de 2025.

El Ministerio programa visita técnica de obra para el 20 de noviembre de 2024.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La ingeniera María solicita la presencia del social en la reunión del 20 de octubre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Visita técnica	MVCT, Contratista Obra e Interventoría, Piedecuestana, Municipio	20-11-2024
2	tramite prorroga al convenio 1371-2023	MVCT- Piedecuestana	30-11-2024
3	Cumplir con las reuniones de veeduría Ciudadana	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	30-11-2024
4	Actualización del sigevas	Piedecuestana	15-11-2024

FIRMAS:

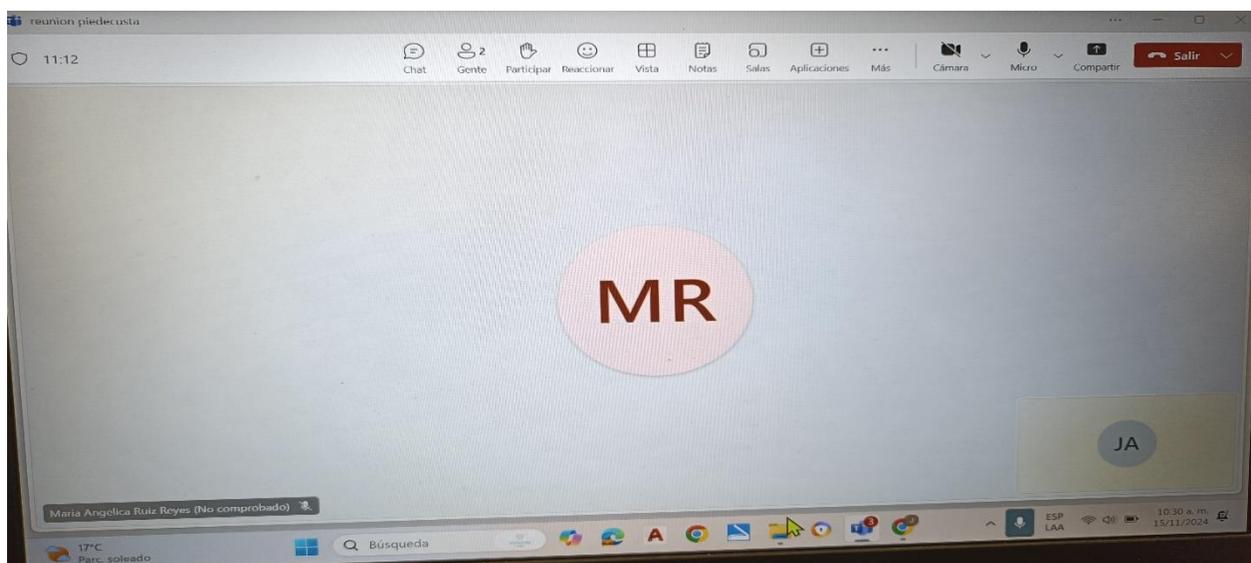



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 15-11-24
