



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 35

DATOS GENERALES

FECHA:	5 de noviembre de 2024
HORA:	De 4:30 a.m. a 5:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual de seguimiento.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Dalgi Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis
	Nicolas Toro, Apoyo supervisión, GSP Antioquia Jairo Gómez Riaño Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

ORDEN DEL DIA:

CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Revisión de documentación solicitud de prórroga del convenio.

La reunión de seguimiento y control al convenio contó con la participación de la administración municipal de Támesis, la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia y el MVCT.

El municipio de Támesis inicio la reunión manifestando que se ha avanzado en la solicitud de suspensión del convenio habida cuenta que su plazo vence en un mes, por lo que se radicará el próximo viernes 8 de noviembre de 2024 incluyendo los soportes solicitados por el Ministerio en correo electrónico del 28 de octubre de 2024.

El Ministerio informó que se consultó a los especialistas sobre las observaciones hidráulicas y presupuestales las cuales se remitirán al Municipio a mas tardar el 8 de noviembre de 2024 al municipio de Támesis para su aclaración y ajuste de la documentación presentada. Agregó el Ministerio que entre las observaciones de fondo se encuentra el cumplimiento del interventor en firmar la totalidad de productos de la consultoría, actualización del permiso de vertimientos de los adicionales, memorias estructurales de los pasos elevados, planos deben complementarse con cotas, diámetros, longitudes y presupuestales cotizaciones entre otras.


Dado lo anterior el municipio remitirá al consultor las observaciones para evaluar el tipo que se requiere para subsanarlas.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remisión observaciones de especialistas	MVCT	5/11/2024
2	Radicar documentación con vigencia de noviembre 2024, para solicitar suspensión del convenio 1137 de 2020.	Mpio Támesis GSP Antioquia	8/11/2024
3	Reunión virtual de seguimiento al convenio	MVCT-	20 /11/2024

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 5 de noviembre de 2024.

ASISTENCIA

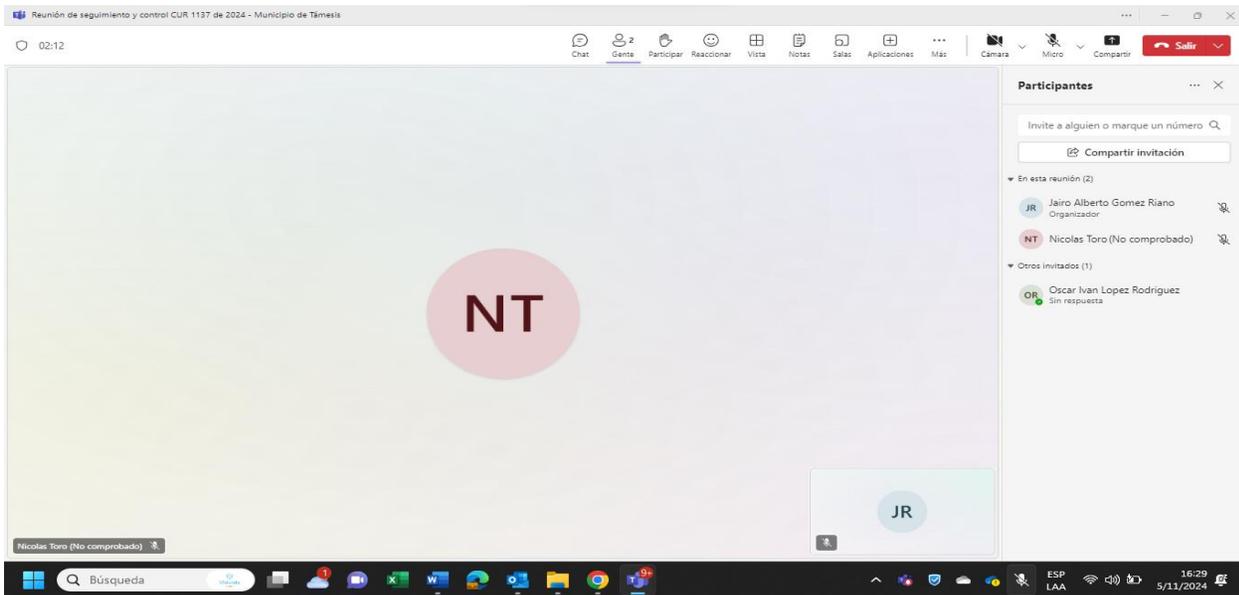

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Reunión de seguimiento y control CUR 1137 de 2024 - Municipio de Tamésis

39:28

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

NT Nicolás Toro (No comprobado)

JR

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador

DL Dalgy Liliana (No comprobado)

NT Nicolas Toro (No comprobado)

Otros invitados (1)

OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

ALCALDIA

Documentos > COMUNICACIONES 2024 - 2027 > ALCALDIA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
20.Factura Permisos sistema de evaluación intersectorial Talsubana	20/03/2024 09:53	Documento de M...	131 KB
21.DIAMAN - Solicitud ayuda	9/9/2024 16:16	Documento de M...	5,174 KB
21.INDEPORTES - Falsificación de proyecto	13/9/2024 16:58	Documento de M...	131 KB
21.INDEPORTES - Compromiso de cofinanciación	13/9/2024 17:11	Documento de M...	131 KB
21.DIAMAN - Reporte evento y solicitud ayuda	25/9/2024 16:11	Documento de M...	132 KB
21.VIVA - Compromiso de cofinanciación implemente de vivienda	21/9/2024 10:27	Documento de M...	132 KB
21.VIVA - Manifestación de interés implementación de vivienda (complejo)	21/9/2024 16:02	Documento de M...	132 KB
21.VIVA - Manifestación de interés implementación de vivienda	21/9/2024 19:31	Documento de M...	132 KB
21.VIVA - Certificado de aprobación presupuestal	21/9/2024 15:51	Documento de M...	132 KB
21.VIVA - Certificación de recepción del OI de mayo	28/9/2024 14:29	Documento de M...	135 KB
21.Promoción Provincial - Respuesta Memorando No. 17	30/9/2024 13:44	Documento de M...	134 KB
21 - Daban - Chequeo - Respuesta sobre placa huella	4/10/2024 10:28	Documento de M...	132 KB
21 - DDP - Respuesta sobre manejo regular proyecto parque principal	30/9/2024 13:43	Documento de M...	133 KB
21_SF - Presentación proyecto placa huella	16/10/2024 16:42	Documento de M...	130 KB
21_Centraviva - Respuesta oficio 2024023244 (Compañía deportiva)	18/10/2024 06:07	Documento de M...	134 KB
21 - Hacienda - Autorización para contrato fletes	18/10/2024 16:57	Documento de M...	132 KB
21_Supervivencia - Respuesta 20240201001 - 2024030802108	18/10/2024 09:07	Documento de M...	136 KB
21_SF - Solicitud permisos No. 8 suspensión No. 1 Convenio 4000512001	24/10/2024 09:09	Documento de M...	139 KB
21_SF - Certificado de aprobación presupuestal (iguatá)	26/10/2024 17:02	Documento de M...	132 KB
21_SF - Carta manifestación de interés-gobernación parque Santa Ana (2)	15/10/2024 16:11	Documento de M...	131 KB
21_Movimiento - Solicitud de reformulación parcial del proyecto (iguatá)	5/9/2024 08:31	Documento de M...	203 KB
21_Gerencia de Servicios Públicos del Departamento - Manifestación de interés parque	9/9/2024 16:36	Documento de M...	132 KB
21_Valledupar - Solicitud permiso No. 8 suspensión No. 1	9/9/2024 12:16	Documento de M...	131 KB
21_SF - Carta manifestación de interés-gobernación Ricota	18/9/2024 17:08	Documento de M...	135 KB
21_SF - Carta manifestación de interés-gobernación Ricota	18/9/2024 16:38	PDF Document	197 KB
21_Corona Espal de Calabozo - Manifestación de interés placa huella Santa Teresa	9/10/2024 14:40	Documento de M...	133 KB
21_Movimiento del sector - Solicitud permisos convenio 7607	18/10/2024 17:58	Documento de M...	134 KB
21_Movimiento - Solicitud permisos convenio	3/10/2024 9:34	Documento de M...	138 KB
21_SF - Respuesta oficio 20240400481	2/10/2024 11:18	PDF Document	1,173 KB
21_SF - Promoción Provincial - Respuesta oficio No. 5201 de 2024	2/10/2024 11:18	PDF Document	2,072 KB

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
 Calle 17 No. 9-36 Bogotá, Colombia
 correspondencia@minvivienda.gov.co Bogotá D.C.

Referencia: Convenio interadministrativo de uso de recursos 1137 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el municipio de Tamésis y la Gerencia de Servicios Públicos del departamento de Antioquia

Asunto: Solicitud permisos convenio

Condiel Saludo,

La Administración Municipal de Tamésis (Act) solicita formalmente permisos por el término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la terminación del plazo actual para el convenio interadministrativo de uso de recursos No. 1137 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio -Nomenclatura de Agua y Saneamiento Básico, el Municipio de Tamésis y la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, cuyo objeto es Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMÉSIS - ANTIIOQUIA"

La solicitud se realiza con fundamento en lo siguiente:

- Una vez superadas todas las etapas precontractuales, por parte de la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento, tanto del contrato de obra como el de interventoría, se procedió a realizar la firma del acta de inicio de obras el contrato el 17 de enero de 2022 con lo cual se inició la ejecución de las obras del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMÉSIS - ANTIIOQUIA.
- Para el 10 de febrero de 2022 y dentro de las labores de localización y replanteo propias del proyecto, los contratistas de obra e interventoría le notificaron a la Gerencia de Servicios Públicos sobre varias fallas en los diseños entregados por el Municipio para la ejecución de las obras.
- Razón por la cual la Gerencia de Servicios Públicos notificó al municipio, como responsable de los diseños, y se dio inicio a varias reuniones con el consultor inicial de los diseños (el cual fue contratado por la empresa de servicios públicos del municipio de Tamésis, a través de convenio interadministrativo entre el Municipio y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio), las cuales fueron precedidas por el municipio.
- Durante los meses de febrero, marzo y abril el consultor inicial de los diseños realizó ajustes, pero no logró realizarlos a la velocidad necesaria que garantizara el desarrollo armónico de las obras, por tal razón la Gerencia de Servicios Públicos solicitó al municipio de Tamésis un cronograma de entrega de la revisión y ajustes necesarios. Dicho cronograma fue entregado por el municipio y en él se estableció como fecha de entrega el 8 de junio de 2022.
- El 8 de junio de 2022 el municipio hizo entrega de los ajustes de acuerdo con los compromisos, pero al realizar la revisión se le entregó la interventoría evidenciando que no correspondía a la información solicitada y nuevamente se incurrió con la entrega necesaria para avanzar en las obras, sin embargo, estos ajustes no fueron los esperados, por lo que el Municipio de Tamésis se dio a la tarea de contratar un nuevo consultor para realizar los ajustes necesarios. Dicha contratación se

Reunión de seguimiento y control CUR 1137 de 2024 - Municipio de Tamésis

04:31

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador

DL Dalgy Liliana (No comprobado)

NT Nicolas Toro (No comprobado)

Otros invitados (1)

OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

JR

NT

Jairo Alberto Gomez Riano

Nicolas Toro (No comprobado)

DL

Dalgy Liliana (No comprobado)
