



# Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 36

### DATOS GENERALES

FECHA:	22-25 de noviembre de 2024
HORA:	De 4:30 a.m. a 5:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual de seguimiento.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo Dalgi Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis Leidy Marcela Carmona, Supervisora GSP Antioquia. Jairo Gómez Riaño, Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Nicolas Toro, Apoyo supervisión, GSP Antioquia

### ORDEN DEL DIA:

**CONVENIO 1137 DE 2020:** Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

**OBJETO:** Seguimiento del avance subsanación de observaciones soportes documentales de la solicitud de la Reformulación no. 3, del proyecto por parte del Municipio de Támesis.

La reunión de seguimiento y control al convenio contó con la participación de la administración municipal de Támesis, la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia (GSP de Antioquia) y el MVCT.

El Ministerio informó que se radicó la solicitud de suspensión en el Grupo de Contratos del MVCT el 20 de noviembre de 2024, por dos meses hasta el 2 de febrero de 2025, tiempo en el cual se debe cumplir por parte de las entidades las siguientes actividades:

- **30 de noviembre de 2024:** Entrega de la totalidad de las observaciones de los especialistas del MVCT a los soportes de la solicitud la Reformulación No. 3 del proyecto por parte del consultor de diseños al Municipio de Támesis.
- **3 de diciembre de 2024:** Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la subsanación de las observaciones. (8 a.m.) con la participación del consultor.
- **5 de diciembre de 2024:** Radicación de solicitud de Reformulación No. 3 por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT.
- **13 de diciembre de 2024:** Presentación de la reformulación la Comité técnico del VASB-MVCT.
- **16 de diciembre de 2024:** Radicación de la solicitud de prórroga del convenio CUR-1137 de 2020, por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT. Por 17 meses (contratación 2 y 15 ejecución de obra)

- **13 de enero de 2025:** Remisión por parte del MVCT al municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT, del oficio de aprobación de la Reformulación No. 3 del proyecto.
- **4 de febrero de 2025:** Reinicio del Convenio hasta el 4 de junio de 2026.

Dado lo anterior el Ministerio solicitó al municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT, actualizar el plan de acción con estas fechas y complementarlo con las actividades relevantes y de control que consideren necesarias, para su seguimiento con el fin de tomar las medidas oportunas en caso de presentarse alguna situación que altere lo aquí programado.

El Municipio de Támesis informó que el consultor hidráulico se encontraba aclarando cada una de las observaciones solicitadas y se tiene lo siguiente:

- Revisión de planos alcantarillado en planta incluyendo cotas, diámetros, longitudes, localización de vertimientos.
- Se localizaron los dos pasos elevados y se está en el desarrollo de la consolidación de las memorias geotécnicas de cimentación, estructurales y de localización.
- Se están actualizando los permisos de ocupación de cauce y de vertimientos con la autoridad ambiental.
- En lo que tiene que ver con el presupuesto se está complementando la información relacionada con las cotizaciones y se está pendiente de datos del consultor sobre algunas estructuras.
- Tiempos con la Corantioquia son no determinados por lo que se hará el radicado de las solicitudes a esta entidad.

El Ministerio sugirió que para dar celeridad al proceso de subsanación de observaciones se remitan por parte del municipio de Támesis las observaciones que ya hayan sido aclaradas o resueltas con el fin de revisarlas y remitirlas a los especialistas para obtener el visto bueno.

## COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entrega de observaciones del consultor al Municipio de Támesis	Mpio Támesis	30/11/2024
2	Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la subsanación de las observaciones.	Mpio Támesis GSP Antioquia MVCT	2/12/2024

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
3	Radicación de solicitud de Reformulación No. 3 por parte del municipio de Támesis y la GSP de Antioquia la MVCT	Mpio Támesis GSP Antioquia	5/12/2024
4	Presentación de la reformulación la Comité técnico del VASB-MVCT.	MVCT	13/12/2024
5	Radicación solicitud prórroga convenio CUR-1137 de 2020,	Mpio Támesis GSP Antioquia	15/12/2024
6	Remisión oficio aprobación Reformulación No. 3 del proyecto, a las entidades	MVCT	13/01/2025
7	Reinicio del Convenio del 2 de febrero del 2025 hasta el 4 de junio de 2026	Mpio Támesis GSP Antioquia MVCT	4/2/2025

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
 Fecha: 22-25 de noviembre de 2024.

## ASISTENCIA



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

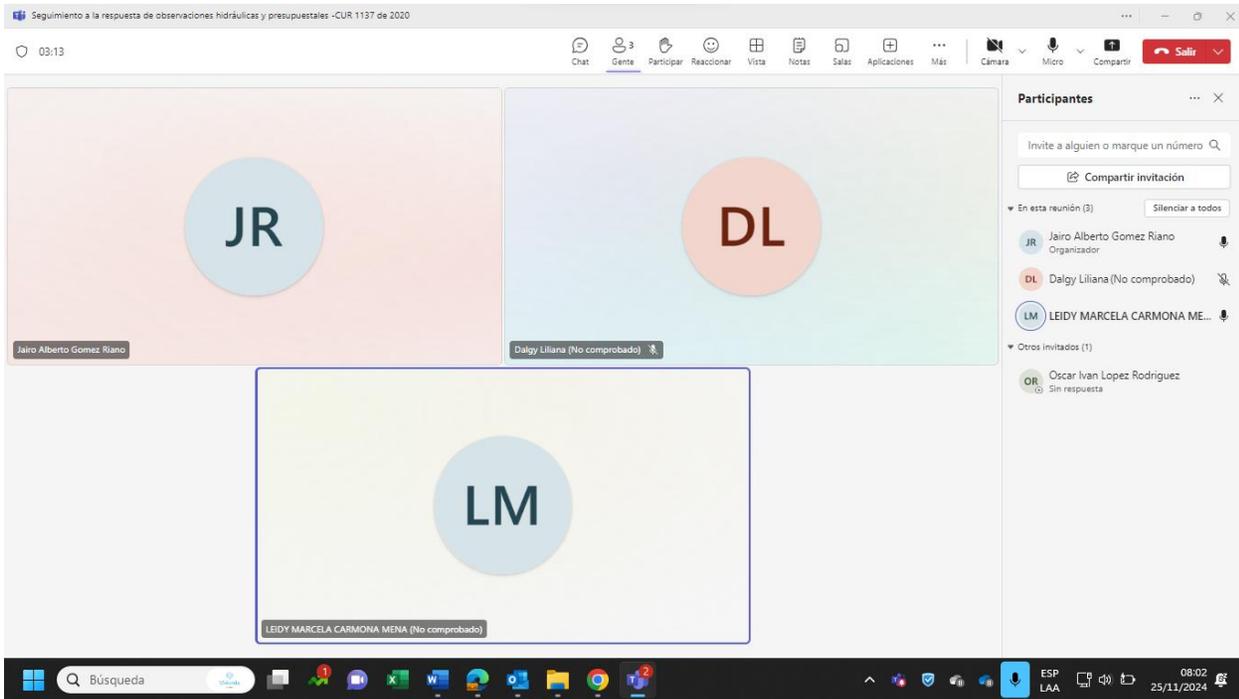

03:13


Seguimiento a la respuesta de observaciones hidráulicas y presupuestales -CUR 1137 de 2020

Participantes

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- DL Dalgy Liliana (No comprobado)
- LM LEIDY MARCELA CARMONA ME...

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta



26:21

Seguimiento a la respuesta de observaciones hidráulicas y presupuestales -CUR 1137 de 2020

Participantes

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- DL Dalgy Liliana (No comprobado)
- LM LEIDY MARCELA CARMONA ME...

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
