

## ACTA MESA DE SEGUIMIENTO.

### DATOS GENERALES

FECHA:	Yarumal, Antioquia, 4 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual

### ORDEN DEL DIA:

1. Temas.
2. Compromisos.


### DESARROLLO:

En atención al comité realizado el día 4 de diciembre de 2024 el apoyo a la supervisión asistió a mesa de seguimiento en las instalaciones de Findeter en la cual se trataron los siguientes temas y se pactaron los siguientes compromisos los cuales son:

Se presenta por parte de los contratistas la situación actual de la revisión de los estudios y diseños una vez revisados y los cuales presentan observaciones que aún no han sido subsanadas por parte del Municipio.

Findeter por ser el ejecutor del Convenio acepta la propuesta del contratista y la Interventoría de terminar los estudios y diseños a su propio costo dado que el municipio actualmente no ha entregado las observaciones completamente subsanadas de acuerdo a la revisión realizada por parte del contratista y la interventoría.

Por otro lado se propone por parte del contratista y la Interventoría dar inicio a las obras dado que se puede iniciar con la instalación de tubería de 14 pulgadas en una longitud de aproximada de 5.600 ml lo cual se programa en un plazo de seis (6) mese como se presenta en la siguiente imagen:

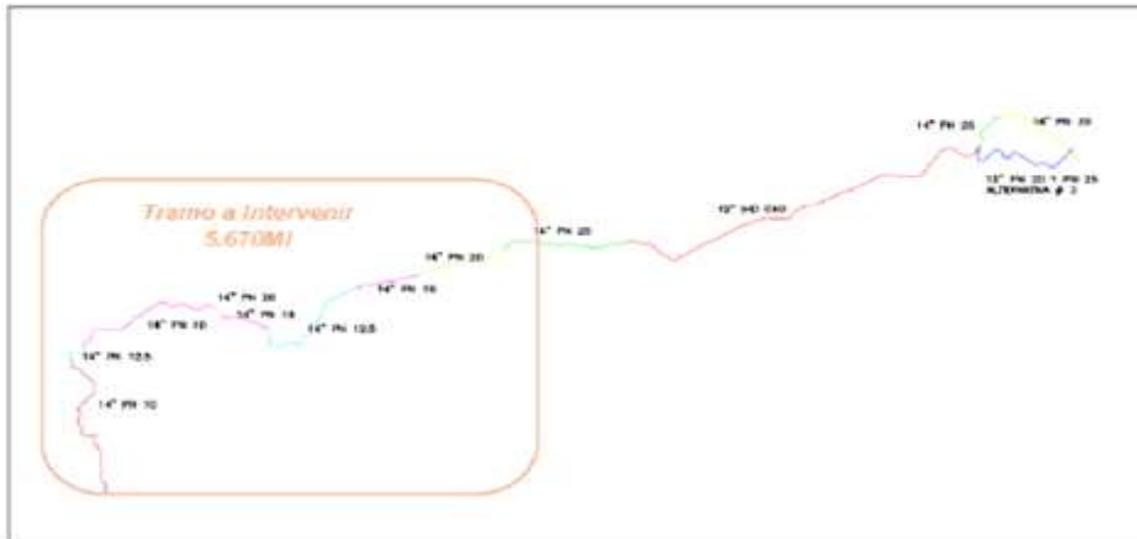

2. Revisión de compromisos.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entregar diseños ajustados por parte del contratista y la Interventoría.	Findeter, Municipio, Contratista, Interventoría.	17/01/2025	Entrega de estudios y diseños subsanados.
2	Iniciar obras el día 6 de enero de 2025	Findeter, Contratista, Interventoría y municipio	01/02/2025	Inicio de obras.
3	Entrega de reformulación de proyecto.	Findeter, Contratista, Interventoría y municipio	21-03-2025	Aprobación comité técnico reformulación.

Se anexa listado de asistencia a la mesa de trabajo.

**FIRMA:**



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM  
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.  
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.  
Fecha: 04-12-2024.

## LISTA DE ASISTENCIA- ASISTENCIA TÉCNICA

Código: GES-FO-121  
 Versión: 1  
 Fecha de Aprobación: 29-May-2023  
 Clasificación: Público

MODALIDAD: Capacitación:  Reunión:  Evento:  Campaña:

FECHA: Día 07 Mes 12 Año 2024  
 Hora Inicial: 12:00 PM  
 Hora Final:                     

TEMA:

Reunión seguimiento Proyecto Terminal Antioquica.

NOMBRES Y APELLIDOS (Completo)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Luis Eduardo García Chaves	75541592	Supervisor MCT	INDUSTRIAS	3133959250	lgarcia@industrias.com	
Esteban Olivares	79561493	Protección	Findeter	3153391934	coliveros@findeter.gov.co	
Diego Lora	80.0999905	Abogado	Industrias	3173644890	diegolora@industrias.com	
Roberto Russi	7422580	Ingeniero	UT ANCV	3147462749	prussi@vinasrussi.com	
Andrés Saez	79624572	Director	UT ANCV	3155356252	ansaez@guilera.com	
John F. Quintana	7.550522	Director Obras	UT ANCV	3106339664	johnfq@binari.com	
Edgar E. Espinosa S.	191432763	Director ZMT	E.I. SAS	3108207309	edgarespa@serenitas@gmail.com	
Jairo Rango Esquivel	72.274662	Jefe de Mantenimiento	Findeter	3172532103	jarango@findeter.gov.co	
Julián Steven Herrera A	1037645768	Gerente General	Aguas del Llano	3216288069	gerencia@aguasdelllano.gov.co	
Valentina Mayo Alvarado	115246416	Coord Ambiental	Agua del Norte	3219363804	gerencia@aguadelnorte.gov.co	
John F. López	10240101	Director Operativo	Agua del Norte	3208365599	directoroperativo@aguadelnorte.gov.co	
Samuel Andrés Sotillo	1042156414	Sec. Infraestructura	Agua del Norte	3104351603	infraestructura@aguadelnorte.gov.co	
Henry Andrés Gaitán						
Yomira Almona	1126906274	Supervisión	Findeter	3232215126	Xadrianaa@findeter.gov.co	
Andrés Sebastián	85932133	Sección	Findeter	3208198635	vergara@findeter.gov.co	
