



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 18 – MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 31 de Marzo 2025
HORA:	1:00 p.m. a 1:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La Esant informó que se realizara reunión con el Contratista el miércoles 26 de marzo de 2025, informando que solicitan actualización de precios porque el proceso es del 2019.

El Municipio entrego la información de servidumbres a la ESANT.

La Esant revisa la información de servidumbres y se enviara al MVCT el 1 de abril de 2025.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El Municipio firmo acta de entrega y funcionalidad al Municipio con fecha 10 de marzo de 2025 y se remite al MVCT el 31 de marzo de 2025. Se inicia tramite acta de liquidación para finales de abril de 2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

El 14 de marzo de 2025 se realizó reunión con la contraloría, se informo que se debe realizar la pavimentación entre el 2 de marzo de 2025 al 2 de abril de 2025

La Esant informa que, se tiene un avance del 76,90% contra un programado del 86,45%, con informe al 15 de marzo de 2025 y avance financiero del 72,96% con pendiente de pago acta 35.

La fecha de terminación del 24 de agosto de 2025 no se va a cumplir por problemas sociales, la comunidad no deja avanzar hasta que se pavimente L= 184 ml que se demora aproximadamente un mes.

En el periodo reportado se trabaja en los siguientes frentes de obra

- Carrera 4 entre calles 10 y 11
- Carrera 6 entre calles 6 y 7a.

Se informa por la CGR que programara reunión de seguimiento con la comunidad, el MVCT, Esant, contratistas de Obra e Interventoría.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El Ministerio informa:

Que el 27 de marzo de 2025 se realizó reunión solicitada por alcalde de Girón, quien indico que está interesado en el proyecto ya que tiene 75l/s para Girón. Que no tiene recursos para aportar pero que el proyecto beneficiara a 14.000 usuarios de GIRON que facturara el AMB y adicionalmente tiene áreas de expansión para 30.000 usuarios nuevos.

Para el 27 de marzo de 2025 se realizó reunión con Findeter, AMB, Municipio, el AMB se encuentra en revisión de la consultoría entregada para evaluar los recursos a aportar.

Findeter informa que la empresa consultora shafic va a Presentar propuesta de cambio se sitio de la estación de bombeo y nuevo trazado de tramo de tubería con un ahorro significativo.

Se programa reunión para el martes 1 de abril a las 2p.m de socialización de la nueva propuesta.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

El 31 de marzo se realizó reunión de seguimiento por la Contraloría, se informó que la reformulación No. 1 fue aprobada en comité 03 del 28 de febrero de 2025 y que el Ministerio se encuentra en trámite de firmas del oficio de aprobación para ser remitido a la Esant y Municipio.

La Esant informa que se reunió con el contratista para que comience con el alistamiento pertinente al reinicio de la obra teniendo en cuenta la aprobación de la reformulación No. 1.

La Esant se encuentra en trámites administrativos concernientes a ajuste de contratos de obra e Interventoría de acuerdo con reformulación No. 1 aprobada por el MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío información predial al MVCT, correspondiente a reformulación No. 3 Vélez guayabos	Esant	01-4-2025
2	Se envía al MVCT acta de entrega y funcionalidad al Municipio del Socorro.	Esant	31-3-2025.
3	Reunión Lebrija.	MVCT-Findeter-Municipio-contratista obra e Interventoría	01-4-2025 a las 2:00 p.m.




Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

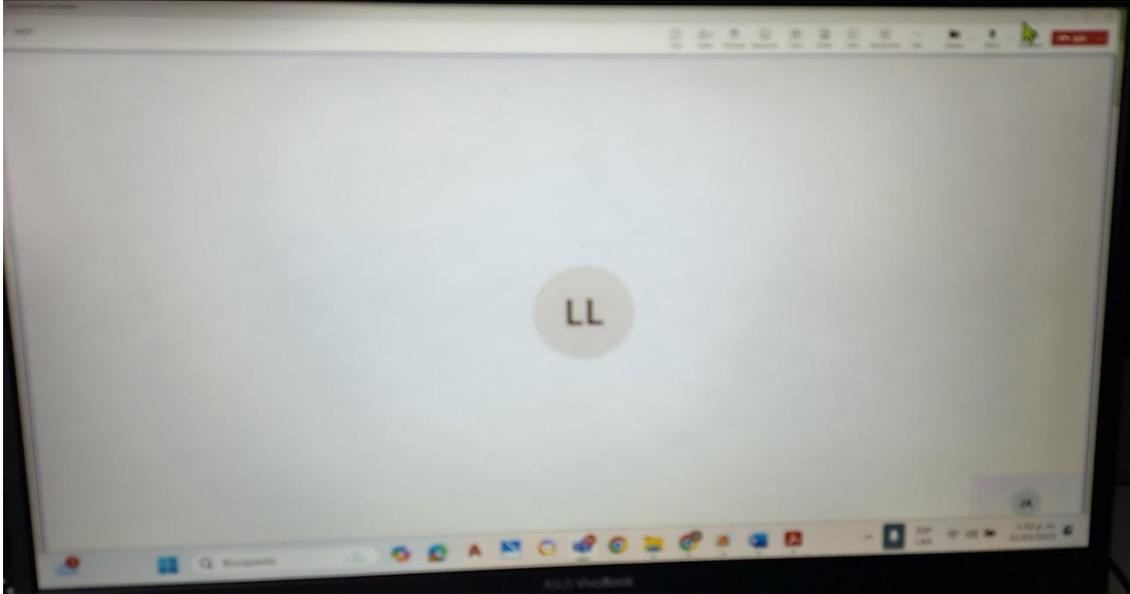

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 31-3-25
