



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 19 - MARZO 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 31 de MARZO de 2025.
HORA:	11:30 p.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

Ingeniera María Angelica Ruiz de Piedecuestana informa:

1.. El proyecto entro en suspensión el 11 de febrero de 2025 hasta el 11 de abril de 2025 por 2 meses, por tramite de reformulación No.1 de acuerdo con lo siguiente:

El contratista de obra entrega informe de reformulación No. 1 a Piedecuestana para hacer solícito de CDP, Piedecuestana inicio con estudio de necesidad para presentar a la gerencia para hacer solicitud de CDP, se tiene programado entregar CDP el 4 de abril de 2025.

La Interventoría dio aval el 26 de marzo de 2025 de la documentación de reformulación No. 1 y se remite a Piedecuestana que lo devolvió con observaciones.

El Ministerio solicita último informe de Interventoría del 16 de diciembre al 16 enero de 2025. Piedecuesta lo envía el 31 de marzo de 2024.

Con informe de Interventoría 38 del 3 al 9 de febrero de 2025 al 9 de febrero de 2025, se tiene un avance de 87,20 % contra un programado del 92,09% de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses adicionales.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Piedecuestana está en trámite del oficio de aprobación por parte del consultor de la en la reformulación No.1.

Se realiza reunión de seguimiento reformulación No. 1 el miércoles 2 de abril a las 11.00 a.m.

2. CONTRUCCION OPTIMIZACION ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL CRA 16 Y 19 CLL 3ª Y 5d MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

El viernes 21 de marzo de 2025, se realizó junta directiva por medio del cual se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos de Piedecuestana de la vigencia fiscal del 1 enero al 31 de diciembre de 2025-adición de recursos de convenio, se encuentra en firma del alcalde el acto administrativo.

Para poder solicitar rubro para solicitar CDP. Tiempo estimado 15 días.

Piedecuestana envía al Ministerio estudio de necesidad el 1 de abril de 2025.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1 acueducto	Contratista Obra, Interventoría, Piedecuesta	15-4-2025
2	Informe de Interventoría hasta el 16 de enero de 2025 acueducto	Piedecuestana	31-3-2025
3	Terminación del proyecto acueducto	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	2-4-2025
4	Reunión de seguimiento ref.1 acueducto	Piedecuestana-MCVT	2-4-2025
5	Envío estudio de necesidad alcantarillado al MVCT	Piedecuestana	1 de abril de 2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

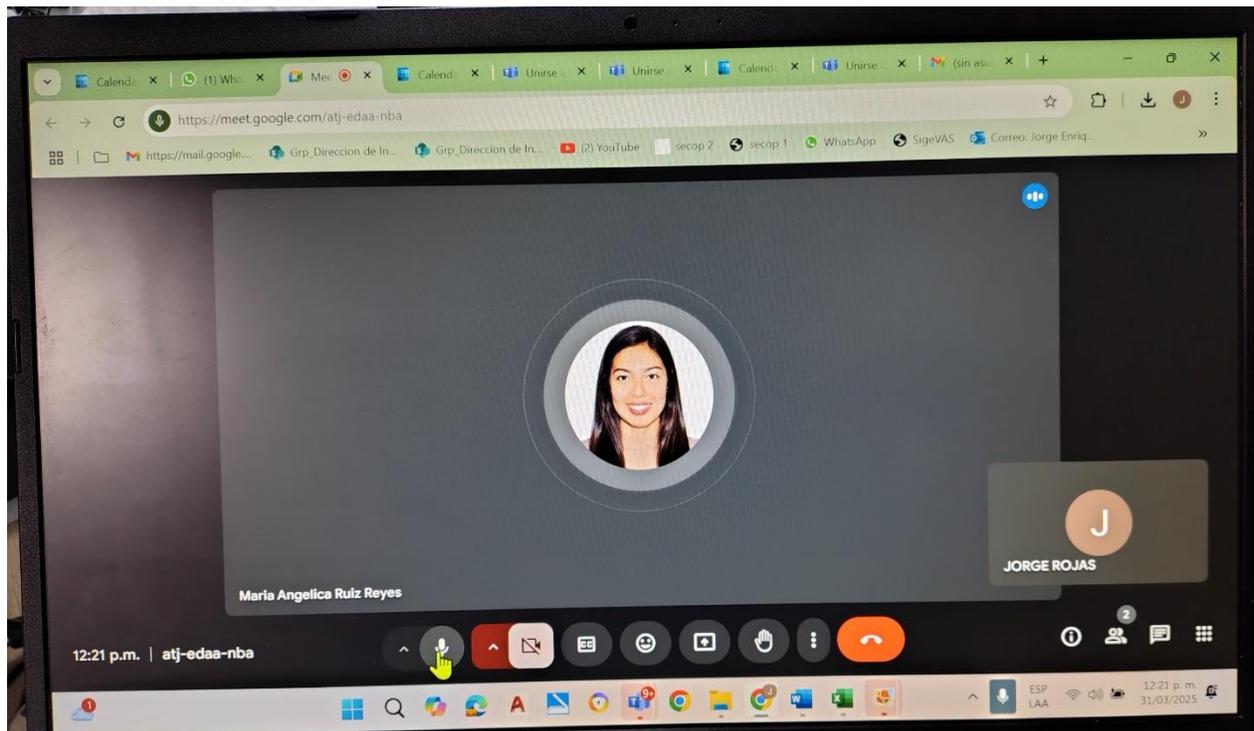

Anexos: (Opcional)
Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 31-3-25
