



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 27 de marzo de 2025

DATOS GENERALES:

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO". CUR 1328-2023.

FECHA:	27 de marzo de 2025
HORA:	De 10:30 pm a 11:00 am
LUGAR:	Reunión virtual a través de Microsoft Teams
ASISTENTES:	- Pedro José León Díaz – Apoyo a la supervisión para los proyectos del Departamento de Nariño – MVCT - Jorge Caicedo Santander – Subgerente Técnico Empopasto S.A. ESP - José Rosales Enríquez – Director de diseño y D. U. Empopasto S.A. ESP - Elizabeth Cuaspud – Contratista área de diseño Empopasto S.A. ESP - Javier Chávez – apoyo a la supervisión Empopasto S.A. ESP - Gloria Villate – Profesional del área de interventoría Empopasto S.A. ESP - Martha Delgado – Directora de interventoría

ORDEN DEL DÍA:

1. Estado de avance del proyecto
2. Temas varios
3. Compromisos

DESARROLLO:

Siendo las 10:30 am., del veintisiete (27) de marzo de 2025, se inicia la reunión de Seguimiento virtual del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO".

Interviene el ingeniero Pedro José León apoyo a la supervisión del Ministerio de Vivienda del CUR 1328 de 2023, e informa que la reunión tiene por objeto hacer el seguimiento del estado de avance del proyecto y si se tienen otros temas que consideren por tratar.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. Estado de avance del proyecto

La Ing. Martha Delgado de la interventoría informa que el reinicio de los contratos se dio el 3 de marzo de 2025 y dentro de las actividades ejecutadas se tiene:

- Suministro de materiales
- Implementación del Plan de manejo de tráfico – PMT y el Plan de manejo ambiental – PMA
- Ejecución de obra (Localización y replanteo, suministro e instalación tubería temporal PVC 8”, Demolición de pavimento rígido, excavaciones, cargue, retiro y disposición de material sobrante, entibado, manejo de agua con motobomba, cámara de inspección en poliéster reforzado, suministro e instalación de tubería GRP 56”, relleno con material seleccionado)

Igualmente informa que el plazo de ejecución contractual es de 287 días de los cuales se lleva 51 días correspondientes al 17,77%. El avance programado de obra es del 8,85% y el ejecutado del 5.26%. El atraso obedece a las condiciones climáticas y a que la vía para el suministro de materiales se encuentra cerrada

El ing. Pedro J León recomienda que el ejecutor esté atento porque si bien el atraso es mínimo, si se incrementa se debe implementar un plan de contingencia para evitar que se afecte el cronograma de ejecución. También informa que ya se hizo la solicitud de los recursos del 30% del aporte de la Nación y en este momento está en trámites internos y seguidamente depende del Ministerio de Hacienda para para que se haga el desembolso. Esto se logró hacer en consideración a que se recibió la notificación de la exención de retefuente para la cuenta de parte de Fiduagraria el 21 de marzo.

2. Temas varios

El ing. Pedro J León pregunta si se ha hecho el cargue de la documentación en Sigevas o si se ha presentado algún inconveniente con el usuario, lo que incluye los informes de supervisión del CUR 1328 de 2023 y los de interventoría.


El Ing. Javier Chávez responde que falta cargar la suspensión, la prórroga de la suspensión y el reinicio. También que han tenido unas dificultades a la hora de cargue de estas porque no estaba la celda para cargar la suspensión. Pide una capacitación para realizar este cargue de estas actas. Los informes de supervisión se han cargado mensualmente y ahora, como ya está en ejecución el proyecto, apenas se revisen y se aprueben los informes de la Interventoría también serán cargados en esta plataforma.

El ing. Pedro J León menciona que los informes de supervisión se encuentran hasta el No. 19 subido el 14 de marzo pero ninguno de interventoría, a lo que responde el Ing. Javier Chávez que esto se debe a que los contratos estaban suspendidos y se incorporarán después del 5 de abril. También, será informado el administrador de la plataforma para programar la capacitación y solicita un listado de los interesados en asistir.

3. Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío listado de interesados en la capacitación Sigevias	Empopasto, José Rosales	3-abr-2025

ASISTENCIA: Se anexa pantallazo de participantes vía Teams.

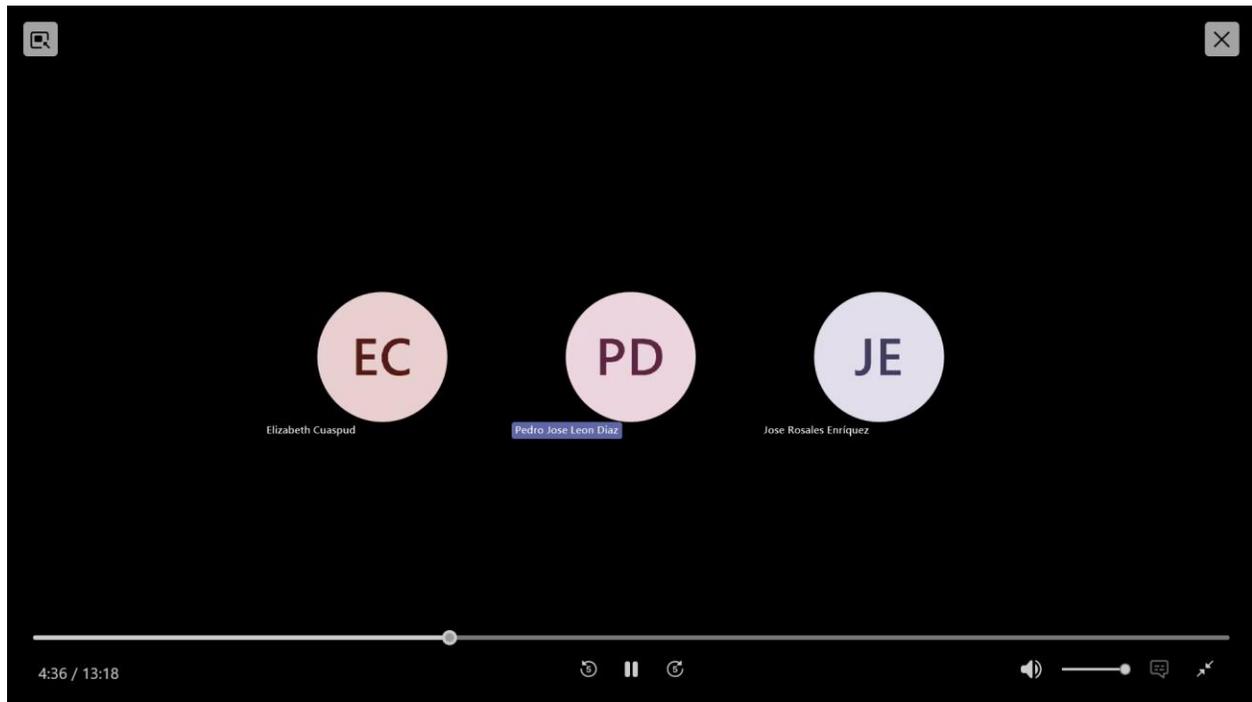

Elaboró: Pedro José León Díaz – Ingeniero de Seguimiento
 Fecha: 27-03-2025
