

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11 Fecha: 1/04/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01
Reunión PGN Procuraduría General de la Nación
Disposición Final Pto Carreño

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de abril de 2025
HORA:	10:00 AM
LUGAR:	Virtual https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDk3NjQ0OWEtM2JiZC00OTJjLWJhYmEtMDYxOGRmNjQxNTc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%224174a51f-4c5f-4246-8e8a-f462383f0490%22%7D
ASISTENTES:	Procuraduria General de la Nacion Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Alcaldía Municipal de Puerto Carreño Plan Departamental de Aguas de Vichada Minvivienda



DESARROLLO:

1. Generalidades

La Procuraduría General de la Nación ofició a la Gobernacion de Vichada, con copia al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), según radicado 2025ER0044403, con el fin de hacer una reunión con relación a los avances en la solución al tema de la disposición final en el municipio de Puerto Carreño.

2. Desarrollo de la reunión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11 Fecha: 1/04/2024 Código: GDC-F-01

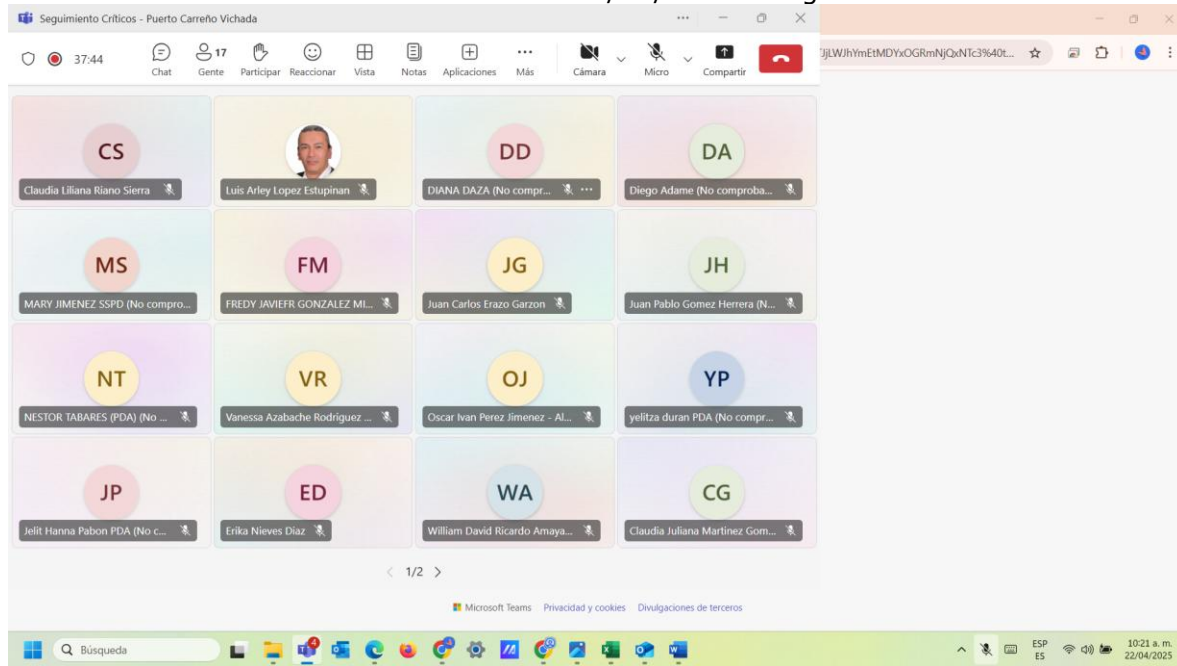

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11 Fecha: 1/04/2024 Código: GDC-F-01

Durante la reunión, intervienen cada uno de los actores en relación con el tema.

Intervencion Alcaldía Municipal de Puerto Carreño:

El Municipio de Puerto Carreño ha estado acompañado con Findeter y Ministerio, para el contrato 895 de 2024 para el ajuste y actualización del PGIR. La alcaldía ha estado atenta en este acompañamiento, al igual que al de la Interventoría correspondiente y el Contrato 003/24 con Findeter y el interventor.

Desde PDA esperan el resultado de la consultoría para vincularse a la ejecución de la obra importante para el mpio.

Intervención Alcalde Oscar Ivan Perez

Hicieron aporte de \$200 millones para compra carro recolector. Desde PDA proyectaron compra de 2 vehículos para Cumaribo y Puerto Carreño, y con los resultados de la consultoría expedirían en el PDA el el CDR para iniciar la etapa contractual.

El plan ambiental esta próximo a ser aprobado con los proyectos, y con eso poder expedir el CDR y comenzar con las actividades contractuales, por lo que habría que esperar 1 mes para empezar con lo contractual. Han hablado con proveedores quienes dicen que se demora entre 2 y 3 meses el ensamblaje de la caja compactadora especial para este tipo de terrenos.

Se contempla en el proyecto la entrega en el territorio del carro, por ahí una semana después de ensamblado el vehiculo, excepto por el invierno, pues el transporte seria via fluvial, por lo que se espera que en el 2º semestre se tengan ya los vehículos en los municipios.

Intervención Juan Carlos Erazo Ministerio:

Se saco el convenio 1392 cuyo objeto es el estudio y diseños del estudio del relleno sanitario de Puerto Carreño. En este momento, la consultoría va en un 70%, a lo que lleva hoy a lo del relleno. Para la optimización del relleno, el consultor propuso 3 alternativas: area, combinado y zanjas o trincheras.

Con base en la matriz multicriterio del consultor, se hizo reunión con Findeter, Consultor, Interventoría, Municipio y Ministerio, de la cual se seleccionó la alternativa 1 como la más viable, o sea la del método de área, o construcción que se da a nivel de terreno de superficie debido a la zona plana de Puerto Carreño, y por medio de diques hacer unas elevaciones. Alternativa para 5 años, lo que les dio la construcción de 4 celdas, en el mismo lote actual. Se tuvo en cuenta, los residuos que se van a

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11 Fecha: 1/04/2024 Código: GDC-F-01

generar hasta el 2049 mas los residuos que ya se encuentran actualmente. De tal forma que los residuos antiguos se saquen y operen con la empresa operadora. Consultor ya empezó con etapa diseño, caseta etc.

El consultor debe diseñar con la totalidad de los residuos que esta generando el Municipio, pero adicionalmente esta haciendo lo de aprovechamiento, es decir diseños de ECA donde se pueda llevar el reciclaje y transformar para otro proceso. Si se puede hacer la ECA la vida útil del relleno aumentaría.

En aprovechamiento, ya hay alternativas, el municipio había dicho un lote para la ECA pero no fue avalado por la interventoría por lo lejos, por lo que el consultor sigue proponiendo la ECA dentro del lote del relleno actual.

Vanesa azabache de alcaldía dice que no han podido tener catastro de recicladores por que ellos no son constantes en su labor. La alcaldía también informa que no es fácil el manejo con la población que lleva arraigada ya aproximadamente 20 años en las zonas aledañas al relleno sanitario, por que han perdido sus arraigos de comunidad indígena y están mas habituados al desarrollo urbano por que no quieren volver a sus comunidades ancestrales originarias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se espera contar con los carros compactadores en el segundo semestre del 2025. La consultoría del relleno sanitario avanza en un 70%.

Elaboró: Claudia Liliana Riaño S. / Líder departamento Grupo SGP 
Fecha: 22 de abril de 2025
