

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de abril de 2025
HORA:	De 15:30 – 16:00
LUGAR:	Reunión virtual – Plataforma Microsoft Teams
ASISTENTES:	1. AGUAS DEL MAGDALENA- PDA Gilma Escobar 2. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO RIO FRIO, MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.”

1. Empalme apoyos a la supervisión MVCT
2. Revisión general estado proyecto.
3. Verificación de compromisos previos y estado de trámites requeridos.

DESARROLLO:

- Radicación del nuevo proyecto: desde aguas del Magdalena se informó que el nuevo proyecto fue radicado ante ventanilla departamental el 7 de abril de 2025. Se compromete a enviar el soporte de radicación por correo.

- Acta de cierre: fue firmada el mismo día de la reunión (22 de abril) y se informó que fue cargada a la plataforma SECOP.

- Permiso de vertimiento: se reportó que aún no se cuenta con prórroga por parte de Corpamag, dado que se requiere previamente autorización del Distrito de Riego,

gestionado a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). La reunión con la ADR se llevó a cabo el 8 de abril de 2025, sin respuesta formal hasta la fecha.

- Alternativa de vertimiento: se evalúa una nueva opción, aunque aún no se cuenta con diseño detallado. Esto implicaría mayor longitud de obra y nuevas gestiones prediales y ambientales.

- Actualización en SIGEVAS: se informó que ya se realizó el cambio de nombre de los archivos requeridos, conforme a la solicitud por parte del MVCT. No se han registrado pagos recientes ni avances físicos en la plataforma, toda vez que el proyecto se encuentra suspendido.

2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar radicado del nuevo proyecto (7 de abril)	Aguas del Magdalena - PDA	24 de abril de 2025
2	Remitir acta de cierre del proyecto firmada el 22 de abril	Aguas del Magdalena - PDA	24 de abril de 2025
3	Compartir acta de reunión con ADR del 8 de abril	Aguas del Magdalena - PDA	24 de abril de 2025
4	Verificar estado de trámite del permiso con ADR y Corpmag	MVCT	Antes del 20 de mayo de 2025, según remisión de información por parte del PDA.
5	Programar próxima mesa de seguimiento	MVCT -	20/Mayo/2025
6	Realizar seguimiento a actualización de documentación en SIGEVAS	MVCT	Según disponibilidad de asignación en plataforma.

Link de reunión:


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

[1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimiento-20250422 154348-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

 **1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimie**

22 abr 2025 15:30 - 16:00

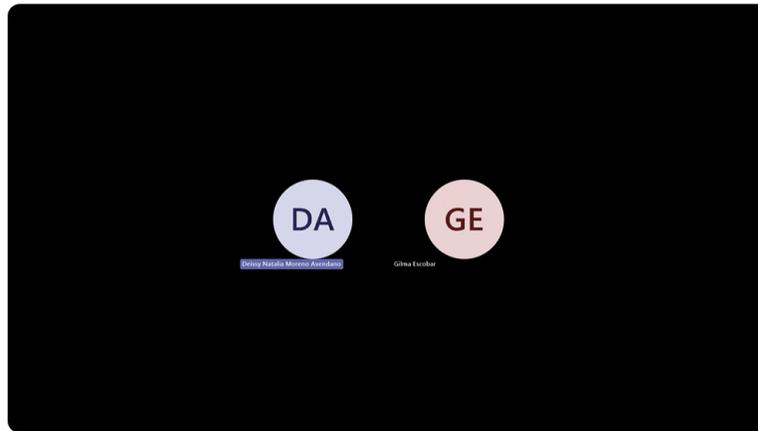

 **1-2017-184 Zona Bananera- Mesa Técnica de Seguimiento** Chat Asistencia +6 [Unirse](#)  1  Detalles de la reunión

22 abr 2025 15:32 - 16:00  Desc

3 Asistieron	15:32 - 16:00 Hora de inicio y finalización	27m 38s Duración de la reunión	14m 56s Tiempo medio de asistencia
------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Deissy Natalia Moreno Avenda... DNMoreno@minvivienda.gov.co	15:32	16:00	27m 35s	Organizador
 GILMA (No comprobado)	15:42	15:45	2m 7s	Moderador
 Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	15:45	16:00	15m 5s	Moderador

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Apoyo a la supervisión MVCT
 Revisó: Gilma Escobar- PDA
 Fecha: 30 de abril de 2025
