


 La vivienda y el agua son de todos		Minvivienda		FORMATO: AGENDA DE TRABAJO COMISIONES FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS		Versión: 4.0 Fecha: 19/09/2019 Código: GRF-F-47	
Tema:		Asistencia técnica de seguimiento de obras en los municipios de Tadó y Atrato (Chocó).					
Dependencia Coordinadora:		Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Subdirección de Programas					
Entidad que convoca:		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.					
Partes Interesadas		Alcaldías Municipales de Tadó y Atrato, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Enterritorio.					
Fecha:		27/01/2021 - 29/01/2021					
Objetivo:		Efectuar asistencia técnica para seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Tadó y Atrato.					
Justificación:		Decreto 1077 de 2015, capítulo 4. Resolución 0494 de 2012 y 169 de 2013. Convenios No. 616 y 619 de 2019 - Cláusula 4, numeral 4. (Obligaciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el marco del convenio de cooperación con el Municipio y Empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado.)					
Metodología de trabajo:		Reunión y visita técnica a barrios priorizados y en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.					
FECHA	Hora	Actividad	Responsable	Observaciones			
27/01/2021	11:30 a.m	Reunión de seguimiento al cumplimiento de obligaciones convenio de Cooperación municipio de Tadó - Chocó.	MVCT	Con participación de Alcaldía Municipal, Empresa Prestadora de Servicios Públicos, Enterritorio (contratistas de obra e interventoría).			
27/01/2021	2:00 p. m.	Recorrido de visita técnica a los barrios priorizados y en ejecución. (Calidad de obras, cumplimiento de especificaciones y normativa PCI), municipio de Tadó - Chocó.	MVCT				
28/01/2021	10:30 a.m	Reunión de seguimiento al cumplimiento de obligaciones convenio de Cooperación municipio de Atrato - Chocó.	MVCT	Con participación de Alcaldía Municipal, Empresa Prestadora de Servicios Públicos, Enterritorio (contratistas de obra e interventoría).			
28/01/2021	2:00 p.m	Recorrido de visita técnica a los barrios priorizados y en ejecución. (Calidad de obras, cumplimiento de especificaciones y normativa PCI) municipio de Atrato - Chocó.	MVCT				
Documentos Complementarios:							
Elaboró: Sindy Paola Castro Aguirre				Aprobó: Juan Pablo Serrano Castilla			
Cargo: Contratista				Cargo: Subdirector de Programas			
Firma: 				Firma: 			
Fecha: 18/01/2021				Fecha: 18/01/2021			
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf							

CONTRATO	PAF-ATF-N-606 DE 2020	
NOMBRES	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE	
APELLIDOS	CASTRO AGUIRRE	
NUMERO DE IDENTIFICACION	C.C. 1075538971	
DIRECCION	Cra 13B 161-84 Casa 71	
TELEFONO	7508132	
CELULAR	3208525798	
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	scastro@minvivienda.gov.co	
CORREO ELECTRONICO PERSONAL	sindycastroaguirre@yahoo.com	
ITINERARIO	FECHA DE SALIDA	27-ene-21
	HORA DE SALIDA	8:00 a. m.
	LUGAR DE SALIDA	BOGOTA
	LUGAR DE LLEGADA	QUIBDÓ
	FECHA DE REGRESO	29-ene-21
	HORA DE SALIDA	2:00 p. m.
	LUGAR DE SALIDA	QUIBDÓ
LUGAR DE LLEGADA	BOGOTA	



**SUPERVISOR DEL CONTRATO N° PAF-ATF-N-606 DE 2020.
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

HACE CONSTAR:

Que **SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE**, identificada con la C.C. No.1.075.538.971 de Aipe, estuvo los días 27 al 29 de enero de 2021, en los municipios de Tadó y Atrato (Chocó), encomendada para las siguientes labores:

- Efectuar asistencia técnica para el seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Tadó y Atrato (Chocó).

Esta constancia se expide para efectos de legalizar la comisión autorizada para este contratista.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los (2) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Juan Pablo Serrano C.

 **JUAN PABLO SERRANO CASTILLA**
Supervisor Contrato No. **PAF-ATF-N-606 DE 2020**

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

Fechas de Comisión o Autorización:

Inicio	Final						
<table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">27</td> <td style="padding: 2px 10px;">01</td> <td style="padding: 2px 10px;">21</td> </tr> </table>	27	01	21	<table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">29</td> <td style="padding: 2px 10px;">01</td> <td style="padding: 2px 10px;">21</td> </tr> </table>	29	01	21
27	01	21					
29	01	21					

Rutas de Desplazamiento

Ruta Aérea: Bogotá - Quibdó -Bogotá
 Ruta Terrestre: Quibdó -Tadó - Atrato- Quibdó.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Efectuar asistencia técnica para el seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Tadó y Atrato (Chocó).

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

1. Visita de seguimiento a Tadó. (27 de enero de 2021).

1.1. Reunión técnica. (Lugar: Alcaldía municipal – Tadó - fecha: 27 de enero de 2021 - asistentes: Secretaría de Planeación Municipal, Gerente Aguas de Tadó, Ministerio, Enterritorio y Contratistas de obra e interventoría).


Se realizó un resumen general de las obligaciones contractuales al convenio de cooperación establecidas para la Alcaldía municipal y para la Empresa, se recomienda para el proceso de entrega de obras, realizar continuo acompañamiento al contratista toda vez que se encuentra en la etapa final del proyecto.

Se recuerda a la empresa Aguas de Tadó realizar el recibimiento de las conexiones domiciliarias, las cuales deben ir debidamente certificadas en su cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por la empresa y suministradas a los contratistas.

El Alcalde y Secretario, manifiestan la necesidad de realizar una segunda etapa de intervención en el municipio de Tadó, en los demás barrios del municipio, por tanto, realizarán comunicado de solicitud ante el Ministerio.

Finalmente, el proyecto culmina con 550 intervenciones en el barrio San Pedro.

1.2 Reunión de rendición de cuentas. (Lugar: Oficinas de contratistas de obra e interventoría – Tadó - fecha: 27 de enero de 2021 - asistentes: Líderes comunales barrio San Pedro, Personero, Veedores, comunidad en general, Secretaría de Planeación Municipal, Gerente Aguas de Tadó, Ministerio, Enterritorio y Contratistas de obra e interventoría).


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Se realizó la jornada de rendición de cuentas en el barrio San Pedro, actividad liderada por los contratistas de obra e interventoría, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se realizó de forma simultánea en 4 puntos diferentes los cuales estaban unidos a través de la plataforma virtual teams, en dicha reunión el contratista expuso un resumen general de la parte técnica del proyecto, también se realizó resumen de todas las actividades desarrolladas en el marco del plan de gestión social y finalmente se contó con la participación del público asistente, donde realizaron diferentes intervenciones sobre el proyecto, en contexto general se enfocaron en realizar agradecimientos al Ministerio, contratistas y demás actores, manifestando la gran satisfacción de ser incluidos en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias.

Se resaltó que el contratista continuará en el municipio realizando los ajustes que sean necesarios en las intervenciones con el fin de quedar a entera satisfacción de las partes.


	
Fecha: 27/01/2021 Oficina interventoría	Fecha: 27/01/2021. Bodega almacén contratista
	
Fecha: 27/01/2021. Oficina constructor	

1.3. Visita de seguimiento de calidad de obras. (Lugar: Barrio San Pedro - fecha: 27 de enero de 2021 - asistentes: Funcionarios de Planeación Municipal, Funcionarios Empresa, Ministerio, Enterritorio y contratistas de obra e interventoría).

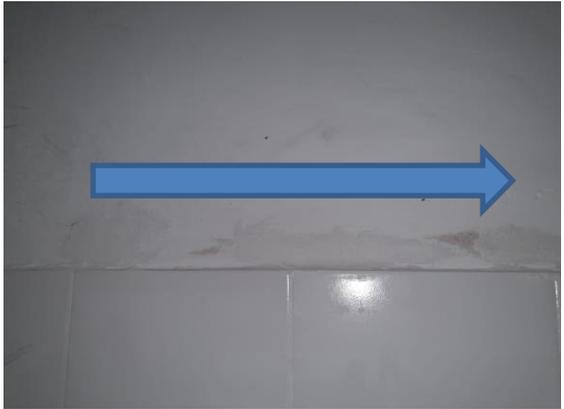
	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 547 Construcción de caseta tipo 2, intradomiciliaria de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos y lavadero incluye muretes, se recomienda pintar marco de la puerta, cortar varilla expuesta sobresaliente en viga corona.

	
<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de piso y filos de muretes</p>	<p>Fecha: 27/01/2021. Caseta tipo 2</p>
	
<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Ajustar lavamanos</p>	<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Pintar marco de puerta</p>

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 527 Unidad sanitaria tipo 2, redes internas de acueducto y alcantarillado, construcción de lavaplatos con muretes.

	
<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de muro fondo lavaplatos, limpiar piso.</p>	<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de pintura en muro de ducha.</p>
	
<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Pegar acrílico</p>	<p>Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar bordes de muretes de lavaplatos</p>

Código: 489 Adecuación caseta asistente, intradomiciliaria de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos. Se recomienda mejorar acabado de viga corona de la unidad existente e instalar ducha.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22



Fecha: 27/01/2021.
Instalación de lavaplatos.




Fecha: 27/01/2021.
Instalación de baldosa.



Fecha: 27/01/2021.
Instalación de sanitario




Fecha: 27/01/2021.
OBSERVACIÓN: Instalar ducha.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código:435 Adecuación unidad existente, instalación de lavaplatos y construcción de lavadero, conexiones internas de acueducto y alcantarillado. Falta estucar y mejorar filo viga de amarre superior.

	
Fecha: 27/01/2021. Instalación de lavaplatos.	Fecha: 27/01/2021. Recuperación de piso.
	
Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de viga de amarre superior.	Fecha: 27/01/2021. Construcción de lavadero con muretes.


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 694 Adecuación de unidad existente, intradomiciliaria de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos con muretes. El propietario por su cuenta propia pintó los muros de la unidad de color azul.

	
Fecha: 27/01/2021. Observación: Mejorar filos de muretes lavaplatos	Fecha: 11/11/2020. Adecuación caseta existente. El propietario del inmueble pintó los muros de color azul.

Código: 454 Construcción de caseta tipo 2, instalación de lavaplatos y construcción lavadero con muretes, y la instalación de sus respectivas intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomienda realizar correcta instalación de tubería para lavadero.

	
Fecha: 27/01/2021. Caseta tipo 2.	Fecha: 27/01/2021. OBSERVACIÓN: Realizar ajuste en la instalación de tubería, garantizar correcta instalación.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22



Fecha: 27/01/2021.
Instalación de lavaplatos.

2. Visita de seguimiento a Atrato. (28 de enero de 2021).

2.1. Visita de seguimiento de calidad de obras. (Lugar: Barrios SAN ANTONIO, CENTRO Y SANTANDER - fecha: 28 de enero de 2021 - asistentes: Funcionarios de Planeación Municipal, Funcionarios Empresa, Ministerio, Enterritorio y contratistas de obra e interventoría).

Barrio San Antonio.


Código: 016. Construcción de caseta tipo 2, redes internas de acueducto y alcantarillado, construcción de lavadero y lavaplatos con muretes. Mejorar acabado de piso y filos de viga corona.



Fecha: 28/01/2021.
Construcción de lavaplatos con muretes.



Fecha: 28/01/2021.
Construcción de lavadero con muretes.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-22



Fecha: 28/01/2021.
OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de viga corona.



Fecha: 28/01/2021.
Construcción caseta tipo 2.


Código: 022. Construcción de caseta tipo 2 e instalación de lavaplatos. El beneficiario suministra e instala baldosa de piso de color negro en la zona del sanitario



Fecha: 28/01/2021.
Construcción caseta tipo 2.



Fecha: 28/01/2021.
Instalación lavaplatos.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Código: 013. Construcción de caseta tipo 1, con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavadero. Se recomienda ajustar el tubo sobresaliente en la ducha, mejorar acabado de pintura y cancelar punto existente de inodoro.

	
Fecha: 28/01/2021. Caseta tipo 1.	Fecha: 28/01/2021. OBSERVACIÓN: Limpiar tejas.
	
Fecha: 28/01/2021. Construcción de lavaplatos con muretes.	Fecha: 28/01/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de muro de caseta exterior.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 019. Construcción de caseta tipo 2 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos. Se recomienda mejorar pañetes, filos, pintar puerta, pintar muros y afinar piso.


	
<p>Fecha: 28/01/2021. Construcción caseta tipo 2</p>	<p>Fecha: 28/01/2021. Construcción de lavaplatos con muretes.</p>
	
<p>Fecha: 28/01/2021. OBSERVACIÓN: Instalar calados de ventilación, teniendo en cuenta que no queda espacio entre la placa en madera y la unidad construida.</p>	<p>Fecha: 28/01/2021. Construcción de lavadero con muretes.</p>

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-22

Barrio El Centro.

Código: 006. Construcción de caseta tipo 2 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos y lavadero con muretes. En ejecución.

	
<p>Fecha: 28/01/2021. Instalación de tubería.</p>	<p>Fecha: 28/01/2021. Pañete de unidad sanitaria tipo 2.</p>
	
<p>Fecha: 28/01/2021. Caseta en construcción</p>	


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 007. Construcción de caseta tipo 2 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos. Se recomienda mejorar unión de bloques en una de las caras del muro.

	
Fecha: 28/01/2021. Construcción de caseta tipo 2.	Fecha: 28/01/2021. Construcción de lavadero y lavaplatos con muretes.

Código: 010. Construcción de caseta tipo 2 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavaplatos. En construcción.

	
Fecha: 28/01/2021. Construcción caseta tipo 2.	Fecha: 28/01/2021. Excavación para instalación de tubería.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Barrio Santander.

Código: 076. Construcción caseta tipo 4 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. En ejecución.

	
Fecha: 28/01/2021. Pañete unidad sanitaria tipo 1.	Fecha: 28/01/2021. Interior unidad sanitaria.

Código: 019. Construcción caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. En ejecución.

	
Fecha: 28/01/2021. Pañete caseta tipo 1.	Fecha: 28/01/2021. Construcción caseta tipo 1.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

2.2 Verificación algunos casos solicitados de inclusión con soluciones especiales de alcantarillado.

(Lugar: Barrios MALVICLUB - fecha: 28 de enero de 2021 - asistentes: Funcionarios de Planeación Municipal, Funcionarios Empresa, Ministerio, Enterritorio y contratistas de obra e interventoría).

Barrio Malviclub

Código: S/N. Se realizó revisión a dos casos puntuales, de inmuebles habitados por adultos mayores, los cuales habitan solos, sus viviendas en situación de extrema pobreza, las cuales fueron atendidas con soluciones individuales de alcantarillado, sin embargo, no cuentan con unidad sanitaria ni redes internas, a la fecha continúan esperando de la ayuda del Gobierno Nacional para poder tener acceso real a los servicios de acueducto y alcantarillado. Los inmuebles visitados corresponden dentro de las 50 unidades solicitadas por el alcalde municipal a incluir dentro del programa, las cuales se encuentran sujetas a la posibilidad del ajuste de la normativa del PCI.

	
<p>Fecha: 28/01/2021. Inmueble habitado por adulto mayor en condiciones de pobreza extrema atendido con solución individual de alcantarillado.</p>	<p>Fecha: 28/01/2021. Soluciones individuales de alcantarillado</p>

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

2.3 Reunión técnica. (Lugar: Alcaldía municipal – Atrato - fecha: 28 de enero de 2021 - asistentes: Secretaría de Planeación Municipal, Gerente Empresa, Ministerio, Enterritorio y Contratistas de obra e interventoría).

Se realizó un resumen general de las obligaciones contractuales al convenio de cooperación establecidas para la Alcaldía municipal y para la Empresa, se recomienda para el proceso de entrega de obras, realizar continuo acompañamiento al contratista.

Cantidad de intervenciones aprobadas 615, inclusiones recibidas con corte al 31 de diciembre de 2021: 160 todas aprobadas por planeación municipal. Los recursos alcanzan para atender 80 de las 160 inclusiones aprobadas. Con fecha a enero 2021 se recibieron 20 solicitudes de inclusión para un total 100 solicitudes de inclusiones que cumplen con los requisitos, pero no cuentan con recursos para su intervención.

El Secretario de Planeación manifiesta realizar solicitud de adición de recursos para atender las inclusiones aprobadas que carecen de recurso, es decir aproximadamente 100, quitando aquellas de soluciones especiales que en realidad corresponden a 10 inmuebles y no a 50 inmuebles como se había solicitado previamente ante el Ministerio.

Se realizará cierre de barrios para el día 15 de febrero en los primeros 3 barrios aperturados, es decir: Malviclub, Yuto Nuevo y Carretera.

3. Conclusiones y recomendaciones.

Una vez concluida la jornada de asistencia técnica en los municipios de Tadó y Atrato con el fin de verificar la calidad de las obras se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

TADÓ


- De forma general los acabados del municipio de Tadó son buenos, sin embargo, es necesario se realicen las observaciones detalladas en el presente informe.
- Las observaciones generales radican en mejorar los acabados de pisos, pintar puertas, mejorar filos de viga de amarre en el caso de casetas tipo 2.
- De acuerdo con la especificación técnica de caseta tipo 2, se contempla la instalación de calados, favor aclarar aquellos casos donde no se presencia dicha instalación.
- En el marco del convenio se solicitará aclaración a la empresa Aguas de Tadó referente a la presión en el barrio San Pedro, dado que en recorrido realizado la comunidad manifiesta la deficiencia de la presión y continuidad.
- Es indispensable contar con la información completa por cada inmueble para el proceso de recibo por parte del Ministerio. Es decir, el antes (durante diagnóstico), durante (en obra) y el después (cómo se mejoró la calidad de vida y acceso directo a los servicios de acueducto y alcantarillado).

ATRATO

- Se recomienda mejorar en forma general los acabados de pintura, en su defecto elaborar más manos de pintura.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

- De acuerdo con la especificación técnica de caseta tipo 2, se contempla la instalación de calados, favor aclarar aquellos casos donde no se presencia dicha instalación.
- Se solicitará a Enterritorio aclaración referente a las solicitudes de inclusiones solicitadas con corte a 31 de diciembre de 2020 a planeación municipal las cuales fueron aprobadas por cumplimiento con los criterios de focalización, donde, sin embargo, la respuesta oficial emitida a los beneficiarios debió corresponder a estar condicionada a la posibilidad de adición de recursos al proyecto.
- Según especificación técnica para el caso de los muretes de lavaplatos y lavaderos, hace referencia de acabado con ladrillo a la vista, sin embargo, menciona que en algunos casos resulta indispensable el pañete de los mismos, se solicitará a Enterritorio en lo referente a dicha aplicación de la especificación técnica aclarando cuándo se reciben pañetados, lo cual debería estar incluido en el costo de la construcción del murete.



Sindy Paola Castro Aguirre
C.C. 1075538971 Aipe




Juan Pablo Serrano Castilla.
Subdirector de Programas.

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: , de ~~mes de 2021~~ 27 enero 2021.

HORA: De a horas

LUGAR: Alcaldía municipal Tadó.

ASISTENTES: planeación mpal, Gerente empresa Ministerio y Enterritorio.

INVITADOS: contratistas obra e interventoria.

ORDEN DEL DIA:


DESARROLLO: Se realizó lectura de obligaciones contractuales del convenio interadministrativo. Se recomienda realizar acompañamiento continuo al contratista teniendo en cuenta que se termina las labores para el mpo de Tadó.

Se aclara que el contratista de obra debe realizar los ajustes pertinentes que surjan durante el proceso de entregas de finitivas a interventoria y a Enterritorio

Se concluye con intervenciones en 550 inmuebles.

El alcalde y secretario de planeación, manifiestan la necesidad de realizar una segunda etapa de intervenciones en los demás barrios del municipio de Tadó.

Se contextualiza el resumen de la jornada de rendición de cuentas ejecuta en el barrio San Pedro.



• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha:



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019


Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Municipal FECHA: 27 Enero 2021 HORA:

TEMA: Reunión Compañero Convencido PRESIDE: Sindy Pado Castro A.

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	<i>[Signature]</i>	Alcalde	Tadó	313 299 0126	gpc@cpmms.gov.co	Comunicación	<i>[Signature]</i>
2	SENIOR PABLO	Dir. Planeación	Tadó	3207384537	secreteriadepa@cpmms.gov.co	11	<i>[Signature]</i>
3	BREDA MADRINE ESTAS		TADO	3014620210	bredam@cpmms.gov.co	11	<i>[Signature]</i>
4	Sindy p castro		MVCT				<i>[Signature]</i>
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Versión: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	Choró	MUNICIPIO	Todo
BARRIO	San Pedro		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	547

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>					CAJA 60X60
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		ACOMETIDA ACUEDUCTO
						MICROMEDIDOR
	<input checked="" type="checkbox"/>					

OBSERVACIONES: pintar marco de puertas, cortar varilla expuesta sobresaliente en Uiga corona. Mejorar acabado pasq filos en muretes Lavaplatos.

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	527
VIVIENDA VISITADA No.			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		CAJA 60X60
	<input checked="" type="checkbox"/>					ACOMETIDA ACUEDUCTO
						MICROMEDIDOR

OBSERVACIONES: mejorar acabado muro fondo de lavaplatos, mejorar acabado de pintura en muro de ducha, mejorar murete de Lavaplatos (filos).

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	489.
VIVIENDA VISITADA No.			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>					CAJA 60X60
	<input checked="" type="checkbox"/>					ACOMETIDA ACUEDUCTO
				<input checked="" type="checkbox"/>		MICROMEDIDOR

OBSERVACIONES: mejorar acabado Uiga corona, falta instalar ducha.

PROFESIONAL MVCT:	Sindy Paola castro	FECHA	27-01-21
-------------------	--------------------	-------	----------

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.mimvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1.0
		Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	Chocó	MUNICIPIO	Tadó
BARRIO	San Pedro		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	435

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	X	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA	X	UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	X	ADECUACIÓN UND EXISTENTE	X	MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS	X	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Falta estucar y mejorar filo Ugr de amarre Superior.

BARRIO	San Pedro					
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	694			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	X	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA	X	UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE	X	MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS	X	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO	X	TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			


OBSERVACIONES: mejorar filos de muretas Lavaplatos,

BARRIO						
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	454			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	X	UND SANITARIA INTERNA	X	CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	X	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Realizar ajuste en la instalación de tuberías garantizando correcta instalación (Lavadero).

PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castib Aguirre FECHA: 29/01/21

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los Modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: , de mes de 2021 **28 enero 2021**

HORA: De a horas

LUGAR: **Alcaldia municipal Atrato.**

ASISTENTES: **Ing. Eferon, Wendy Mosquera.**

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO: **Se inicia con el resumen de las intervenciones realizadas:**

Aprobadas: 615

recurso con pr: ~~84.838~~ 871.936 100%

Inclusiones al 31 Dic: 160 aprobadas

Recursos disponibles para ~~180~~ UNB.

Faltarían para ~~80~~ inclusiones a corte de diciembre. De las 80 se prevé más de 10 UNB de soluciones especiales

Notas:

con fecha a enero se recepcionaron 20 solicitudes de inclusion, de

Es decir en total serian 100 UMD

sin Recursos.

Durante el recorrido en la tarde se verificaron con exactitud cuantas son de soluciones especiales.

- la Alcaldia municipal atendió todas las solicitudes de inclusión.

- Moluclub manz 4 casa 13, estaba en proceso de solución referente al predio de uso publico, lo cual la alcaldia mpal, revisó previamente legalmente y concluyó que es apto para intervención.

Recibidas a satisfacción = 236 Con corte dominico 24 enero /21

15 febrero cierre barrios: moluclub, yuto y carretera

Delegado social cambio pendiente por enviar Documento de legalización.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha:



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019


Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Municipal Atrato FECHA: 28 enero 2021 HORA: _____

TEMA: _____ PRESIDE: Sindy Paola Castro A.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TÉLFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Dayana Pacheco	Residente O.	Atrato	3107321694	wpd@protonmail.com		
2	Carlos A. Devesa G.	Dir. OBRAS	CONSEJO TERRITORIAL 21	3229885365	intra@territorial21.gov.co		
3	Danyler Andrea Suárez Alvaró	Trabajadora Social	CONSEJO TERRITORIAL 21	3107551889	avrasocial@gmail.com		
4	Rodrigo Sosa	PROYECTO JUNO TAMBORA	CONSEJO TERRITORIAL 21	3232314088	conf@proyectojunotambora.gov.co		
5	Lina Otalvaro	Spousora social	ENTERRERO	3004854673	lotalvar@enterrero.gov.co		
6	Wendy J Mayra	Gerente	Atrato	3216446677	wandymayo@protonmail.com		
7	Mirlenis Córdoba	P. Social	Alcaldía Atrato	3216048003	Mirlenis.cordoba@alcaldiaatratogov.co		
8	John Anier Palacios	Adm. Banco de Proyectos	Alcaldía Atrato	3135353600	johnpalc@alcaldiaatratogov.co		
9	Wes Felipe Urbibayo	ING Residente	Intiueutonera	3183622701	felipe@uniboyogov.co		
10							
11							



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Versión: 1.0

Fecha: 18/12/2019

Código: GPR-F-37

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	Chocó	MUNICIPIO	Atrato
BARRIO	San Antonio		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	019
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Instalar caballos para ventilación,

BARRIO	El Centro		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	006
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución.


BARRIO	El Centro		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	007
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			


TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución

PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro Aguirre **FECHA:** 28/01/21

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifican, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		Versión: 1.0		
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 18/12/2019		
			Código: GPR-F-37		
CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR			
DEPARTAMENTO	Chocó	MUNICIPIO		Atrato	
BARRIO	San Antonio				
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		016	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES:	Mejorar acabado de piso y fibos de uiga Corona.				
BARRIO	San Antonio				
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		022	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES:	N/A				
BARRIO	San Antonio				
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		013	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES:	Limpiar tejas, mejorar acabado de muro de caseta exterior.				
PROFESIONAL MVCT:	Sindy Paola Castro A.		FECHA	28/01/21	
<small>En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf</small>					

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Versión: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	chocó	MUNICIPIO	Atrato
BARRIO	El centro		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	010
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución.

BARRIO	Santander		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	076
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución

BARRIO	Santander		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	019
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON CUBIERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución.

PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro Aguirre FECHA 28/01/21

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>
