

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 8 - Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de agosto de 2024.
HORA:	8:30 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

El 22 de agosto de realizo reunión Esant, Municipio, Contraloría se realizó visita, marta Sánchez acepto firmar la servidumbre, la señora marlen se encuentra en trámite servidumbre, los otros predios ya el municipio realizo visita. El Municipio informa que se encuentra en trámite de 3 servidumbres. Esant envió formato a la señora marlen los permisos de servidumbre para que el municipio tramite servidumbre.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

La Esant aprobó modificación de acta de mayores y menores, se reúnen el 27 de agosto de 2024 para revisión y continuar con el proceso.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT - Ing. Luz Yaneth Niño informa:

Se continuo seguimiento con contraloría existe contrato que se debe cumplir y el 27 de agosto el contratista termina cll11 entre 7-8 y cll 11 entre 4-5 andenes

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tramo por pavimentar. El contratista inicia el 10 de sep. Cra 6 cll 10-11, se evidencia rebose en pozo al frente del hospital
Cra 6 -5- 4 -3-2-1 lleva sistema pluvial independiente.
El sistema sanitario recibe aguas lluvias de las casas y el sistema queda combinado.
El 23 de agosto se firma modificatorio ajuste de contrato adicional en plazo NO.9 e incorporación de recursos de la reformulación NO.3 al proyecto.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El 14 de agosto de 2024 se realizó reunión de seguimiento convocada por la Gobernación de Santander con las siguientes conclusiones: 1. Findeter presenta propuesta de intervención de espacio público a planeación Bucaramanga. 2. El 4 de septiembre de 2024 AMB conceptúa sobre complemento a diseños. 3. Reunión gobernación y Planeación Bucaramanga el 6 de septiembre de 2024

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

Se realizo reunión 15 de agosto de 2024, la comunidad solicita revisión sitio de bocatoma, se solicita concepto por Espamogotes y consultor para ubicación de bocatoma. La ESANT solicita presentar reformulación No. 1 para filtros, alineamiento red de aducción por encontrarse cultivos en el trazado inicial y reforzamiento en la planta. El proyecto entra en suspensión a partir del 15 de Agosto de 2024 hasta que se presente la reformulación por el Municipio y la aprobación por el Ministerio.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión acta de mayores y menores cantidades Socorro	La Esant	27-08-2024
2	Solicitud de revisión Bocatoma del proyecto. Mogotes.	Obra e Interventoría- Esant y Espamogotes	30-09-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3	Modificadorio del proyecto PMAA de Vélez	Esant	23-08-2024
4.	Revisión presupuesto actualización de estudios y diseños. Lebrija	Findeter	23-08-2024

FIRMAS:

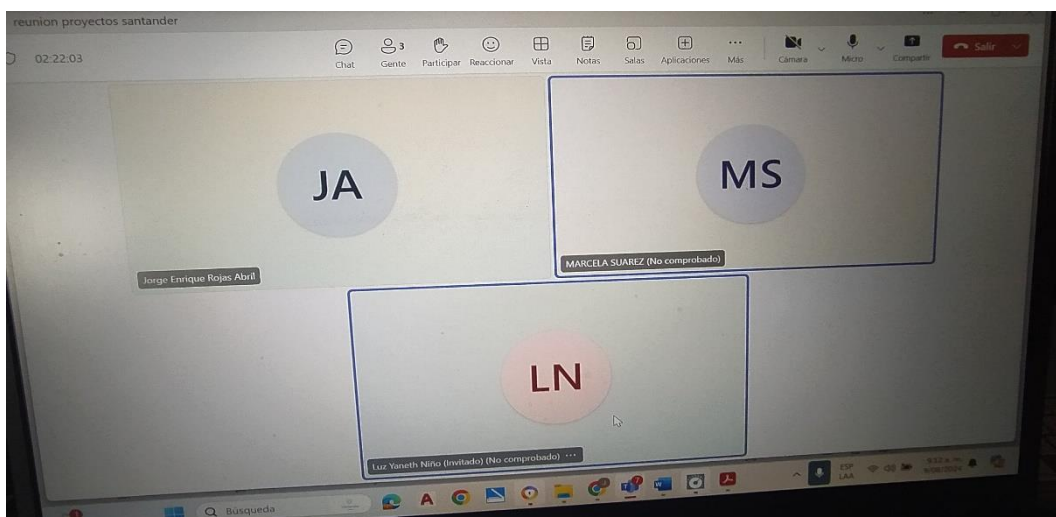

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: agosto 9 de 2024
