



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.10 - NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de noviembre 2024.
HORA:	4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes
2. Revisión reformulación No. 1

DESARROLLO:

Se inicia reunión con la ESANT – Ing. Marcela Suarez y MVCT de revisión reformulación No. 1 con las siguientes consideraciones:

1. El Ministerio indica que se deben corregir los oficios de solicitud del Municipio y la Esant en cuadro de alcance total viabilizado y alcance total reformulación No.1, con respecto a suministro e instalación de red de Aducción y suministro e instalación de red de conducción.

La ingeniera marcela indica que el total de la tubería de conducción es 2.385,74 ml de tubería de D= 4" que incluye red de aducción y red de conducción, la cual fue tomada en un solo valor por ser agua cruda.

El Ministerio indica que el criterio que se toma es red de aducción entre la Bocatoma y el desarenador y red de conducción del desarenador hasta la planta.

La Ingeniera marcela indica que la longitud de red de aducción es de 59,16 ml en diámetro de 4" y la red de conducción es de 2326,58 ml en diámetro 4".

2. El Ministerio solicita aclaración de la tubería de conducción ejecutada.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La ing. marcela informa que la tubería de conducción instalada corresponde a una L= 1.015,27 ml en diámetro de 4" y va desde el cruce vial de la vía nacional hasta la planta de tratamiento.

3. se ajusta en la presentación el plano de componentes del proyecto.


4. Se debe ajustar plano con red de conducción ejecutada.

5. Se debe presentar oficio indicando que el paso elevado no se va a construir porque el invias está ampliando la vía en el sector y la tubería se va a instalar por el lado derecho de la berma correspondiente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Corrección de oficios	Municipio y Esant S.A. E.S. P	25-11-2024
2	Oficio no construcción de paso elevado	Esant S.A E.S.P.	25-11-2024

FIRMAS:

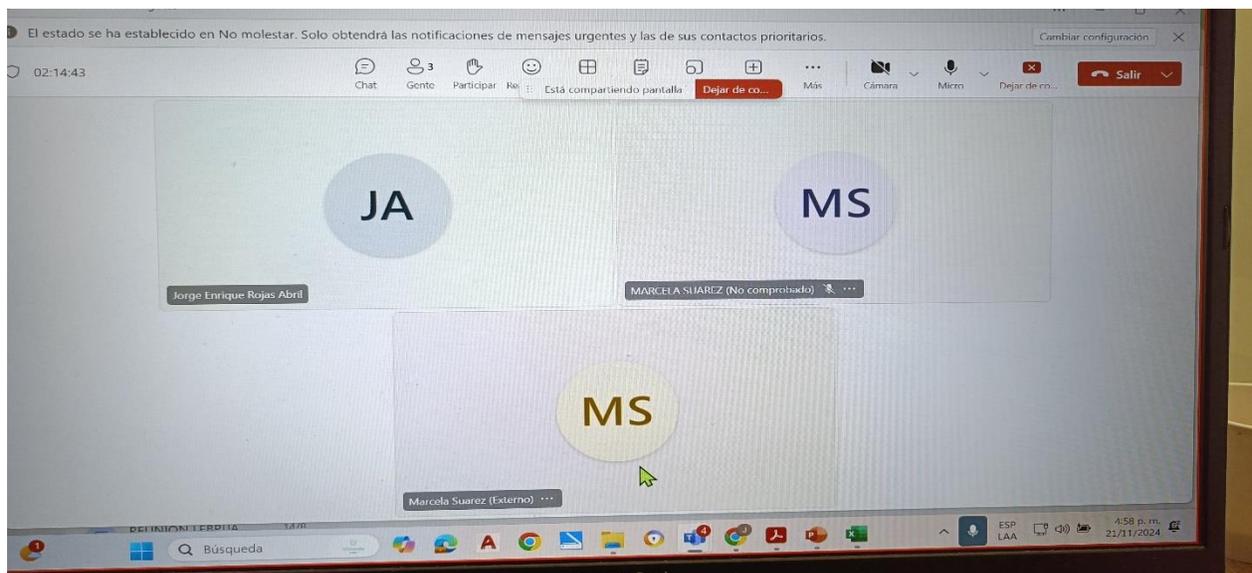



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 21-11-24
