



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón José Andrés Peña – interventor de obra Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a los compromisos de la suspensión nro. 1 del CUR 1288 de 2023

DESARROLLO:

Rehabilitación de los corredores viales: el municipio informa que con maquinaria de la UNGRD se habilitó la vía de acceso principal al municipio, sin embargo, para las vías terciarias no se ha podido avanzar y resultado de las gestiones del municipio ante la UNGRD se destino maquinaria compuesta por retro excavadoras de oruga y llantas así como Bulldozer por el término de 800 horas, y 2 volquetas por el término de 60 días calendario, no se a confirmado al fecha de ingreso de esta maquinaria al municipio, pero se estima que este en campo la semana del 16 de diciembre.

Si lo informado anteriormente se cumple, se considera necesario que la suspensión deberá prorrogarse un mes, sin embargo, esta decisión dependerá del cumplimiento de entrada de la maquinaria y del comportamiento del clima.


Así mismo, se realizará por parte del municipio seguimiento en los rendimientos de la rehabilitación de las vías, con el objetivo de tomar decisiones con tiempo para proceder con la prórroga de la suspensión o reiniciar el convenio y proceder con la prórroga del mismo a fin de dar el plazo necesario para la terminación de las obras y la liquidación de los contratos derivados.

Respecto a la reasignación de los 11 beneficiarios el municipio indica que ya se realizó el proceso y se programa reunión para el 12 de diciembre a fin de revisar la documentación de los nuevos beneficiarios habilitados por el municipio.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de la documentación de los nuevos beneficiarios	Municipio de Santa Helena del opón	12/12/2024
2	Estructuración de posible solicitud de prórroga a la suspensión por el termino de 2 meses	Municipio de Santa Helena del opón	11/01/2024
3	Seguimiento semanal a proceso de rehabilitación de vías terciarias.	Municipio de Santa Helena informa a MVCT	Cada viernes del mes

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité

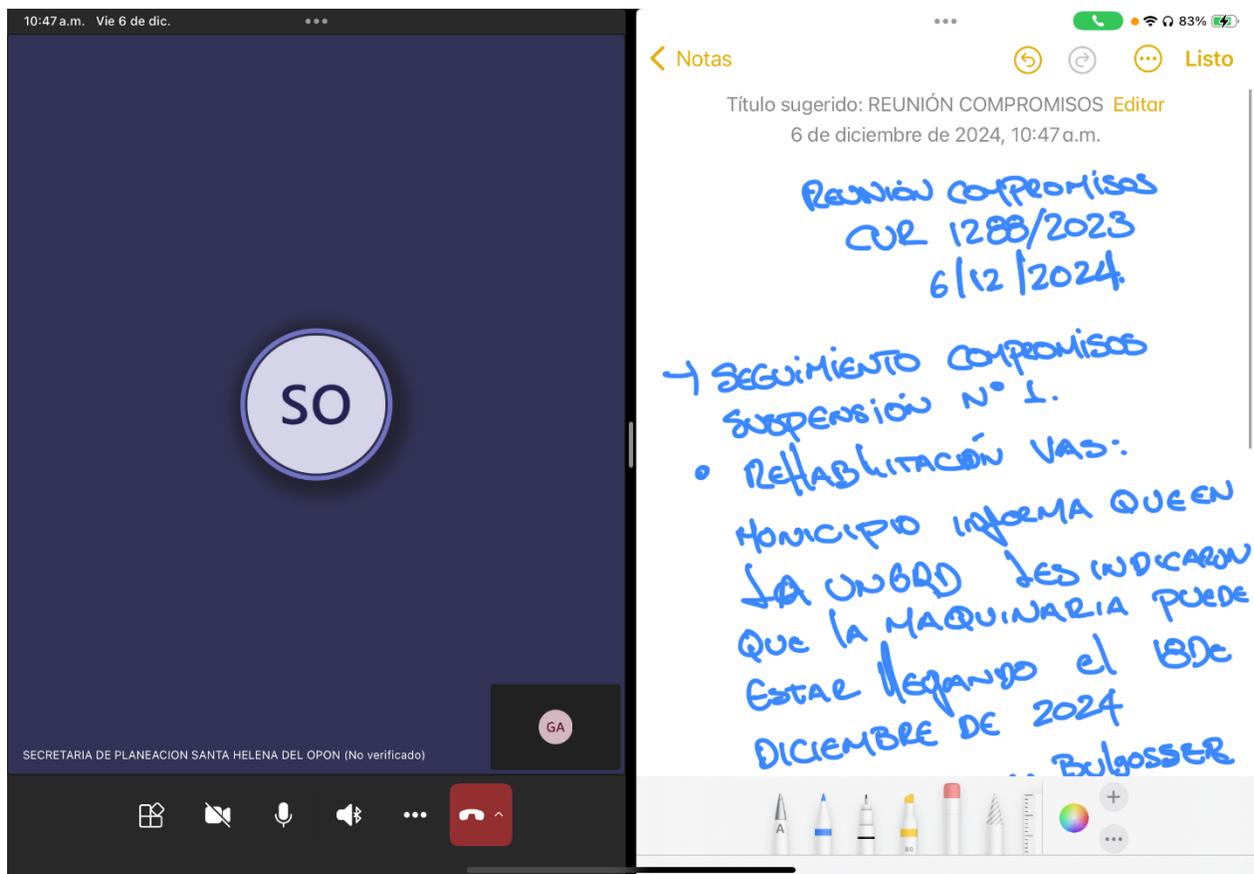



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

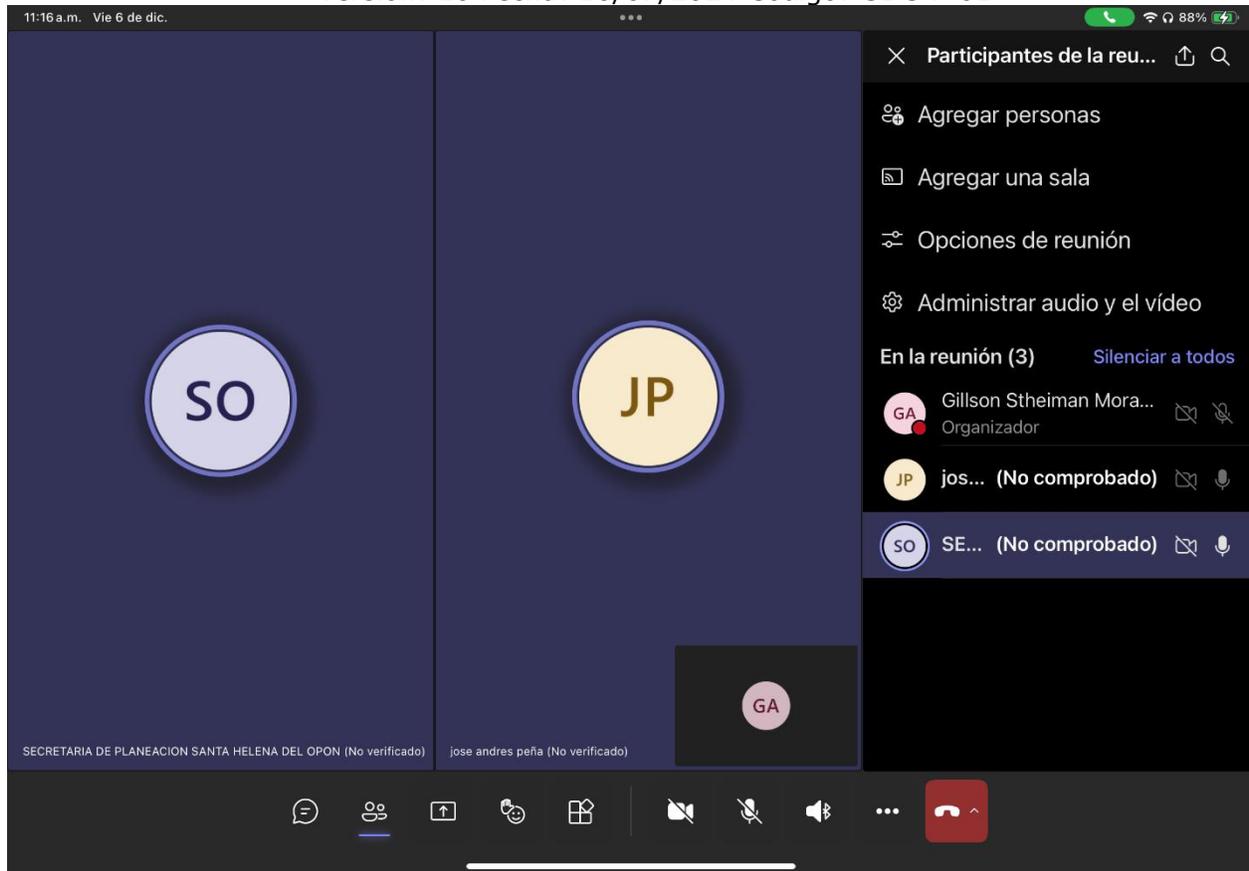

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 06/12/2024
