



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 10 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de Diciembre 2024.
HORA:	10: a.m. a 10:45 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en acta anexa
INVITADOS:	Relacionados en acta anexa

ORDEN DEL DIA:

1. OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB).

DESARROLLO:

Findeter informa que de acuerdo con informe No. 43 a corte 30 de noviembre de 2024, el avance físico corresponde a 25,25% y el avance de consultoría corresponde a 1,43% para un total de avance del 26,68%, contra un avance programado físico de 98,01% y consultoría 1,62%. Para un total de 99,63%.

Findeter informa que el 12 de diciembre se entregó a AMB respuesta a observaciones tramo 2 y tramo.

El Municipio hizo entrega el 18 de diciembre de 2024, a Findeter y contratista para dar inicio del proceso de factibilidad eléctrica con la electrificadora ESSA.

La interventoría continua con la revisión del presupuesto final, para remitir a Findeter aproximadamente el 15 de enero de 2025 a Findeter.

La entrega de la Interventoría del presupuesto programada para el 30 de diciembre se reprograma para el 15 de enero de 2024 a Findeter.


COMPROMISOS (Si aplica)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega observaciones presupuesto	Interventoría	15-01-2025

FIRMAS:

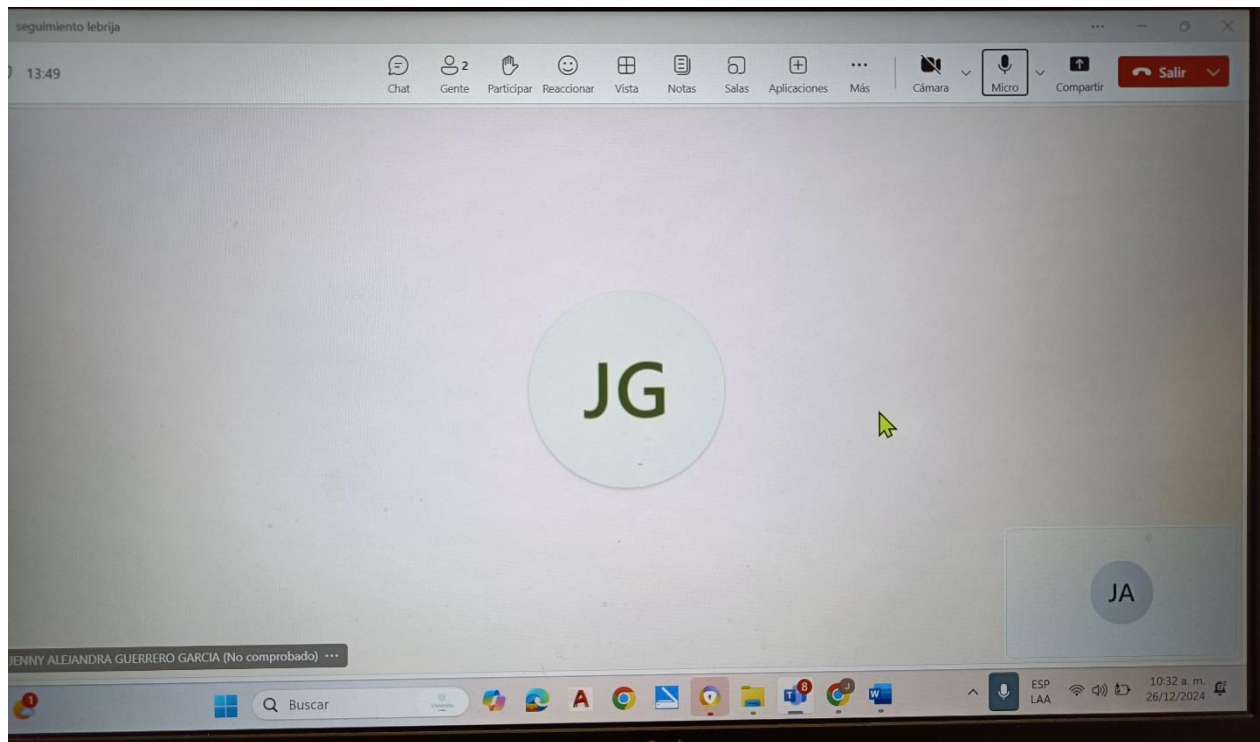

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 26-12-24
