



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 7 – ABRIL DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de Abril 2025
HORA:	8:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.
6. Proyecto Girón.

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

El MVCT informa que recibió información de servidumbres del proyecto y se reenvió el 6 de abril de 2025 al DR. Camilo Bermeo, especialista en servidumbres del MVCT para su revisión y aprobación.

La Esant informó que el contratista se encuentra en trámite de solicitud de ajuste de precios para radicarla a la Esant.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El Municipio firmo acta de entrega y funcionalidad al Municipio con fecha 10 de marzo de 2025 y se remite al MVCT el 31 de marzo de 2025. Se inicia tramite acta de liquidación para finales de abril de 2025. Se elaboraron actas y se encuentran en trámite de jurídica.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La Esant informa que, se tiene un avance sanitario 79,73, pluvial 86,11, Acueducto 71,83 con avance físico del 77,41% , avance financiero del 72,96% con pendiente de pago acta 35.

La fecha de terminación del 24 de agosto de 2025 no se va a cumplir por problemas sociales, la comunidad no deja avanzar hasta que se pavimente L= 184 ml que se demora aproximadamente un mes.

En el periodo reportado se trabaja en los siguientes frentes de obra

- Carrera 4 entre calles 10 y 11
- Carrera 6 entre calles 6 y 7a.

El MVCT informa que, Se programa reunión por el Senado de la Republica de seguimiento con la comunidad, el 25- de abril de 2025 a la 9:00 a.m. con presencia obligatoria de la ESANT – Ing. luz Yaneth Niño. El MVCT envió invitación el 10/04/2025 a la ESANT y la Ingeniera luz Yaneth niño.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El Ministerio informa:

Se realizó reunión programada el martes 1 de abril a las 2p.m de socialización de la nueva propuesta por la empresa consultora CHAFIK, realizando presentación general del nuevo trazado y nueva localización de la estación de bombeo.

1. Se tiene viabilizada tubería de 10" el L= 1133 ml y con el nuevo trazado se cambiaría a 14" en L= 2476 ml aproximadamente.
2. Pendiente revisar eliminación de tanque de succión.
3. Se debe realizar cruce en la vía nacional para que en el nuevo trazado la tubería de 14" se instale en el borde interno del corredor vial la Cigarra.
4. Se deben revisar permisos ambientales.
5. Se debe revisar con Invias el nuevo trazado para conocer concepto de invias.
6. Se debe conocer posición del Municipio de comprar nuevo lote para estación de Bombeo.
7. Se debe revisar el componente eléctrico.
8. El Consultor indica que la socialización es general y si se aprueba por las partes se necesitaría un estudio detallado de la nueva propuesta que inicialmente tendría un ahorro de 3.000 millones aproximadamente



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

El 3 de abril de 2024 el MVCT envió oficio de aprobación reformulación No.1 del proyecto a la ESANT y Municipio de Mogotes.

La Esant informa que se reunió con el contratista para que comience con el alistamiento pertinente al reinicio de la obra teniendo en cuenta la aprobación de la reformulación No. 1.

La Esant se encuentra en trámites administrativos concernientes a ajuste de contratos de obra e Interventoría de acuerdo con reformulación No. 1 aprobada por el MVCT.

CDR en trámite para iniciar

6. Proyecto "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER

El MVCT informa que:

Se envió a la ESANT Solicitud de documentos para liquidar el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1167 de 2021 de Girón -Santander el 27 de marzo de 2025.

El 7 de abril de 2025 y el 11 de abril de 2025 se reenvió oficio de reiteración de solicitud de documentos para liquidación del convenio 1167 de 2021.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actas de liquidación del socorro,	Esant	30-4-2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2.	Reunión PMAA de Vélez	MVCT-Esant - senado de la republica	25-4-2025 a las 10:00 a.m.
----	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------

FIRMAS:

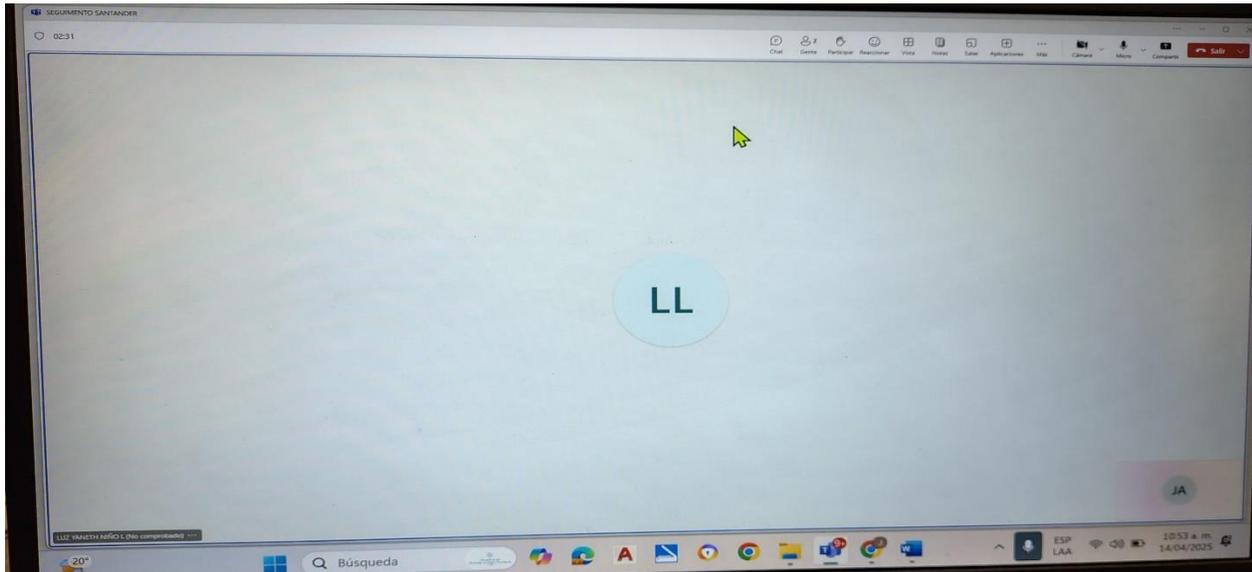

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 14-4-25
