

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

## **ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 10 de abril de 2025
HORA:	De 15:30 pm a 16:00
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. FINDETER: José Javier Herrera – Apoyo a la Supervisión  2. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio
INVITADOS:	No aplica

### **ORDEN DEL DIA:**

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto a los convenios 1746-2023 y 1747-2023 cuyos proyectos son: "REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO" y "REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO" respectivamente.

1. Revisión de proceso de contratación derivada.

### **DESARROLLO:**

La mesa técnica tuvo como propósito realizar seguimiento al estado del proceso de contratación derivada de los convenios 1746 y 1747 de 2023, orientados a la rehabilitación de pozos subterráneos en Santa Marta.

Desde Findeter se informó que, tras el cierre de las convocatorias, se recibieron 11 proponentes para la interventoría y 8 para la obra. Inicialmente se preveía la adjudicación para el 8 de abril; sin embargo, debido a observaciones recibidas sobre el informe de requisitos habilitantes, generó que se tuviesen que publicar las respectivas Adendas modificando el cronograma de adjudicación del proceso. A la fecha, hay tres proponentes habilitados para obra y cinco para interventoría. La apertura de los sobres económicos se realizó el 10 de abril y se prevé la adjudicación el 16 de abril.

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Findeter informa que ambos proyectos serán ejecutados bajo un solo contrato, con valores, plazos y alcances individualizados. También se aclaró que deben presentarse hojas de vida diferentes para cargos claves de cada componente según las dedicaciones establecidas.

Respecto al proceso de legalización, se estima una duración de aproximadamente un mes, teniendo en cuenta trámites de pólizas, firma de contrato, revisión de la metodología y plan de trabajo.

Desde el MVCT solicitó a FINDETER actualizar la información y documentación en el Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SiGeVAS. También se solicitó remitir información formal una vez se produzca la adjudicación de los contratos.

Se acordó programar la próxima mesa de seguimiento para el 8 de mayo de 2025.

### **COMPROMISOS**


<b>No.</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
1	Remitir información sobre adjudicación de contratos.	FINDETER	16/Abril/2025
2	Designar e informar supervisor responsable para acceso a SIGEVAS	MVCT	30/Abril/2025
3	Programar próxima mesa de seguimiento	MVCT	08/Mayo/2025

Link de reunión:

[Convenios 1746-2023 y 1747-2023 Pozos SantaMarta-20250410 154722-Grabación de la reunión.mp4](#)

### **FIRMAS:**

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01**

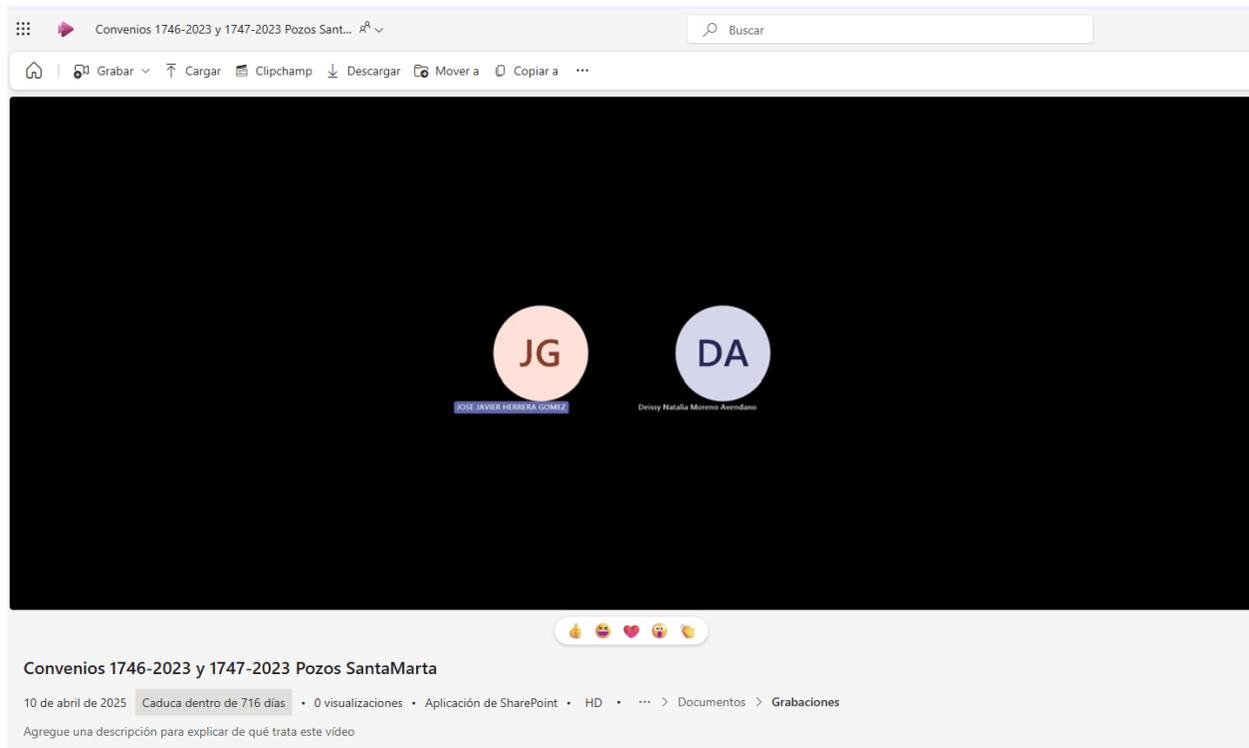

**Anexos: (Opcional)**

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT  
 Avala FINDETER: José Javier Herrera  
 Fecha: 24 de abril de 2025

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
11	01/04/2025	Ajuste de imagen institucional e inclusión de control de cambios de acuerdo con el Manual de DET-M-05	Líder proceso Gestión documental
